



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart, 2021



Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.

M. Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
1. YÖNETİCİ ÖZETİ	iii
2. GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1. UzGÖRÜŞÜMÜZ	5
2.2. ÖZGÖREVİMİZ	5
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ	5
2.4. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
2.5. YATIRIMLARIN FINANSMAN KAYNAKLARI	9
2.6. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	10
2.7. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	13
2.7.1. Hedeflenen	13
2.7.2. Gerçekleşen	13
2.7.3. Devam Edenler	14
2.8. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	15
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	15
2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri	22
2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	26
3. PROJE UYGULAMALARI	27
3.1. 2020H03-151359 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	27
3.2. 2020H03-151364 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	28
3.3. 2020I00-140541 SAĞLIK-MUHTELİF İŞLER PROJESİ	32
3.4. 2020H03-151366 YAYIN ALIM PROJESİ	46
3.5. 2020H03-151368 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	50
3.5.1. İkinci Etap Yol Yapım İşi	52
3.5.2. Engelsiz Üniversite	53
3.5.3. Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi	54
3.6. 2009H03-1057 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	56
3.6.1. Ermenek MYO Uygulama Oteli	57
3.7. 2010H05-1269 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ	58
4. PROJE BAZINDA HARCAMALAR	61
5. ÖNERİLER	62

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Türk dilinin ve medeniyetimizin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin diyarı Karaman'ın en gözde eğitim kurumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından rektör olarak atanarak 9 Şubat 2021 tarihinde bu kutlu görevi devraldım. Üniversitemizi şehir ve bölge boyutundan daha ileri noktalara taşımak, üniversitemizi ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma getirerek uluslararası bir üniversite hüviyetine kavuşturmak, erdemli ve kalifiye insanlar yetiştirecek her türlü sosyal, bilimsel ve teknolojik alt yapıyı hazırlamak, mensuplarımızla birlikte hem milletimizin

ufkuna hem de insanlığa yeni bir soluk getirmek en büyük hedefimizdir.

Bütün paydaşlarımızla bölgesel kalkınma özgörevini ve farklılaşmayı ortaya koymak adına iş birlikleri geliştirerek kamu kurumları, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi/Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atıyoruz. Üniversitemiz gelişim planına göre ilk etap projelerini büyük oranda tamamlayarak ikinci etap projelerini uygulamaya koyduk. Üniversitemizin Yunus Emre Yerleşkesinde hizmete girmiş olan eğitim binaları ve ilerleyen zamanlarda yapılması düşünülen eğitim ve diğer hizmet alanlarına ulaşımın sağlanması amacıyla ikinci etap yol projesi çalışmaları tamamlanmıştır.

2020 yılı içerisinde Ermenek ve Kazımkarabekir Yerleşkelerinin ısıtma sistemi değiştirilerek daha çevreci ve ekonomik olan doğalgaz sistemine geçiş sağlanmıştır. Üniversite Camii çevresi peyzaj düzenlemesi, stadyum tribünü ve Ermenek Spor Salonu statik ve mimari projeleri, Yunus Emre Yerleşke alanı içerisine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılması planlanan toplu konut projesi kapsamında imar tadilat projesi tamamlanarak bu alanlarda yatırım çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Üniversitemiz Ahmet KELEŞOĞLU Diş Hekimliği Fakültesinin yapımı Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından tamamlanmış olup fakültemizi 2020 yılında eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti sunumuna hazır hale getirmek için diş üniteleri, ağız ve diş eğitim malzemeleri ile çeşitli sağlık ekipmanlarının alımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında fakültemizin sağlık hizmeti sunumuna başlaması için çalışmalarımızda sona gelmiştir.

Yine 2020 Yılı Yatırım Bütçemizde yer alan ödeneklerden, eğitim-öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikaların öncelendiği görülmektedir. Buna yönelik olarak gerekli ödenekler, makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları ile öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha estetik ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ilkesi ile salgın şartlarının getirmiş olduğu zorluklara ve olumsuzluklara rağmen 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı "2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu"nu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Namık AK
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Uzgörüřümüz

İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiřtiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliřtirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.

2.2. Özgörevimiz

Üniversitemiz arařtırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine baėlı ve evrensel değerlerle donatılmıř görev ve sorumluluėunun bilincinde erdemli bir neslin yetiřtirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiřtir.

2.3. Temel Deėerlerimiz

- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Etik deėerlere baėlılık
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Öğrenci merkezlilik
- ✓ Kent, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
- ✓ Türk dilinin doėru kullanılması ve yaygınlařtırılmasına karřı duyarlılık

2.4. Temel Amaç ve Hedefler

EKSENLER	AMAÇLAR
EĞİTİM EKSENİ	Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ	Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
FARKLILAŞMA EKSENİ	Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
KURUMSALLAŞMA EKSENİ	Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.
	Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.
	Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.
	Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri

AMAÇ 2	HEDEFLER
<p>Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.</p>	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.
	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.

Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 3	HEDEFLER
<p>Türk dili, gıda, tarım ve temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.</p>	Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.
	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.
	Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.
	Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.
	TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.

Çizelge 4: Farklılaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 4	HEDEFLER
<p>Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.</p>	<p>Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.</p>
	<p>Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.</p>
	<p>Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.</p>
	<p>Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.</p>
	<p>Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.</p>

Çizelge 5: Kurumsallaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler

2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 11.450.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 17.400,000,00 TL olmuştur. Projelerin sektörlere göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2020 Yılı Program Ödeneği	2020 Yılı Revizeli Ödenek	2020 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	10.606.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	8.300.000,00	64.544.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.338.964,82
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	22.796.000,00	8.350.000,00	50.000,00	50.000,00	40.887,00
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	70.800,00
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler	8.297.656,00	0,00	6.500.000,00	8.297.656,00	7.832.717,59
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı	598.000,00	0,00	598.000,00	598.000,00	584.106,03
Sağlık-Sağlık	Muhtelif İşler Projesi	5.152.000,00	0,00	1.000.000,00	5.152.344,00	5.149.102,00
TOPLAM		55.949.656,00	72.894.000,00	11.450.000,00	17.400.000,00	16.016.577,44


Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 95,33'ü Yunus Emre Yerleşkesi, % 3,25'i Ermenek Yerleşkesi ve % 1,42'si da Kazım Karabekir Yerleşkesinde yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Taşınmaz Maliki	Alan
Yunus Emre Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	1.607.650,89
Ermenek Yerleşkesi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	54.787,11
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	23.938,98
Genel Toplam		1.686.376,98

Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m²)

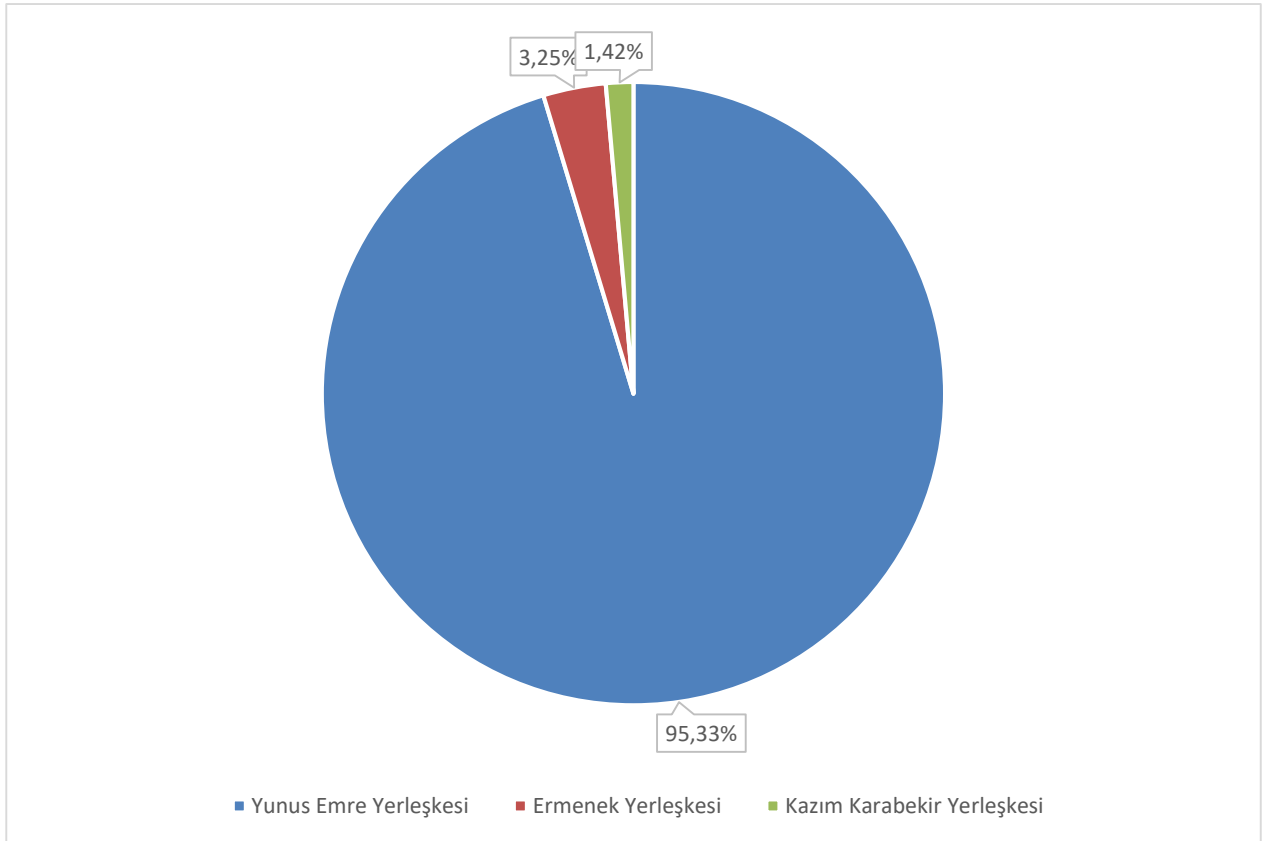


Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı

Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kapalı hizmet alanlarının % 79,36'sını eğitim alanları, % 7,39'unu sosyal alanlar, % 6,40'ını spor alanları, % 6,10'unu idari alanlar ve % 0,75'ini barınma alanları oluşturmaktadır.

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	12.130	-	-	12.130
Eğitim	139.045	7.000	11.712	157.757
Sosyal	13.533	1.158	-	14.691
Spor	12.582	-	150	12.732
Barınma	1.480	-	-	1.480
Genel Toplam	178.770	8.158	11.862	198.790

Çizelge 8: Kapalı Mekânların Dağılımı

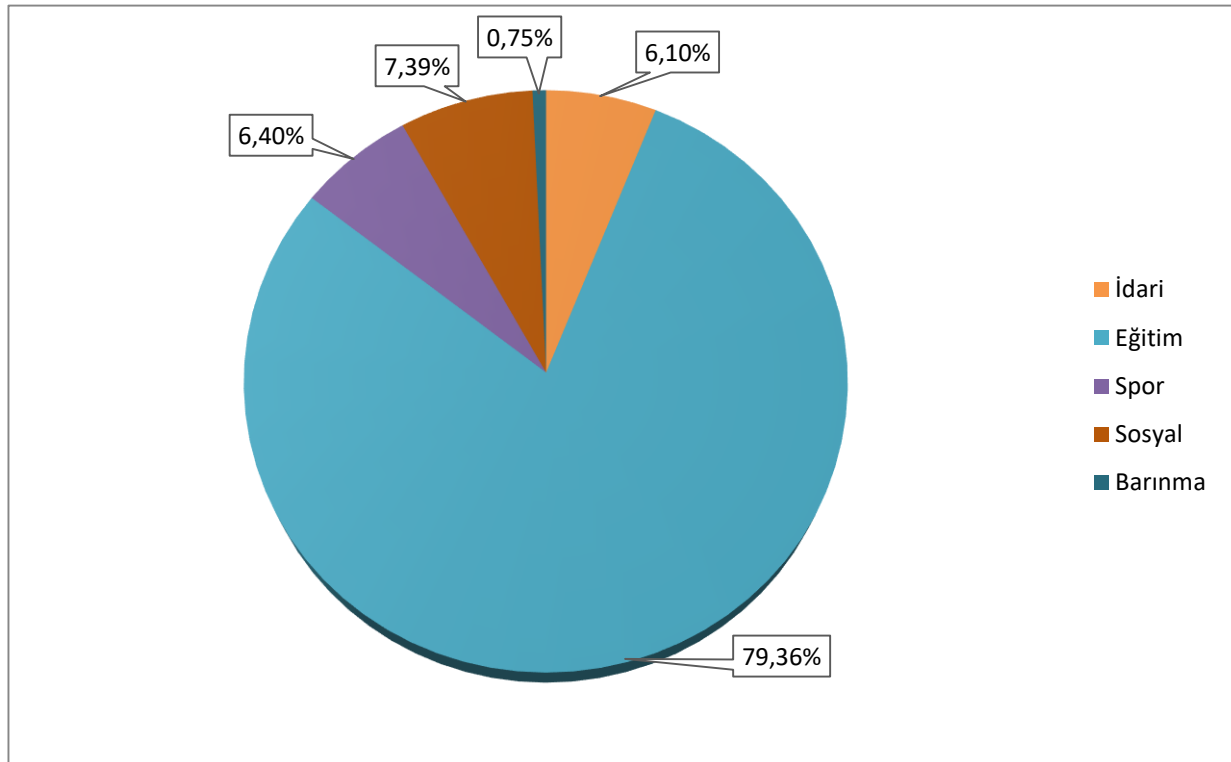

Grafik 2: Taşınmazların Hizmet Alanları İtibariyle Dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Barınma
Ermenek MYO		4.325			
Ermenek Spor Salonu			150		
Misafirhane					1.130
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		13.000			
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635			
Sosyal Bilimler MYO/Uygulamalı Bilimler Fak.		6.640			
Bilgi İşlem /Öğrenci İşleri Binası	3.175				
Rektörlük Hizmet Binası	5.000				
Mühendislik Fakültesi		20.435			
Halıcılık-Seramik Atölyesi		3.798			
Makine- Otomotiv atölyesi		3.367			
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		3.170			
Yemekhane Kafeterya Çarşısı Binası				13.000	
1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu			7.500		
Isı Merkezi	2.055				
Ermenek MYO Atölye		1.505			
Kazım Karabekir MYO		7.000			
Rektörlük Konutu					350
Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu		17.420			
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu			5.082		
Amfi Tiyatro				533	
Amfi Tiyatro Depoları	1.900				
Spor Bilimleri Fakülte Binası		9.270			
İslami İlimler Fakültesi		8.350			
Kütüphane Binası		10.500			
Eğitim Fakültesi		8.480			
Sağlık Bilimleri Fakültesi		3.600			
Sağlık Hizmetleri MYO		3.615			
Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetler MYO		5.882			
Kâzımkarabekir MYO Çok Amaçlı Salon				1.158	
Tıp Fakültesi		10.765			
Diş Hekimliği Fakültesi		12.000			
TOPLAM	12.130	157.757	12.732	14.691	1.480
GENEL TOPLAM			198.790		

Çizelge 9: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

2.7. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.7.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı sağlık sektöründe ise bir adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2020 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2. Gerçekleşen

2020 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

✓ Kazım Karabekir ve Ermenek yerleşkesinde kömür ve fuel-oil ile ısınma sistemlerinin doğalgaz sistemine dönüştürülmesi sağlanmıştır.

✓ Üniversitemizin merkez yerleşkesinde hizmete girmiş olan Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Binaları ve ilerleyen zamanlarda yapılması düşünülen eğitim ve diğer hizmet alanlarına ulaşımın sağlanması amacıyla ikinci etap yol projesi çalışmaları tamamlanmıştır.

✓ Üniversite camii çevresi peyzaj düzenlemesi proje hizmet alım işi, Tribün ve Ermenek spor salonu statik ve mimari proje hizmeti alım işi, Yunus Emre yerleşke alanı içerisine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılması planlanan toplu konut projesi kapsamında imar tadilat projesi yaptırılması hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.

✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyacımız doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

✓ Ahmet KELEŞOĞLU Diş Hekimliği Fakültemizin eğitim-öğretime başlaması ve sağlık hizmeti sunumu için gerekli eğitim ve sağlık ekipmanlarının alımı gerçekleştirilmiştir.

✓ 2020 yılı içerisinde elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar gerçekleştirilmiştir.

2.7.3. Devam Edenler

Üniversitemizde 2020 yılı itibariyle devam eden projeler kapsamında 2010H05-1269 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi içinde yer alan Stadyum (Tribün) yapım işi ile Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu yapım işi, 2009H03-1057 numaralı Derslikler ve Merkezi Birimler projesi içinde yer alan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli yapım işi olmak üzere toplam üç adet proje mevcuttur. Bu projelere çeşitli nedenlerden dolayı 2020 yılı için herhangi bir ödenek tahsis edilmemiş olup bu projeler iz ödenek bedeli ile takip edilmektedir. Bu projelere ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

✓ 2018 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak son üç yıldır yatırım için izin verilmeyen Ermenek 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu işinin izin ve gerekli kaynak tahsisinin sağlanması halinde 2021 yılında yapılması öngörülmektedir.

✓ 2016 yılında mimari proje çalışmalarına başlanan Tribün Yapım İşisi projemiz 2018 yılında ihale edilmiş ancak; proje yaklaşık maliyetin çok üzerinde bir teklif verilmesi üzerine ihale iptal edilmiştir. 2019 ve 2020 yıllarında spor sektörü yatırım harcamalarına izin verilmediğinden/bütçe sağlanamadığından projenin ihalesine çıkılamamıştır. 2021 yılı itibariyle izin ve gerekli kaynak tahsisinin sağlanması durumunda ihale işlemlerine devam edilecektir.

✓ 2018 yılı yatırım programına alınan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. Yatırım programında olmasına karşın Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.


2.8. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 11.450.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı 17.400.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 16.016.577,44 TL'si harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 92,04'tür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir

Eko. Kod	Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcamanın Toplam Ödeneğe Oranı
6.1	2.510.000,00	9.438.000,00	11.948.000,00	11.928.730,24	99,83%
6.3	100.000,00	250.000,00	350.000,00	245.325,85	70,09%
6.5	7.644.000,00	0,00	3.306.000,00	2.409.764,82	72,89%
6.6	150.000,00	100.000,00	250.000,00	157.637,20	63,05%
6.7	1.046.000,00	500.000,00	1.546.000,00	1.275.119,33	82,47%
Top.	11.450.000,00	10.288.000,00	17.400.000,00	16.016.577,44	92,04%

Çizelge 10: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı

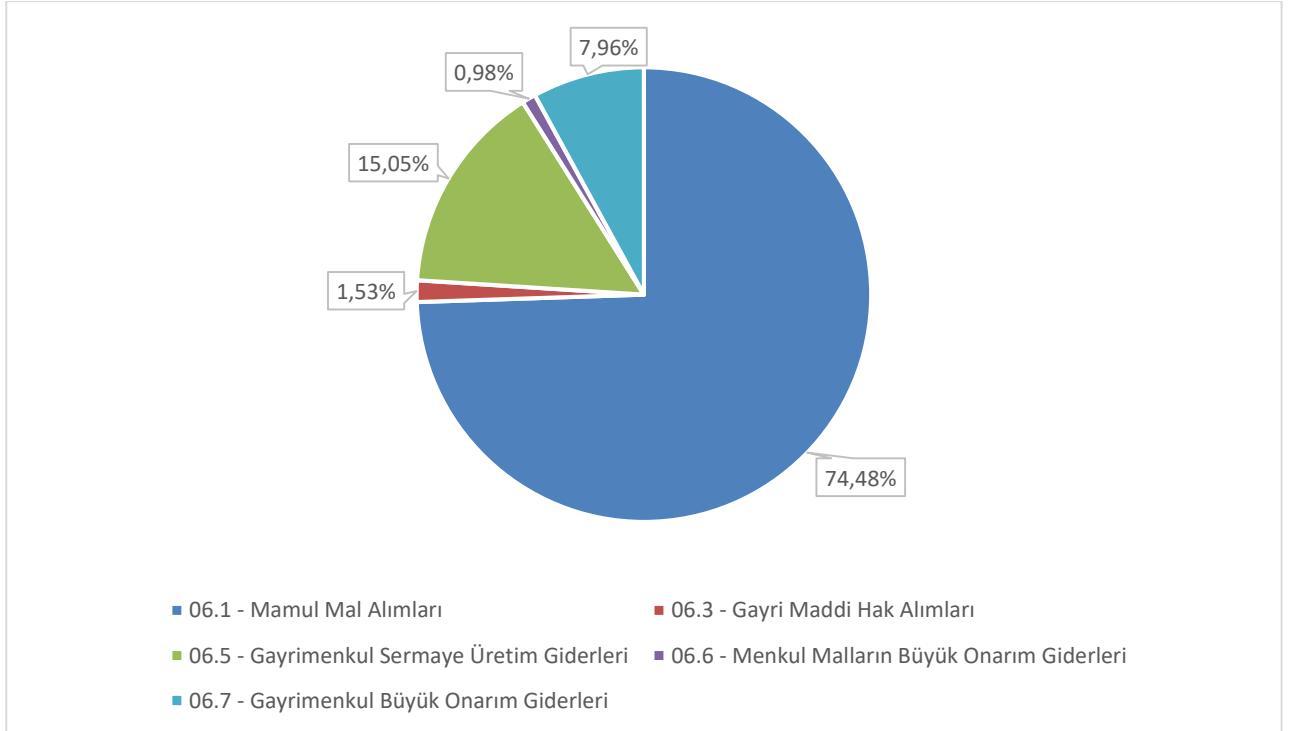

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Sermaye giderlerine ilişkin 2020 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
06	1	1	01	Büro Mefruşatı Alımları	907.111,20
06	1	1	03	Okul Mefruşatı Alımları	377.760,09
06	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	18.522,60
06	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.303.393,89
06	1	2	01	Büro Makineleri Alımları	114.410,91
06	1	2	02	Bilgisayar Alımları	816.755,55
06	1	2	03	Tıbbi Cihaz Alımları	4.612.346,51
06	1	2	04	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.345.985,68
06	1	2	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	42.074,13
06	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	3.109.657,54
06	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	10.041.230,32
06	1	6	01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	59.226,33
06	1	6	03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	524.879,70
06	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	584.106,03
06	1			Mamul Mal Alımları	11.928.730,24
06	3	1	01	Bilgisayar Yazılı Alımları	242.643,12
06	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	242.643,12
06	3	3	01	Lisans Alımları	2.682,73
06	3	3		Lisans Alımları	2.682,73
06	3			Gayri Maddi Hak Alımları	245.325,85
06	5	1	01	Proje Giderleri	17.700,00
06	5	1	90	Diğer Giderler	575.876,79
06	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	593.576,79
06	5	2	90	Diğer Giderler	37.672,68
06	5	2		Malzeme Giderleri	37.672,68
06	5	7	07	Yol Yapım Giderleri	1.778.515,35
06	5	7		Müteahhitlik Giderleri	1.778.515,35
06	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.409.764,82
06	6	2	01	Malzeme Giderleri	35.706,80
06	6	2		Malzeme Giderleri	35.706,80
06	6	9	01	Diğer Giderler	121.930,40
06	6	9		Diğer Giderler	121.930,40
06	6			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	157.637,20
06	7	2	01	İnşaat Malzemesi Giderleri	202.737,22
06	7	2	02	Elektrik Tesisatı Giderleri	186.891,94
06	7	2	03	Sıhhi Tesisat Giderleri	179.869,29
06	7	2	90	Diğer Giderler	416.090,18
06	7	2		Malzeme Giderleri	985.588,63
06	7	7	90	Diğerleri	147.081,10
06	7	7		Müteahhitlik Giderleri	147.081,10
06	7	9	01	Diğer Giderler	142.449,60
06	7	9		Diğer Giderleri	142.449,60
06	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.275.119,33
06				Sermaye Giderleri	16.016.577,44

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

06.1 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 2.510.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 9.438.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 11.948.000,00 TL olmuştur. 2020H03-151364 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 6.195.522,71 TL, 2020I00-140541 nolu Muhtelif İşler-Sağlık Projesi kapsamında ise 5.149.101,50 TL ve 2020H03-151366 Yayın Alımı Projesi kapsamında 584.106,03 TL harcama yapılmıştır. Bu üç projenin toplam harcaması 11.928.730,24 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 99,83'dür. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.1.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	769.568,15	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.1.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	137.543,05	2020I00-140541	Sağlık-Muhtelif İşler
06.1.1.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	377.760,09	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.1.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	18.522,60	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları				1.303.393,89
06.1.2.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	114.410,91	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.2.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	464.242,17	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.2.02	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	352.513,38	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.2.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	740.390,46	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.2.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	3.871.956,05	2020I00-140541	Sağlık-Muhtelif İşler
06.1.2.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	1.043.525,08	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.2.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	305.460,60	2020I00-140541	Sağlık-Muhtelif İşler
06.1.2.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	42.074,13	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.2.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	1.980.328,97	2020H03-151364	Muhtelif İşler
06.1.2.90	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	292.186,77	2020H03-151364	Muhtelif İşler

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.2.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	837.141,80	2020I00-140541	Sağlık-Muhtelif İşler
06.1.2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları			10.041.230,32	
06.1.6.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	59.226,33	2020H03-151366	Yayın Alımı
06.1.6.03	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	524.879,70	2020H03-151366	Yayın Alımı
06.1.6	Yayın Alımları ve Yapımları			584.106,03	
06.1	Mamul Mal Alımları			11.928.730,24	

Çizelge 12: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde 250.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 350.000,00 TL olmuştur. 2020H03-151364 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 245.325,85 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 70,09'dur. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.3.1.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	81.314,00	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.3.1.01	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	161.329,12	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.3.1	Bilgisayar Yazılımı Alımları			242.643,12	
06.3.3.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Lisans Alımları	2.682,73	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.3.3	Lisans Alımları			2.682,73	
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları			245.325,85	

Çizelge 13: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 7.644.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 4.338.000,00 TL ödenek düşümü yapılmıştır. Düşümü yapılan ödenekler; 06.1 Mamul Mal Alımlarına 3.588.000,00 TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına 150.000,00 TL, 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 100.000,00 TL ve 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 500.000,00 TL olmak üzere yapılan aktarmalar neticesinde yılsonu toplam ödenek 3.306.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020H03-151359 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ve 2020H03-151368 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2.409.764,82 TL harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 72,89'dur. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.5.1.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	17.700,00	2020H03-151359	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
06.5.1.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	53.100,00	2020H03-151359	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
06.5.1.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	522.776,79	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.5.1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler			593.576,79	
06.5.2.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	37.672,68	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.5.2	Malzeme Giderleri			37.672,68	
06.5.7.07	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yol Yapım Giderleri	1.778.515,35	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.5.7	Müteahhitlik Giderleri			1.778.515,35	
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			2.409.764,82	

Çizelge 14: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 150.000,00 TL olan 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 100.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 250.000,00 TL olmuştur. 2020H03-51364 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 157.637,20 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 63,05'dir. 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.6.2.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	29.547,20	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.6.2.01	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	6.159,60	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.6.2	Malzeme Giderleri				35.706,80
06.6.9.01	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	2.360,00	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.6.9.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	28.674,00	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.6.9.01	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Diğer Giderler	34.846,40	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.6.9.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	56.050,00	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.6.9	Diğer Giderler				121.930,40
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri				157.637,20

Çizelge 15: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.046.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 500.000,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır. 2020H03-51364 nolu Muhtelif İşler Projesi ve 2020H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 1.275.119,33 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 92,04'dür. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.7.2.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İnşaat Malzemesi Giderleri	202.737,22	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.7.2.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Elektrik Tesisatı Giderleri	186.891,94	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.7.2.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sihhi Tesisat Giderleri	179.869,29	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.7.2.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	375.203,18	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.7.2.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	40.887,00	2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
06.7.2	Malzeme Giderleri				985.588,63
06.7.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	147.081,10	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.7.7	Müteahhitlik Giderleri				147.081,10
06.7.9.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	142.449,60	2020H03-51364	Muhtelif İşler
06.7.9	Diğer Giderler				142.449,60
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				1.275.119,33

Çizelge 16: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2020 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-17* ile 23'de yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'de gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2020H03-151359
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2020-2020
2020 Yılı Yatırımı TL	200.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	200.000,00
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	200.000,00

Çizelge 17: Revizyon (2020H03-151359 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2020H03-151364
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2020-2020
2020 Yılı Yatırımı TL	6.500.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	1.797.656,00
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	8.297.656,00
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	8.297.656,00

Çizelge 18: Revizyon (2020H03-151364 Nolu Muhtelif İşler)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2020H03-151366
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2020-2020
2020 Yılı Yatırımı TL	598.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	598.000,00
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	598.000,00

Çizelge 19: Revizyon (2020H03-151366 Nolu Yayın Alımı)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2020H03-151368
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2020-2022
2020 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	8.300.000,00
2020 Yılı Yatırımı TL	3.100.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2020 Yılı Kümülatif Proje Tutarı Revizyonu TL	8.300.000,00
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	3.100.000,00

Çizelge 20: Revizyon (2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H03-1057
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2022
2020 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	10.606.000,00
2019 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2020 Yılı Yatırımı TL	2.000,00
Eklene/Aktarılan TL	0,00
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	10.606.000,00
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	2.000,00


Çizelge 21: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)

Sektörü	Eđitim-Beden Eđitimi ve Spor
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H05-1269
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2023
2020 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	22.796.000,00
2019 Yılı Kümülatif Harcama TL	8.350.000,00
2020 Yılı Yatırımı TL	50.000,00
Eklene/Aktarılan TL	0,00
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	22.796.000,00
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	50.000,00

Çizelge 22: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2020I00-140541
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2020-2020
2020 Yılı Yatırımı TL	1.000.000,00
Eklene/Aktarılan TL	4.152.344,00
2020 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	5.152.344,00

Çizelge 23: Revizyon (2020I00-140541 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler)

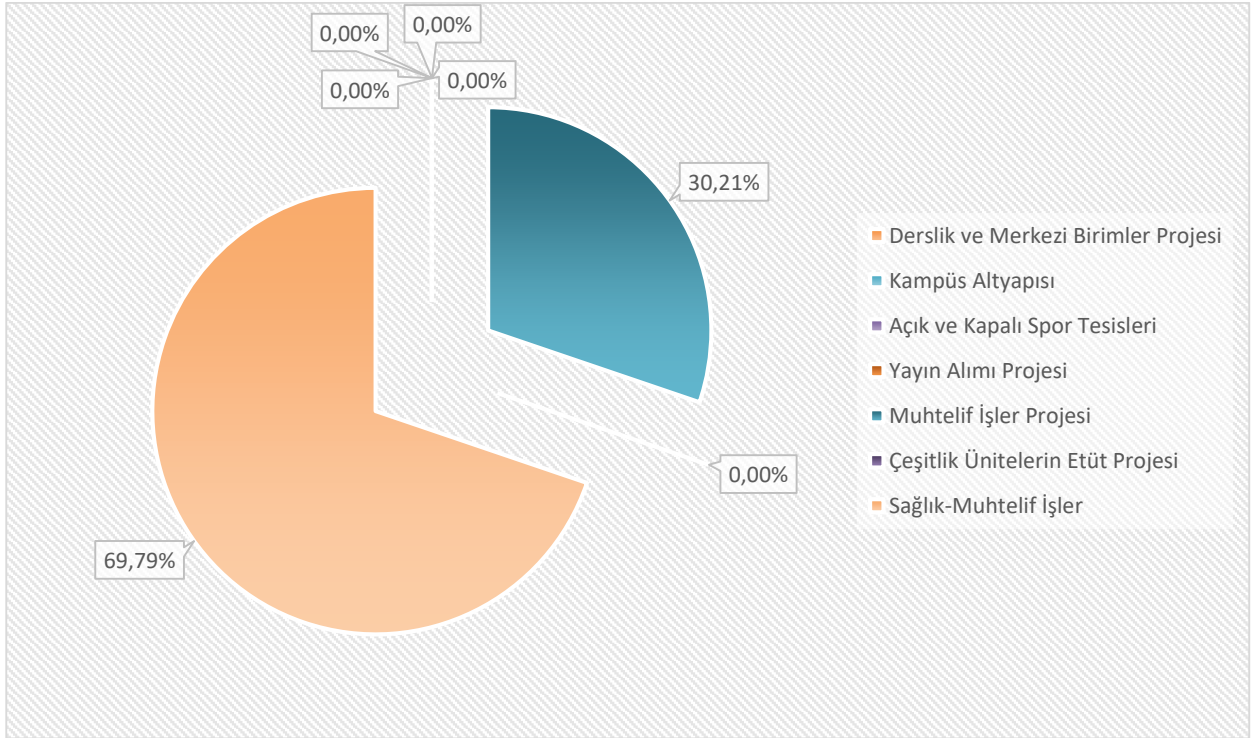

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı (Ödenek Eklemesi Yapılanlar)

2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.
- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır.
- Teknik personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, proje hazırlığı ile ihaleye çıkılması arasındaki süre yetersizliği vb. durumlardan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.
- Yatırım programında olmasına rağmen (Tribün/Otel/Spor salonu vb.) iz ödenekte yer alan projelere harcama izni verilmemesi nedeniyle acil ve zorunlu ihtiyaçlar karşılanamamaktadır.
- Kesin teminatın iadesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ihale mevzuatı gereğince geçici kabul yapıldıktan sonra kesin teminatın yarısının iade edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun'a göre kesin teminatın yarısının iadesinde ilişiksiz belgesi aranmamakta, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı Kanun'a göre ilişiksiz belgesi düzenlenmeden kesin teminatın yarısının iadesinin yapılamayacağı belirtilmekte olup SGK tarafından ilişiksiz belgesi düzenlenebilmesi için işe ait kesin hakediş tutarı istenilmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kesin hakediş tutarı, kesin kabul aşamasında kesin hakediş raporu ile tespit edilmektedir. Geçici kabul işleminden sonra işin kesin hakediş tutarı belli olmadığı için kesin teminatın yarısının iadesi mümkün olmamaktadır.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2020H03-151359 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2020 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Toplam harcama ise 70.800,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020H03-151359 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	200.000,00
Eklene TL	0,00
Toplam Ödenek TL	200.000,00
Harcama TL	70.800,00
Kalan Ödenek TL	129.200,00
Gerçekleşme Oranı %	54,80

Çizelge 24: 2020H03-151359 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemiz tarafından 2020 yılında bir adet imar tadilatı projesi ve iki adet proje hizmeti alım işi yaptırılmıştır.

2020H03-151359 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Toplu Konut Projesi kapsamında imar tadilat projesi yaptırılması	17.700,00
Tribün ve Ermenek Kapalı Spor Salonu Statik ve Mimari Proje Hizmeti Alımı	23.600,00
Üniversite Camii Çevresi Peyzaj Düzenlemesi Proje Hizmet Alım İşİ	29.500,00
TOPLAM	70.800,00

Çizelge 235: 2020H03-151359 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamalarının Detayı

3.2. 2020H03-151364 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi için 2020 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 6.500.000,00 TL olup finansman fazlasından 1.797.656,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 8.297.656,00 TL, toplam harcama ise 7.832.717,59 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020H03-151364 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Büyük Onarım, Donanım Onarımı, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	8.297.656,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	6.500.000,00
Eklenen TL ¹	1.797.656,00
Toplam Ödenek TL	8.297.656,00
Harcama TL	7.832.717,59
Kalan Ödenek TL	464.938,41
Gerçekleşme Oranı %	94,40

Çizelge 246: 2020H03-151364 Nolu Muhtelif İşler Projesi

¹ Finansman fazlasından ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Muhtelif İşler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Genel Toplam
Bilgisayar Alımları	352.513,38		464.242,17			816.755,55
Bilgisayar Yazılımı Alımları	161.329,12		81.314,00			242.643,12
Büro Makinaları			114.410,91			114.410,91
Büro Mefruşatı Alımları			769.568,15			769.568,15
Diğer Giderler	2.360,00	34.846,40	28.674,00		573.702,78	639.583,18
Diğer Makine Teçhizat Alımları	292.186,77		1.980.328,97			2.272.515,74
Diğer Mefruşat Alımları			18.522,60			18.522,60
Diğerleri					147.081,10	147.081,10
Elektrik Tesisatı Giderleri					186.891,94	186.891,94
İnşaat Malzemesi Giderleri					202.737,22	202.737,22
İşyeri Makine Teçhizat Alımları			42.074,13			42.074,13
Laboratuvar Cihazı Alımları			1.043.525,08			1.043.525,08
Lisans Alımları			2.682,73			2.682,73
Malzeme Giderleri			29.547,20	6.159,60		35.706,80
Okul Mefruşatı Alımları			377.760,09			377.760,09
Sıhhi Tesisat Giderleri					179.869,29	179.869,29
Tıbbi Cihaz Alımları			740.390,46			740.390,46
Genel Toplam	808.389,27	34.846,40	5.693.040,49	6.159,60	1.290.282,33	7.832.717,59

Çizelge 27: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler	Tutar (TL)
Bilgisayar Alımları	464.242,17
Bilgisayar Yazılımı Alımları	81.314,00
Büro Makinaları Alımları	114.410,91
Büro Mefruşatı Alımları	769.568,15
Diğer Giderler	28.674,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.980.328,97
Diğer Mefruşat Alımları	18.522,60
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	42.074,13
Laboratuvar Cihazı Alımları	1.043.525,08
Lisans Alımları	2.682,73
Malzeme Giderleri	29.547,20
Okul Mefruşatı Alımları	377.760,09
Tıbbi Cihaz Alımları	740.390,46
Genel Toplam	5.693.040,49

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Bilimsel ve Teknolojik Arařtırmalar Uygulama ve Arařtırma Merkezi tarafından Muhtelif İřler Projesi kapsamında yapılan iřler ařađıdaki izelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Onarım İři	1	18.856,40
Derin Dondurucu Onarım İři	1	590,00
ICP-İOS Cihazı Onarım İři	1	15.400,00
TOPLAM	3	34.846,40

izelge 259: Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler (BİLTEM)

Yapı İřleri ve Teknik Daire Başkanlıđı tarafından Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler ařađıdaki izelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Elektrik ve İnřaat Mal ve Malzemeleri Alımı	3.702	37.878,00
Yerleřke İerisinde evre Dzenlemesi Yapılacak Alanların Kot Dzenlemesi Yapım İři	1	36.161,10
Km Yerleřkesindeki Hizmet Binalarında Bulunan Otomasyon Sisteminin Bakım Onarımı Yapım İři	1	33.040,00
Peyzaj Mal Alımı	24	242.901,35
Sihhi Tesisat Mal ve Malzeme Alımı	224	33.181,60
Isıtma Sistemi Bakım Onarım Mal Alımı	301	207.780,30
Kazan Dairesi Otomastonu Mal Alımı	48	35.400,00
Asansr Revizyon Bakım Onarımı	3	69.171,60
Su Yalıtım Malzemesi Alımı	45	34.739,20
Ermenek İle Kazım Karabekir Yerleřkesi Orta ve Alak Gerilim Tesislerinin Bakım Onarımı	1	35.400,00
Havalandırma Kanalı Mal Alımı (290 m ²)	1	29.500,00
Kapalı Spor Salonu Gneř Kırıcılarının Demontaj Yapılması	1	30.680,00

13 Adet Jenaratörün Bakım Onarımı	1	20.650,00
Muhtelif Yerlerde Kullanılmak Üzere Mal ve Malzeme Alımı	1	11.959,30
Edebiyat Fakültesi Havalandırma Yapım İşi	1	15.340,00
Sulama Hidrofor Sistemi Revizyonu Yapım İşi Ödemesi	1	37.760,00
İnşaat Malzemesi Mal Alımı Hakediş Ödemesi	1	115.794,82
Bakım Onarım Peyzaj Mal Alım İşi (Elektrik Kısmı) Ödemesi	1	185.475,94
Bakım Onarım Peyzaj (Peyzaj Kısmı) Mal Alım İşi	2	54.872,12
İnşaat Malzemesi Mal Alım İşi İş Artışı Ödemesi	1	22.597,00
TOPLAM	4.361	1.290.282,33

Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Masaüstü Bilgisayar	13	113.519,84
Microsoft İşletim Sistemi	55	84.689,96
Tümleşik Bilgisayar	30	228.499,21
Güvenlik Programı	1	292.186,77
Güncelleme Yazılımı	1	76.639,16
Masaüstü Bilgisayar	2	10.494,33
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odası Alarm Sistemi Bakım-Onarımı	1	2.360,00
TOPLAM	103	808.389,27

Çizelge31: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Klima VRF 410 Gaz Dolumu (42 Litre)	1	4.956,00
Klima VRF Valf Alımı	3	1.203,60
TOPLAM	4	6.159,60

Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

3.3. 2020I00-140541 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi için 2020 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olup finansman fazlasından 4.152.344,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 5.152.344,00 TL, toplam harcama ise 5.149.102,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020I00-140541 nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Makine Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	5.152.344,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.000.000,00

Eklene TL ²	4.152.344,00
Toplam Ödenek TL	5.152.344,00
Harcama TL	5.149.102,00
Kalan Ödenek TL	3.242,00
Gerçekleşme Oranı %	99,93

Çizelge 33: 2020I00-140541 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Diş Ünitesi Malzemeleri	32	2.433.996,37
Buhar Sterilizatörü, Yıkama Dezenefeksiyon Kurutma Makinesi	2	302.460,60
Diş Hekimliği Komprosör Sistemi Alımı	1	441.320,00
Cerrahi Aspiratör Alımı	1	212.414,40
Tezgâh Ünite Ayırma	2	112.640,44
Mobilya Alımı	1	33.080,01
Fantom Cihazı Alımı	1	564.282,79
Panoromatik Röntgen Cihazı	1	129.042,89
Ağız Açık Fosfor Plak Tarayıcı	1	53.218,00
Röntgen Cihazı ve Konik Işınlı Tomografi Cihazı	1	691.416,00
Diş Hekim Fakültesi Hijyen Klima Alımı	1	175.230,00
TOPLAM	44	5.149.101,50

Çizelge34: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler

² Finansman fazlasından ödenek eklemek suretiyle karşılanmıştır.

MUHTELIF İŐLER VE SAĐLIK-MUHTELIF İŐLER KAPSAMINDA ALINAN BAZI MALZEMELERİN GÖRSELLERİ



Resim 1: Merkezi Kompresör Sistemi



Resim 2: Diő Ünitesi



Resim 3: Tomografi Cihazı



Resim 4: Röntgen Cihazı




Resim 5: Yer Yıkama Makinesi



Resim 6: Röntgen Kontrol Cihazı



Resim 7: Kütüphane Kurulumu ve Sandalye Alımı

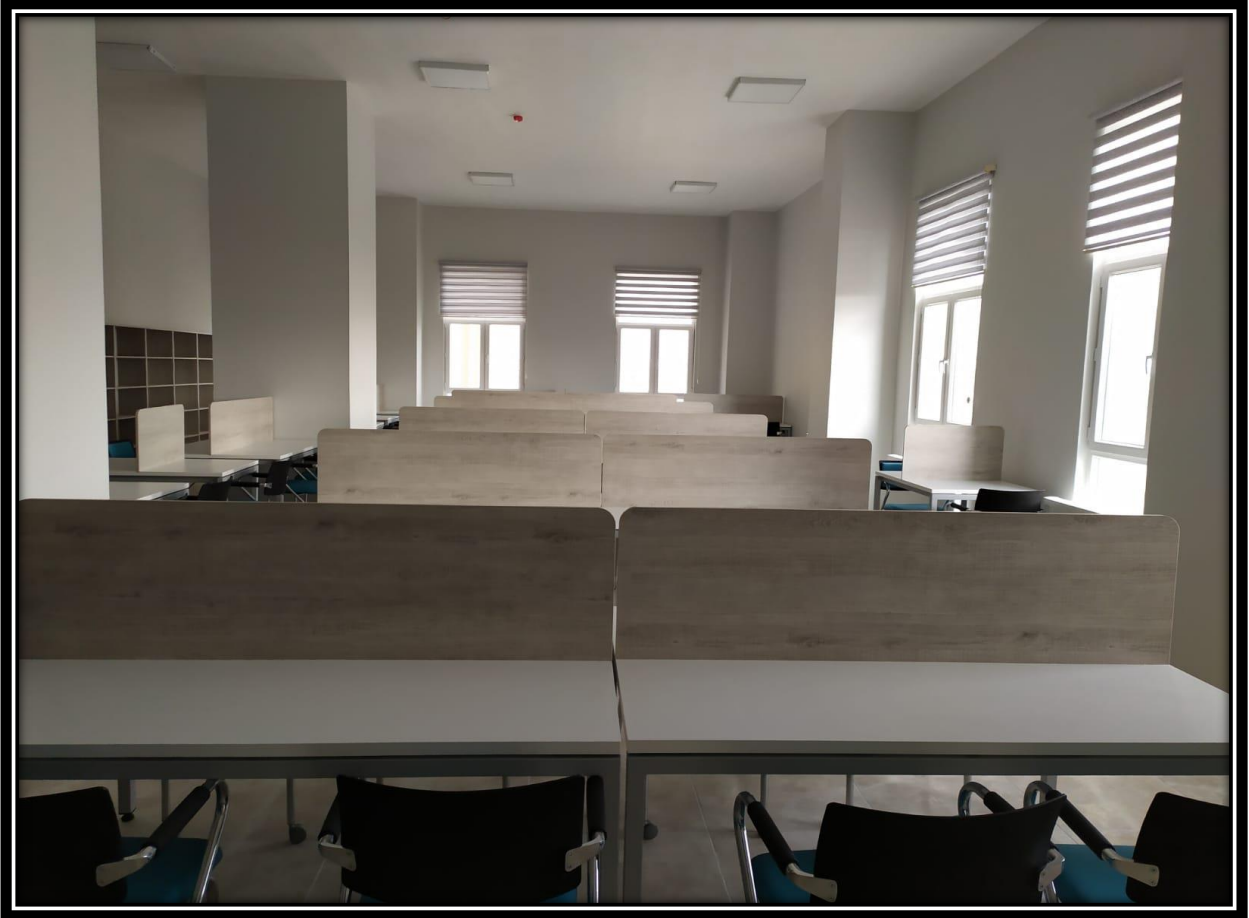

Resim 8: Kütüphane Odası



Resim 9: Reklirik Laboratuvar Odası



Resim 10: Alçı ve Akirilik Ekipmanları




Resim 11: Ağız ve Diş Eğitim Malzemeleri



Resim 12: Alçı ve Akrilik Odası



Resim 13: Fotokopi Makinası

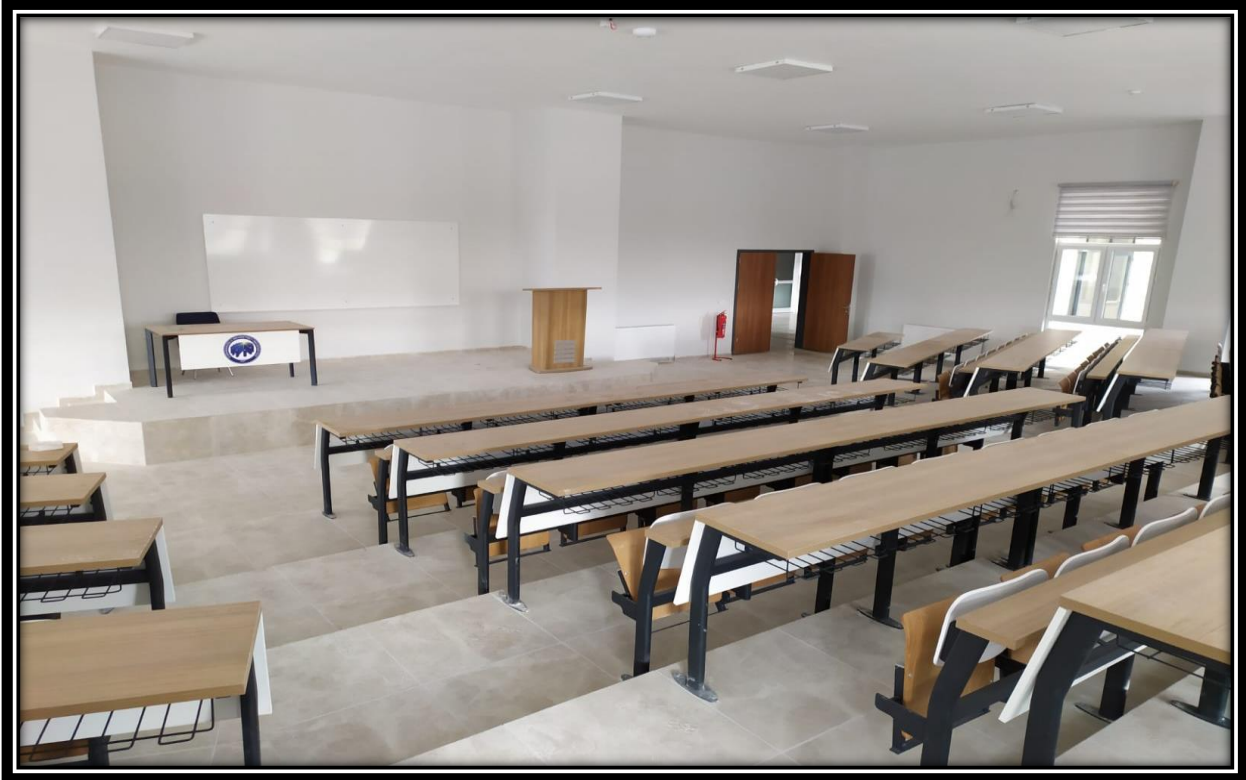

Resim 14: Amfi Eğitim Salonları



Resim 15: Bekleme Koltukları




Resim 16: Klinik Diş Üniteleri



Resim 17: Toplantı Odası



Resim 18: Evrak İmha Makinesi



Resim 19: 3 Boyutlu Yazıcı



Resim 20: Çalışma Odaları



Resim 21: UPS Cihazı



Resim 22: Sterilizasyon Cihazı



Resim 23: Yemekhane Masa ve Sandalye Takımı



Resim 24: Ters Ozmos Sistemi (Bina Su Arıtma Sistemi)

3.4. 2020H03-151366 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2020 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 598.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam harcama ise 584.106,03 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 97,68 olarak gerçekleşmiştir.

2020H03-151366 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	598.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	598.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	598.000,00
Harcama TL	584.106,03
Kalan Ödenek TL	13.893,97
Gerçekleşme Oranı %	97,68

Çizelge 35: 2020H03-151366 Nolu Yayın Alımı Projesi

2020H03-151366 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Tümer ALTAŞ Veri Tabanı Alımı	11.000,00
İdeal Kültür Yayıncılık Reklam Ve Organizasyon Süreli Yayın Veri Tabanı	18.590,90
Araştırma Yöntemleri ve Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) Veri Tabanı	30.000,00

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Türkiye Atıf Dizini Veri Tabanı	13.496,18
SOBİAD Veri Tabanı	8.580,00
Ebook Central Academic Complete Elektronik Veri Tabanı	58.224,01
Elektronik Veri Tabanı Alımı (ACS Web Editions Dergileri Ve ACS Dergi Arşivi)	74.445,95
Video Eğitim Platformu (VİDOBU) Veri Tabanı	12.857,67
Lexpera Hukuk Veri Tabanı	2.832,00
Springer Nature Customer Service Center'dan E-Kitap Alımı (3.995 Adet)	219.298,49
E-Osmanlıca Online Eğitim Veri Tabanı	12.999,99
VETİS Elektronik Veri Tabanı	59.000,00
TURCADEMY Elektronik Veri Tabanı	3.554,51
Basılı Yayın Alımı (1520 adet)	59.226,33
TOPLAM	584.106,03

Çizelge 36: 2020H03-151366 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **Tümer ALTAŞ Veritabanı**

Tümer Altaş veritabanında, e-YDS/YDS, PTE, IELTS ve TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla hızlı kelime öğrenme, gramer videoları, cümle çeviri videoları ve paragraf çeviri videoları gibi 10.000'e yakın indirilebilir içerik yer almaktadır.

- **İdeal Online Süreli Yayın Veritabanı**

İdealonline, araştırmacıların Türkiye'de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktadır. İdeal online içerisinde akademik dergiler, popüler dergiler, ideal tıp kitapları, konferans & armağanlar ve ideal ekitap olmak üzere 5 ayrı veri tabanı vardır.

İdealonline veri tabanlarının amacı; Türkçe bilgi kaynaklarını e-ortama taşımak, Türkçe bilgi kaynaklarına 7/24 erişim sağlamak, Türkçe içeriğe modern veri tabanı sistemi ve cihazlarla erişim sağlamak, Türkçe içeriği dünyanın kullanımına sunmak ve daha fazla Türkçe kaynak yayınlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

- **Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM)**

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) , sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara,

akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

- **Türkiye Atıf Dizini Online Veritabanı**

Atıf Dizini, Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında 2008'den günümüze yayımlanan 410 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlayan, aynı zamanda tüm bu makalelere tam metin erişilebilen tek ulusal atıf tarama dizinidir. Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı tüm dergilerin makaleleri, sağlık bilimleri alanında (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri branşları) yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir. Kayıtlı tüm dergiler, Türkiye’de en az iki sayı düzenli olarak yayımlanan hakemli (danışman değerlendirme sistemi olan) dergilerdir.

- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir.

Sobiad; hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır. Ayrıca üniversitelerin işbirliği içerisinde olduğu diğer üniversiteler, öğretim üyelerinin yayın yaptığı dergiler, birlikte yayın yaptığı akademisyenlerin bilgisi paylaşılmaktadır. Ayrıca kütüphane yetkilisi kullanım istatistiklerine istediği zaman ulaşabilmektedir.

Sobiad, Türkiye merkezli sosyal bilgiler dergilerini taramakla birlikte; birçok yabancı dergi SOBİAD’da taranmak için başvurusunu yapmış bulunmaktadır.

- **Ebook Central Academic Complete**

Ebook Central 206.000’in üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.

- **American Chemical Society (ACS) Veri Tabanı**

American Chemical Society; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi vb. konuları kapsayan 50'den fazla dergiye ilk sayılarından günümüze erişim vermektedir.

- **Video Eğitim Platformu (VİDOBU) Veri Tabanı**

Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri ve Hobi Eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri Türkçe içerikler ile sağlayan çevrimiçi video eğitim platformudur. 12.000'den fazla eğitim videosuna sahip olan platform, Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine yönelik akademik destek sağlayacağı hedeflenmektedir.

- **Lexpera Hukuk Veri Tabanı**

İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve multi-platform erişim imkânı ile LEXPERA akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yenilikçi çözümler sunmaktadır. Güncel mevzuatı, içtihatı, tam metin hukuk kitaplarını, makaleleri, kanun yorumlarını, bibliyografik bilgileri, sözleşme örneklerini ve genel internet arama sonuçlarını kapsamaktadır.

- **E-Osmanlıca Online Eğitim Veri Tabanı**

E-Osmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "şıklı ve gördüğünü yaz" tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. E-Osmanlıca dersleri öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak, onları sınıftaki eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlamaktadır.

- **TURCADEMY Elektronik Veri Tabanı**

Turcademy, Türkiye'de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademik ve idari personel ile öğrencilerimize kolay bir şekilde ulaştıran yerli bir e-kitap platformudur.

Resim 25: Abone Veri Tabanları

3.5. 2020H03-151368 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2020 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 3.100.000,00 TL olup ödenek revizyonu yapılmamıştır. Toplam ödenek 3.100.000,00 TL olup toplam harcama 2.338.964,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 75,45 olarak gerçekleşmiştir. 2020H03-151368 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Yol Yapımı, Engelsiz Üniversite, Doğalgaz Dönüşümü, Güneş Enerji Santrali
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	8.300.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	3.100.000,00
Eklene TL	0,00
Toplam Ödenek TL	3.100.000,00
Harcama TL	2.338.964,82
Kalan Ödenek TL	761.035,18
Gerçekleşme Oranı (%)	75,45

Çizelge 37: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
İkinci Etap Yol Yapım İşİ	1.778.515,35
Engelsiz Üniversite	37.672,68
Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşİ	366.768,07
500 Kw Pv Güneş Enerji Santrali Trafo ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ ³	156.008,72
TOPLAM	761.035,18

Çizelge 38: 2009H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

³ 2015/116110 ihale kayıt numaralı 500 Kw Pv Güneş Enerjisi Santrali Trafo ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ için Üniversitemiz tarafından iş bitiminin süresinde yapılmadığı gerekçesi ile işin yüklenicisine gecikme cezası uygulanmış olup yapılan ceza kesintisinin haksız oldu iddiası ile işin yüklenicisi konuyu mahkemeye taşımıştır. Yargıtay kesinleşme şerhi ile birlikte çıkan mahkeme kararında Üniversitemiz tarafından uygulanan ceza kesintisinin yerinde olmadığı anlaşıldığından yapılan kesinti ilgili mahkeme kararına istinaden yükleniciye iade edilmiştir.

3.5.1. İkinci Etap Yol Yapım İşi

Üniversitemizin ikinci etap yerleşkesinde hizmete girmiş olan Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Binası ile Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Binalarına ve ilerleyen zamanlarda yapılması düşünülen eğitim ve hizmet alanlarına ulaşımın sağlanması amacıyla ikinci etap yol projesi çalışmaları 2018 yılında başlamış olup 24.06.2019 tarihinde ihaleye çıkmış ve 15.08.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 2020 yılı içerisinde, 22.06.2020 tarihinde 45 günlük, 04.08.2020 tarihinde 26 günlük uzatımı, ve 03.09.2020 tarihinde 20 günlük süre uzatımı olmak üzere proje ile ilgili üç kez revizyon yapılmıştır. Yapılan bu revizyonların sebebi salgın hastalıktan (Covid-19) kaynaklı yapım işlerinin yetiştirilememesidir. 2020 yılı içerisinde % 100 fiziki gerçekleştirme sağlanan projenin geçici kabulü yapılmış ve hizmete alınmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Sedat ULUTAŞ
Sözleşmenin Konusu	İkinci Etap Yol Yapım İşi
Proje Numarası	2009H03-1056
İhale Tarihi	24.06.2019
Sözleşme Tarihi	15.08.2019
Sözleşme Bedeli TL	6.198.000,00
Projeyle İlgili Revizyonlar	22.06.2020 Tarihinde 45 Günlük Süre Uzatımı, 04.08.2020 Tarihinde 26 Günlük Süre Uzatımı, 03.09.2020 Tarihinde 20 Günlük Süre Uzatımı.
Revizyon Nedenleri	Salgın (Covid-19)
Yer Teslim Tarihi	22.08.2019
Fiilen İşe Başlama Tarihi	22.08.2019
İşin Bitim Tarihi	24.09.2020
2020 Yılı Harcama Tutarı	1.778.515,35
Toplam Harcama Tutarı	6.185.901,68
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatin Durumu	Geçici Kabul Yapıldı

Çizelge 39: İkinci Etap Yol Yapım İşi



Resim 26: İkinci Etap Yol Yapım İşi

3.5.2. Engelsiz Üniversite

Üniversitemizin bütün yerleşke alanlarında engelli öğrencilerimizin bütün hizmet alanlarımıza erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlamakta ve mevzuata uygun olarak uygulamaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi binalarında kullanılmak üzere engelsiz üniversite kullanım amacına yönelik mal/malzemeler alınmıştır.





Resim 27: Engelsiz Üniversite kapsamında yapılan çalışmalara ait görseller

3.5.3. Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi

Üniversitemiz Ermenek ve Kazımkarabekir yerleşkelerinde bulunan Eğitim binalarının ısınma ihtiyaçları önceki yıllarda kömür ve fuel-oil ile sağlanmaktaydı. 2020 yılı içerisinde başlatılan proje çalışmaları tamamlanmış aynı yıl içerisinde ihale edilerek geçici kabulleri yapılmıştır. 2020 yılı Ekim ayı itibari ile söz konusu yerleşkelerdeki binaların ısınma ihtiyaçları doğalgaz sistemi ile sağlanmaya başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Mehmet Muhammet Özdoğru- Enka Gayrimenkul Peyzaj İsi Sanayi Müh.ve İnş.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi
Proje Numarası	2020H03-151368
İhale Tarihi	01.06.2020
Sözleşme Tarihi	26.06.2020
Sözleşme Bedeli TL	316.113,00

Projeyle İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	30.06.2020
Fiilen İşe Başlama Tarihi	30.06.2020
İşin Bitim Tarihi	18.08.2020
2020 Yılı Harcama Tutarı	366.768,07
Toplam Harcama Tutarı	366.768,07
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100

Çizelge 40: Doğalgaz dönüşüm yapım işi





Resim 28: Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi Görselleri

3.6. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2020 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 2.000,00 TL olup yıl içerisinde herhangi bir ödenek revizesi olmamıştır. Ermenek MYO Uygulama Oteli için izin çıkmamasından dolayı bu proje kapsamında harcama yapılamamıştır.


Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Uygulama Oteli (4.821 m ²)
Alt Projeler	Ermenek MYO Uygulama Oteli
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	10.606.000,00

Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.000,00
Eklene TL	0,00
Toplam Ödenek TL	2.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek	2.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0,00

Çizelge 41: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

3.6.1. ERMENEK MYO UYGULAMA OTELİ

2018 yılı yatırım programına alınan ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Regreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. Yatırım programında olmasına karşın Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından Tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.

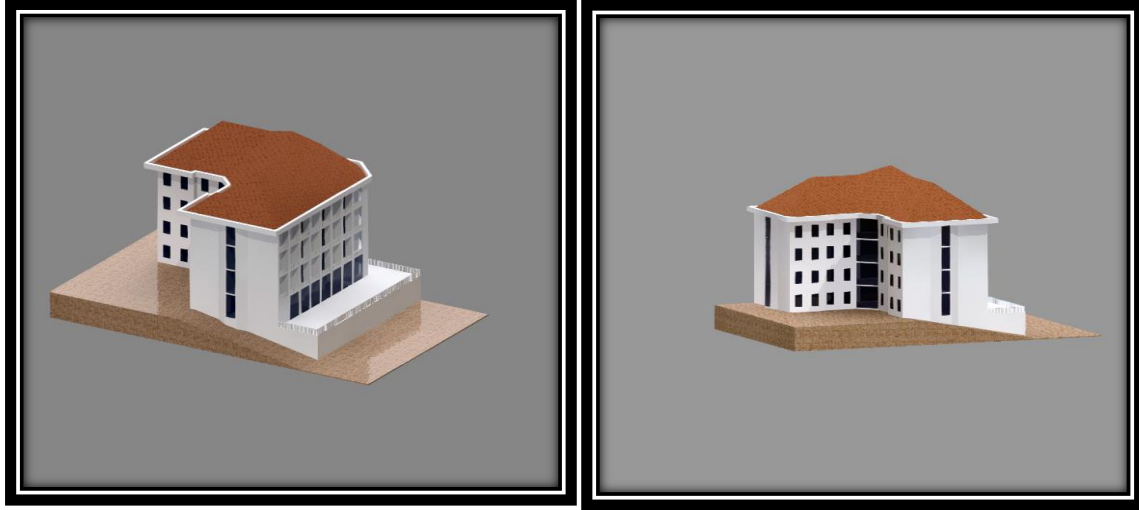

Resim 35: Ermenek MYO Uygulama Otelı Tasarım Projesi

3.7. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2020 yılı bütçemize ayrılan ödenek 50.000,00 TL olup yıl içerisinde herhangi bir ödenek revizyonu yapılmamıştır. Toplam ödenekten Spor Tesislerin Bakım-Onarımı kapsamında 40 kalem mal alımı için 40.887,00 TL harcanmış olup 9.113,00 TL ödenek kalmıştır. Yapılan harcamanın toplam ödeneğe oranı % 81,77 olarak gerçekleşmiştir. 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), (Stadyum 5.000 seyirci kapasitesi)
Alt Projeler	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), (Stadyum 5.000 seyirci kapasitesi)
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı TL	22.796.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	50.000,00
Eklene TL	0,00
Toplam Ödenek TL	50.000,00
Harcama TL	40.887,00
Kalan Ödenek	9.113,00
Gerçekleşme Oranı (%)	81,77

Çizelge 42: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

STRATEJİK PLAN YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı 12 Kasım 2018 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak, yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Stratejik Planımızda dört amaç ve bu amaçlarla ilişkili 18 hedef belirlenmiştir. Üniversitemiz, ortak akılla hazırlanan Stratejik Planımız ile farklılaşma alanları olarak belirlenen Türk dili, gıda-tarım ve temiz enerji alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik belirlenen hedeflerinin yanı sıra, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması, kurumsallaşma ve kalitenin artırılması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile bilgiye erişim imkânları ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik belirlenen amaç ve hedeflerini de gerçekleştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz stratejik planı ile yatırım programı ilişkisi kurularak aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler	
A-1	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H05-1269-151392	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	40.887,00	Isıtma sistemine yönelik malzeme alımı
					2010H05-1269-15497	Spor Salonu (Ermenek MYO 500 seyirci kapasitesi)	0,00	Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir
					2010H05-1269-41168	Stadyum-Tribün	0,00	Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir
			Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H03-1057-68203	Ermenek MYO Uygulama Oteli	0,00	Proje hazırlık aşamaları devam ediyor.
			Sağlık	Muhtelif İşler	2020I00-140541-140554	Makine-Teçhizat	5.149.102,00	Diş üniteleri, ağız ve diş eğitim malzemeleri ile çeşitli sağlık ekipmanlarının alımı gerçekleştirilmiştir
			Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	2020H03-151368-151369	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2.338.964,82	İkinci etap yol yapım işi, engelsiz üniversite uygulamaları yönelik malzeme, Doğalgaz dönüşüm sistemi işleri yapılmıştır.

				Muhtelif İşler	2020H03-151364-151365	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	7.832.717,59	Büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.
A-2	Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.	Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı	2020H03-151366-151367	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	584.106,03	Abone veri tabanları, e-kitaplar ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir.
A-4	Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.	Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2020H03-151359-151360	Etüt-Proje	70.800,00	Toplu konut projesi kapsamında imar tadilat projesi, Üniversite camii çevresi peyzaj düzenlemesi projesi ve stadyum-tribün ve Ermenek kapalı spor salonu statik ve mimari projesi hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.

4. Proje Bazında Harcamalar

Proje No	Proje Adı	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	2020 Yılı Ödeneği					
				Program		Revize		Harcama	
				Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ					11.450.000		17.400.000		16.016.577
EĞİTİM					10.450.000		12.247.656		10.867.475
Beden Eğitimi Ve Spor					50.000		50.000		40.887
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)	2010-2023	0	50.000,00	0	50.000,00	-	40.887,00
2010H05-1269-151392	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2020-2020	0	46.000,00	0	46.000,00	-	40.887,00
2010H05-1269-15497	Spor Salonu	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)	2016-2023	0	2.000,00	0	2.000,00	-	-
2010H05-1269-41168	Stadyum	Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)	2016-2023	0	2.000,00	0	2.000,00	-	-
Yükseköğretim					10.400.000		12.197.656		10.826.588
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	Uygulama Oteli (4.821 m ²)	2009-2022	0	2.000,00	0	2.000,00	-	-
2009H03-1057-68203	Ermenek MYO Uygulama Oteli	Uygulama Oteli (4.821 m ²)	2018-2022	0	2.000,00	0	2.000,00	-	-
2020H03-151359-151360	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2020-2020	0	200.000,00	0	200.000,00	-	70.800,00
2020H03-151364-151365	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2020-2020	0	6.500.000,00	0	8.297.656,00	-	7.832.717,00
2020H03-151366-151367	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020-2020	0	598.000,00	0	598.000,00	-	584.106,00
2020H03-151368-151369	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	0	3.100.000,00	0	3.100.000,00	-	2.338.965,00
SAĞLIK					1.000.000		5.152.344		5.149.102
Sağlık					1.000.000		5.152.344		5.149.102
2020I00-140541-140554	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	2020-2020	0	1.000.000,00	0	5.152.344,00	-	5.149.102,00

5. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, E-bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) programları arasında düzenleme yapılmalıdır.
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
5. Proje ve ihale süreçlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.
6. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu inhale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.
