



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2021 YATIRIM YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU





Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.

Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
ÇİZELGELER	iii
1. YÖNETİCİ ÖZETİ	v
2. GENEL DEĞERLENDİRME	7
2.1. UZGÖRÜŞÜMÜZ	7
2.2. ÖZGÖREVİMİZ	7
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ	7
2.4. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	8
2.5. YATIRIMLARIN FINANSMAN KAYNAKLARI	11
2.6. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	12
2.7. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	16
2.7.1. Hedeflenen	16
2.7.2. Gerçekleşen	17
2.7.3. Devam Edenler	17
2.8. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	19
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	19
2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri	27
2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	31
3. PROJE UYGULAMALARI	32
3.1. 2021H03-167396 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	32
3.2. 2021H03-167400 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	33
3.3. 2021I00-162441 SAĞLIK-MUHTELİF İŞLER PROJESİ	39
3.4. 2020H03-151366 YAYIN ALIMI PROJESİ	42
3.5. 2020H03-151368 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	46
3.5.1. KMÜ Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşİ	48
3.5.2. KMÜ Camii Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	50
3.5.3. Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşİ	51
3.5.4. Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşİ	52
3.5.5. Şifa Giriş Kapısı	53
3.5.6. Engelsiz Üniversite	53
3.6. 2009H03-1057 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	54
3.6.1. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli	54
3.7. 2010H05-1269 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ	55
3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu	55
3.7.1. 5.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum	56
4. STRATEJİK PLAN YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ	57
5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR	59
5. ÖNERİLER	60

ÇİZELGELER

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar	8
Çizelge 2: Eğitim Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefleri	8
Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefler	9
Çizelge 4: Farklılaşma Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefler	9
Çizelge 5: Kurumsallaşma Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefler	10
Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları	11
Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m ²)	12
Çizelge 8: Taşınmazların Genel Dağılımı (m ²).....	13
Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı	14
Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)	16
Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı.....	19
Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)	21
Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	22
Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	23
Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	24
Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)	25
Çizelge 17: Geyrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	26
Çizelge 18: Revizyon (2021H03-167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi).....	27
Çizelge 19: Revizyon (2021H03-167400 Nolu Muhtelif İşler)	27
Çizelge 20: Revizyon (2021H03-167398 Nolu Yayın Alımı)	28
Çizelge 21: Revizyon (2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı)	28
Çizelge 22: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)	29
Çizelge 23: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	29
Çizelge 24: Revizyon (2021I00-162441 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler)	30
Çizelge 25: 2021H03-167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	32
Çizelge 26: 2021H03-167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamalarının Detayı	32
Çizelge 27: 2021H03-167400 Nolu Muhtelif İşler Projesi	33

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)	34
Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM)	34
Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)	36
Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan İşler (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)	36
Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler (Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı)	36
Çizelge 33: 2021I00-162441 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi	39
Çizelge 34: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	40
Çizelge 35: 2021H03-167398 Nolu Yayın Alımı Projesi	42
Çizelge 36: 2021H03-167398 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı	43
Çizelge 37: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	46
Çizelge 38: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı	47
Çizelge 39: KMÜ Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşİ	48
Çizelge 40: Camii Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	50

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Bütün paydaşlarımızla bölgesel kalkınma özgörevini ve farklılaşmayı ortaya koymak adına iş birlikleri geliştirerek kamu kurumları, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi/Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

2021 yılı içerisinde Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güneş Enerjisi Santrali ve yapımı planlanan diğer binalarımıza ulaşım imkânı sağlanan yolun aydınlatma işi yapılmıştır. Eğitim Fakültesi binası ile Tıp Fakültesi çevre düzenleme işi yıl içerisinde yapılan ihaleler sonucu alınan malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından yapılmıştır. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlanarak mevzuata uygun olarak uygulanmaktadır.

Yine 2021 Yılı Yatırım Bütçemizde yer alan ödeneklerden, eğitim-öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikaların öncelendiği görülmektedir. Buna yönelik olarak gerekli ödenekler, makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları ile öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha estetik ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ilkesi ile 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı “2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Namık AK
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Uzgörüřümüz

İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiřtiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliřtirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.

2.2. Özgörevimiz

Üniversitemiz arařtırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine baėlı ve evrensel değerlerle donatılmış görev ve sorumluluėunun bilincinde erdemli bir neslin yetiřtirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiřtir.

2.3. Temel Deėerlerimiz

- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Etik deėerlere baėlılık
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Öğrenci merkezlilik
- ✓ Kent, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
- ✓ Türk dilinin doğru kullanılması ve yaygınlařtırılmasına karřı duyarlılık

2.4. Temel Amaç ve Hedefler

EKSENLER	AMAÇLAR
EĞİTİM EKSENİ	Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ	Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
FARKLILAŞMA EKSENİ	Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
KURUMSALLAŞMA EKSENİ	Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.
	Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.
	Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.
	Teoriye uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri

AMAÇ 2	HEDEFLER
Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.
	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.

Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 3	HEDEFLER
Türk dili, gıda, tarım ve temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.	Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.
	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.
	Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.
	Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.
	TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.

Çizelge 4: Farklılaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 4	HEDEFLER
Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.
	Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.
	Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.
	Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.
	Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.

Çizelge 5: Kurumsallaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler

2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 15.057.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 26.707,000,00 TL olmuştur. Projelerin sektörlere göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2021 Yılı Program Ödeneği	2021 Yılı Revizeli Ödenek	2021 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	10.606.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	8.510.205,00	3.358.205,00	1.501.000,00	5.151.000,00 ¹	2.830.298,45
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	22.750.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	10.207,00
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler	16.753.000,00	0,00	8.753.000,00	16.753.000,00	15.981.178,89
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	599.407,68
Sağlık-Sağlık	Muhtelif İşler Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.989.970,58
TOPLAM		63.419.205,00	3.358.205,00	15.057.000,00	26.707.000,00	23.411.062,60

Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları


¹ 750.000,00 TL hibedir.

2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 95,33'ü Yunus Emre Yerleşkesi, % 3,25'i Ermenek Yerleşkesi ve % 1,42'si da Kazım Karabekir Yerleşkesinde yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Taşınmaz Maliki	Alan
Yunus Emre Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	1.607.650,89
Ermenek Yerleşkesi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	54.787,11
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	23.938,98
Genel Toplam		1.686.376,98

Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m²)

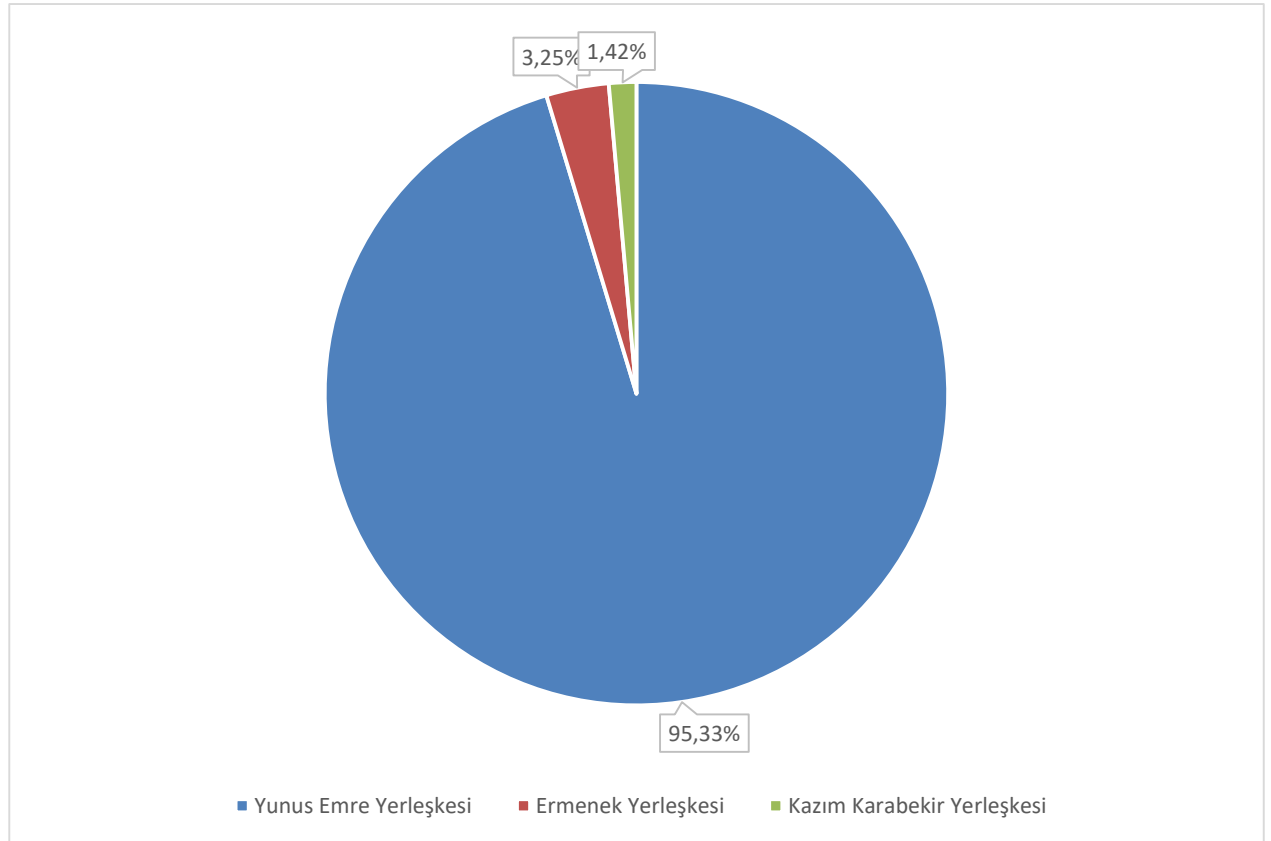

Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı


İLÇESİ	MAHALLE	ADA	PARSEL	YÜZÖLÇÜM (m ²)	CİNSİ	HİSSE	MÜLKİYET
MERKEZ	HAMİDİYE	361	27	49.438,06	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	HAMİDİYE	361	28	29.204,52	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	HAMİDİYE	361	33	30.076,57	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	KIRBAĞI	3911	30	1.607.650,89	Beş Katlı Betonarme Eğitim Fakültesi Ve Beş Katlı Betonarme Sağlık Bilimleri Fakültesi Ve Beş Katlı Betonarme Diş Hekimliği Fakültesi Ve Meslek Yüksek Okulu Ve Arsası	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	YENİŞEHİR	5168	2	1.375,18	ARSA	TAM	KMÜ
MERKEZ	YENİŞEHİR	5169	1	4.117,15	ARSA	TAM	KMÜ
ERMENEK	SEYRAN	112	33	54.787,11	Bir Adet 4, Bir Adet 5 Katlı Yüksek Okul Binası, Bir Adet 5, Bir Adet 6 Katlı Öğrenci Yurdu Binası, Bir Adet 4 Katlı İlköğretim Okulu Binası Ve Arsası	TAM	KMÜ
KAZIM KARABEKİR	EMSAL HAYAT	970	4	23.938,98	Beş Katlı Betonarme Okul, Üniversite Araştırma Binası Ve İki Katlı Karma Çok Amaçlı Salon Ve Arsası	TAM	MALİYE HAZİNESİ
KAZIM KARABEKİR	BOYACI	892	2	494,57	ARSA	HİSSE Lİ	KMÜ (31500/624018) KAZIMKARABEKİ R BELEDİYESİ (592518/624018)
KAZIM KARABEKİR	SELÇUKLU	286	1	35.827,00	ARSA	HİSSE Lİ	KMÜ (23826/35827) Maliye Hazinesi (12001/358)
ERMENEK	SEYRAN	1059	1	6.754,29	ARSA	TAM	KMÜ

Çizelge 8: Taşınmazların Genel Dağılımı (m²)

Üniversitemizin kapalı mekânların hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
Yönetim	19.152	0	0	19.152
Eğitim	129.245	7.000	11.845	148.090
Sosyal	16.736	1.158	0	17.894
Spor	12.582	0	150	12.732
Barınma	473	0	0	473
Diğer	2.055	0	0	2.055
Genel Toplam	180.243	8.158	11.995	200.396

Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı

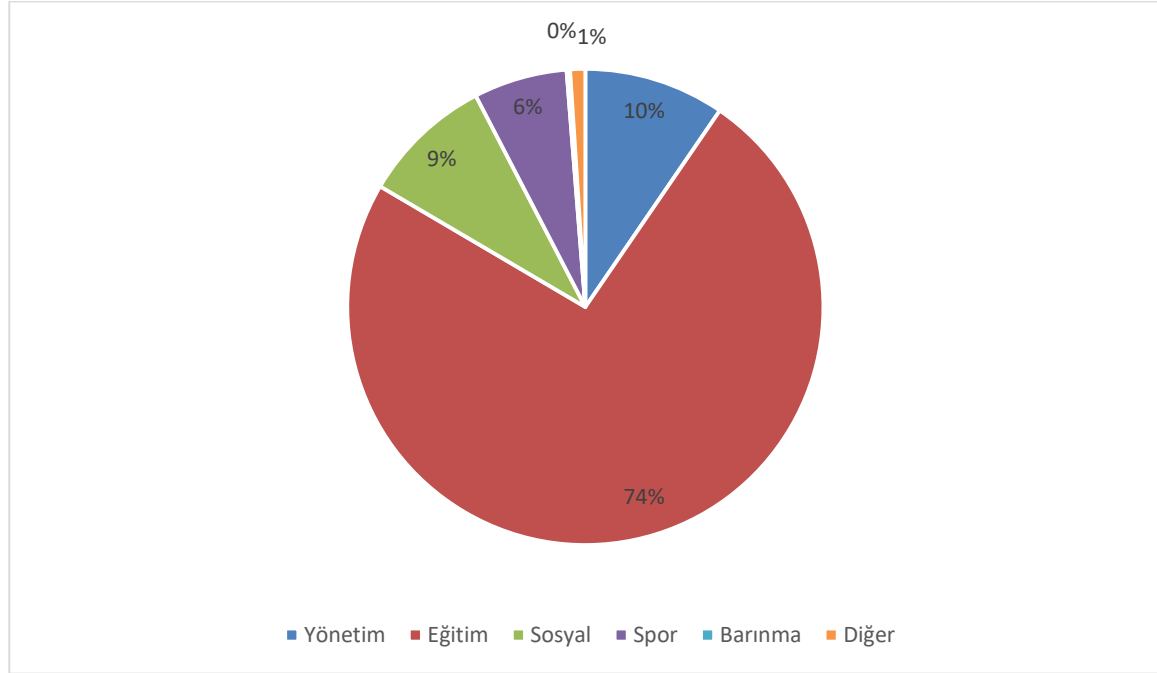

Grafik 2: Kapalı Alanların Hizmet Alanları İtibarıyla Dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı, kapalı mekanlara ilişkin bilgiler ve finansman kaynağına göre dağılımı aşağıdaki çizelgelerde yer almaktadır.

Yerleşke	Bina Adı	Birimi	Kapalı Alan	Fonksiyonu
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Meslek Yüksekokulu	Meslek Yüksekokulu	4.325	Eğitim(E)
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Meslek Yüksekokulu Atölye	Meslek Yüksekokulu	1.638	Eğitim(E)
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Spor Salonu	Meslek Yüksekokulu	150	Spor(S)
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Uysal Hasan Kalan Meslek Yüksekokulu	Meslek Yüksekokulu	5.882	Eğitim(E)
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	Meslek Yüksekokulu	7.000	Eğitim(E)
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Çok Amaçlı Salon	Konferans Salonu	1.158	Toplantı ve Konferans (C)
Yunus Emre Yerleşkesi	Misafirhane	İdari Bina	1.130	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	13.700	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	Fen Fakültesi	4.635	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Sosyal Bilimler MYO/Uygulamalı Bilimler MYO	Sosyal Bilimler MYO/Uygulamalı Bilimler MYO	6.640	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Bilgi İşlem / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanlıkları	3.652	Yönetim(M)
Yunus Emre Yerleşkesi	Rektörlük Binası	Rektörlük	5.000	Yönetim(M)
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.600	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Mühendislik Fakültesi	Mühendislik Fakültesi	20.435	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.170	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A Blok	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	3.798	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu B Blok	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	3.367	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	KMÜ Çarşı	Yemekhane	13.000	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	7.500	Spor Alanları(S)
Yunus Emre Yerleşkesi	Isı Merkezi	Isı Merkezi	2.055	Diğer(O)

Yerleşke	Bina Adı	Birimi	Kapalı Alan	Fonksiyonu
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3.615	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Rektörlük Konutu	Rektörlük	473	Barınma(A)
Yunus Emre Yerleşkesi	Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu	Edebiyat Fakültesi	17.420	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzları	5.082	Spor Alanları(S)
Yunus Emre Yerleşkesi	Amfi Tiyatro	Amfi Tiyatro	533	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	Amfi Tiyatro Depolar	Amfi Tiyatro	2.073	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	9.270	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	İslami İlimler Fakültesi	İslami İlimler Fakültesi	8.350	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Eğitim Fakültesi	Eğitim Fakültesi	8.480	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Kütüphane	Kütüphane	10.500	Yönetim(M)
Yunus Emre Yerleşkesi	Tıp Fakültesi	Tıp Fakültesi	10.765	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi	Ahmet Keleşoğlu Diş hekimliği Fakültesi	12.000	Eğitim(E)
GENEL TOPLAM			200.396	

Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

2.7. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.7.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında eğitim sektöründe altı, sağlık sektöründe ise bir adet proje yer almaktadır. Öncelikle 2019-2023 stratejik planı doğrultusunda Tıp Fakültesi, Ahmet KELEŞOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan makine teçhizatın alınması ile çevre düzenlemesi hedeflenmiştir. Ayrıca Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2021 yılı Bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2. Gerçekleşen

2021 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ✓ Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güneş Enerjisi Santrali ve yapımı planlanan diğer binalarımıza ulaşım imkânı sağlanan yolun aydınlatma işi,
- ✓ Eğitim Fakültesi binası ile Tıp Fakültesi çevre düzenleme işi, (yıl içerisinde yapılan ihaleler sonucu alınan malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından)
- ✓ Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlanarak mevzuata uygun olarak uygulanması işi,
- ✓ Cins değişikliği kapsamında yerleşkelerin aplikasyon ve aplikasyon projeleri hizmet alımı işi,
- ✓ Sağlık alanındaki birimler başta olmak üzere Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar)
- ✓ Araç takip sistemi yazılımı güncellenmiş, Windows 10 işletim sistemleri, hastane bilgi yönetimi sistemi ve Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan gerekli yazılım alımları,
- ✓ 2021 yılı içerisinde elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar.

2.7.3. Devam Edenler

Üniversitemizde 2021 yılı itibarıyla devam eden projeler kapsamında 2010H05-1269 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi içinde yer alan Stadyum (Tribün) yapım işi ile Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu yapım işi, 2009H03-1057 numaralı Derslikler ve Merkezi Birimler projesi içinde yer alan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli yapım işi olmak üzere toplam üç adet proje mevcuttur. Bu projelere çeşitli nedenlerden dolayı 2021 yılı için herhangi bir ödenek tahsis edilmemiş olup bu projeler iz ödenek bedeli ile takip edilmektedir. Bu projelere ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

✓ 2018 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak son üç yıldır yatırım için izin verilmeyen Ermenek 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu işinin izin ve gerekli kaynak tahsisinin sağlanması halinde 2023 yılında yapılması öngörülmektedir.

✓ 2018 yılı yatırım programına alınan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. İlgili projeye yatırım izni verilmemekle birlikte Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.

✓ 2021 yılı Eylül ayında cami çevre düzenleme ihalesi yapılmış olup 2022 Haziran ayı sonunda çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

✓ Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji binasına halkımızın ulaşım olanaklarını kolaylaştırmak adına Yunus Emre Yerleşkemizin Güney tarafına yapılması planlanan giriş kapısı için çalışmalara başlanmıştır.

✓ Tıp Fakültesi morfoloji binamızın mimari projesi hazırlanmakta olup hem öğrenci ve öğretim üyelerinin hemde Karaman halkının istifade edebileceği şekilde planlanmaktadır. Projemizin 2022 yılı içerisinde hazırlanması hedeflenmektedir.


2.8. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 15.057.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 25.957.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 23.411.062,60 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 90,19'dur. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir

Bütçe Tertibi	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerç. Oran
06.01	10.353.000,00	8.000.000,00	257.004,00	18.095.996,00	18.058.823,23	99,79%
06.03	300.000,00	257.004,00	0,00	557.004,00	403.452,26	72,43%
06.05	1.703.000,00	2.900.000,00	0,00	4.603.000,00	2.840.505,45	61,71%
06.06	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	274.913,83	91,64%
06.07	2.401.000,00	0,00	0,00	2.401.000,00	1.833.367,83	76,36%
Toplam	15.057.000,00	11.157.004,00	257.004,00	25.957.000,00	23.411.062,60	90,19%

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı

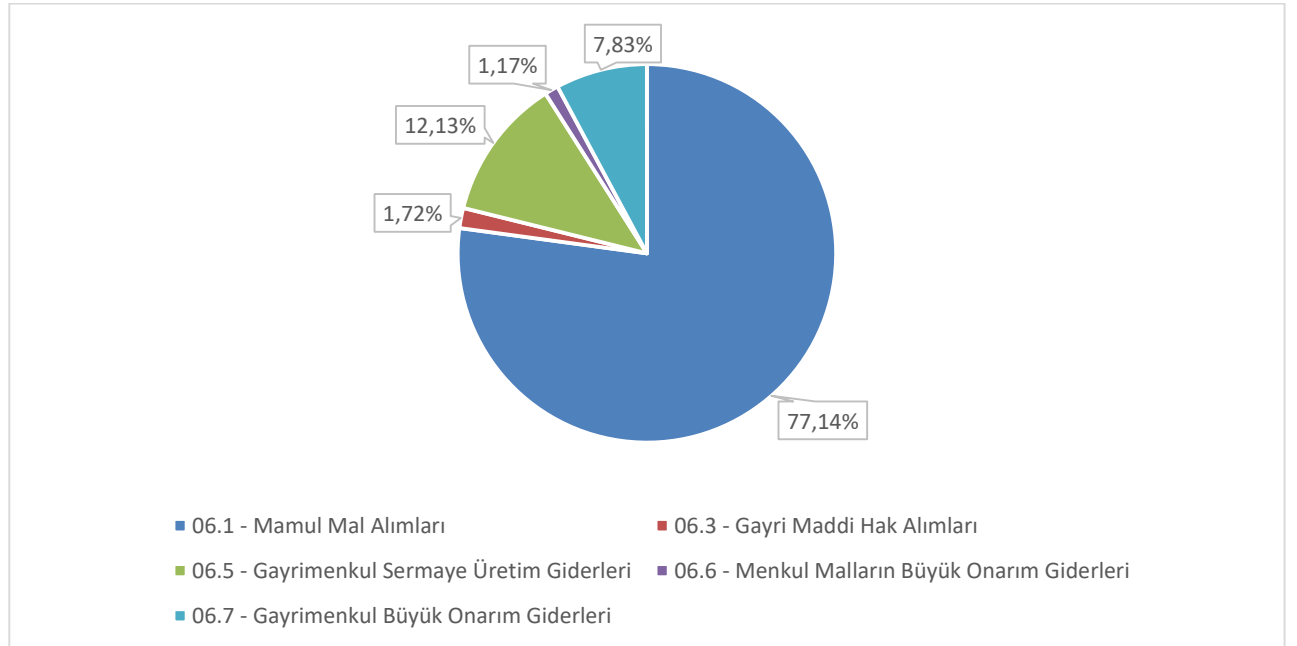

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Sermaye giderlerine ilişkin 2021 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
06	01	10	01	Büro Mefruşatı Alımları	1.804.340,25
06	01	10	03	Okul Mefruşatı Alımları	1.365.160,61
06	01	10	04	Hastane Mefruşatı Alımları	1.021.932,56
06	01	10	90	Diğer Mefruşat Alımları	82.930,40
06	01	10		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	4.274.363,82
06	01	20	01	Büro Makineleri Alımları	108.132,41
06	01	20	02	Bilgisayar Alımları	1.246.517,54
06	01	20	03	Tıbbi Cihaz Alımları	4.106.476,55
06	01	20	04	Laboratuvar Cihazı Alımları	3.502.587,16
06	01	20	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	120.630,11
06	01	20	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.825.225,21
06	01	20		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	10.909.568,98
06	01	30	02	Atölye Gereçleri Alımları	8.431,35
06	01	30	04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	2.267.051,40
06	01	30		Avadanlık Alımları	2.275.482,75
06	01	60	01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	288.242,79
06	01	60	03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	311.164,89
06	01	60		Yayın Alımları ve Yapımları	599.407,68
06	01			Mamul Mal Alımları	18.058.823,23
06	03	10	01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	146.448,26
06	03	10		Bilgisayar Yazılımı Alımları	146.448,26
06	03	90	01	Diğer Fikri Hak Alımları	257.004,00
06	03	90		Diğer Fikri Hak Alımları	257.004,00
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	403.452,26
06	05	10	01	Proje Giderleri	10.207,00
06	05	10	90	Diğer Giderler	35.624,20
06	05	10		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	45.831,20
06	05	20	01	İnşaat Malzemesi Giderleri	11.800,00
06	05	20	90	Diğer Giderler	18.691,20
06	05	20		Malzeme Giderleri	30.491,20
06	05	70	07	Yol Yapım Giderleri	1.276.948,85
06	05	70	90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	954.170,42
06	05	70		Müteahhitlik Giderleri	2.231.119,27
06	05	90	01	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	533.063,78
06	05	90		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	533.063,78
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.840.505,45
06	06	20	01	Malzeme Giderleri	55.057,19
06	06	20		Malzeme Giderleri	55.057,19
06	06	40	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	520,05
06	06	40		Enerji Giderleri	520,05
06	06	90	01	Diğer Giderler	219.336,59
06	06	90		Diğer Giderler	219.336,59
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	274.913,83
06	07	20	90	Diğer Giderler	113.415,70
06	07	20		Malzeme Giderleri	113.415,70

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
06	07	70	90	Diğerleri	1.435.905,42
06	07	70		Müteahhitlik Giderleri	1.435.905,42
06	07	90	01	Diğer Giderler	284.046,71
06	07	90		Diğer Giderleri	284.046,71
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.833.367,83
06				Sermaye Giderleri	23.411.062,60

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

06.01 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 10.353.000,00 TL olan 06.01 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 8.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 257.004,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 18.095.996,00 TL olmuştur. 2021H03-167400 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 13.726.448,97 TL, 2021I00-162441 nolu Muhtelif İşler-Sağlık Projesi kapsamında ise 3.732.966,58 TL ve 2021H03-167398 Yayın Alımı Projesi kapsamında 599.407,68 TL harcama yapılmıştır. Bu üç projenin toplam harcaması 18.058.823,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 99,79'dur. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.01.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	1.804.340,25	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.10.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	1.349.207,01	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.10.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	15.953,60	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler
06.01.10.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hastane Mefruşatı Alımları	1.021.932,56	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	65.820,40	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	17.110,00	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler
06.01.10	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			4.274.363,82	
06.01.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	108.132,41	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.20.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	607.832,18	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.01.20.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	638.685,36	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.20.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	2.309.006,24	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler
06.01.20.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	1.797.470,31	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	367.166,48	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler
06.01.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	3.135.420,68	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.20.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	120.630,11	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	1.704.716,53	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.20.90	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	120.508,68	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler
06.01.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları			10.909.568,98	
06.01.30.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Atölye Gereçleri Alımları	8.431,35	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.30.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	1.971.662,00	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.01.30.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	295.389,40	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler
06.01.30	Avadanlık Alımları			2.275.482,75	
06.01.60.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	288.242,79	2021H03-167398	Yayın Alımı
06.01.60.03	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	311.164,89	2021H03-167398	Yayın Alımı
06.01.60	Yayın Alımları ve Yapımları			599.407,68	
06.01	Mamul Mal Alımları			18.058.823,23	

Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 300.000,00 TL olan 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde 257.004,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 557.004,00 TL olmuştur. 2021H03-167400 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 146.448,26 TL, 2021I00-162441 nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında 257.004,00 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 72,43'dür. 06.03 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.03.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	146.448,26	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.03.10	Bilgisayar Yazılımı Alımları			146.448,26	
06.03.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Fikri Hak Alımları	257.004,00	2021I00-162441	Sağlık-Muhtelif İşler
06.03.90	Diğer Fikri Hak Alımları			257.004,00	
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları			403.452,26	

Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.703.000,00 TL olan 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 2.900.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 4.603.000,00 TL olmuştur. 2021H03-167396 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 10.207,00 TL ve 2020H03-151368 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2.830.298,45 TL olmak üzere toplamda 2.840.505,45 TL harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 61,71'dir. 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.05.10.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	10.207,00	2021H03-167396	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
06.05.10.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kapsamında Diğer Giderler	35.624,20	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.05.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler			45.831,20	

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.05.20.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İnşaat Malzemesi Giderleri	11.800,00	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.05.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Malzeme Giderleri	18.691,20	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.05.20	Malzeme Giderleri			30.491,20	
06.05.70.07	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yol Yapım Giderleri	1.276.948,85	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.05.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	954.170,42	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.05.70	Müteahhitlik Giderleri			2.231.119,27	
06.05.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	533.063,78	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı
06.05.90	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			533.063,78	
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			2.840.505,45	

Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 300.000,00 TL olan 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde ödenek eklenmemiştir. 2021H03-167400 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 274.913,83 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 91,64'dür. 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.06.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	33.582,96	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.20.01	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	9.988,70	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.20.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	6.372,00	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.20.01	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Malzeme Giderleri	5.113,53	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.20	Malzeme Giderleri			55.057,19	
06.06.40.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Akaryakıt ve Yağ Alımları	520,05	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.40	Enerji Giderleri			520,05	
06.06.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	116.588,46	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.90.01	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Diğer Giderler	79.148,13	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	23.600,00	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.06.90	Diğer Giderler			219.336,59	
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			274.913,83	

Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 2.401.000,00 TL olan 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde ödenek eklemesi yapılmamıştır. 2021H03-167400 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.833.367,83 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 76,36'dır. 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.07.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Malzeme Giderleri	113.415,70	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.07.20	Malzeme Giderleri			113.415,70	
06.07.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.396.375,42	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.07.70.90	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	Diğer Müteahhitlik Giderleri	39.530,00	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.07.70	Müteahhitlik Giderleri			1.435.905,42	
06.07.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	284.046,71	2021H03-167400	Muhtelif İşler
06.07.90	Diğer Giderler			284.046,71	
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			1.833.367,83	

Çizelge 17: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-18* ile 23'de yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'de gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2021H03-167396
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Yatırımı TL	200.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	200.000,00
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	200.000,00

Çizelge 18: Revizyon (2021H03-167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2021H03-167400
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Yatırımı TL	8.753.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	8.000.000,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	16.753.000,00
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	16.753.000,00

Çizelge 19: Revizyon (2021H03-167400 Nolu Muhtelif İşler)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2021H03-167398
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Yatırımı TL	600.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	600.000,00
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	600.000,00

Çizelge 20: Revizyon (2021H03-167398 Nolu Yayın Alımı)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2020H03-151368
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2020-2022
2021 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	7.315.000,00
2020 Yılı Kümülatif Harcama TL	3.358.205,00
2021 Yılı Yatırımı TL	1.501.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	2.900.000,00 + 750.000,00 (Hibe)
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	8.510.205,00
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	5.151.000,00

Çizelge 21: Revizyon (2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H03-1057
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2023
2021 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	10.606.000,00
2020 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2021 Yılı Yatırımı TL	1.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	10.606.000,00
2020 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	1.000,00


Çizelge 22: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)

Sektörü	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H05-1269
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2023
2021 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	22.750.000,00
2020 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2021 Yılı Yatırımı TL	2.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	22.750.000,00
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	2.000,00

Çizelge 23: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2021I00-162441
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Yatırımı TL	4.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	4.000.000,00
2021 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	4.000.000,00

Çizelge 24: Revizyon (2021I00-162441 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler)

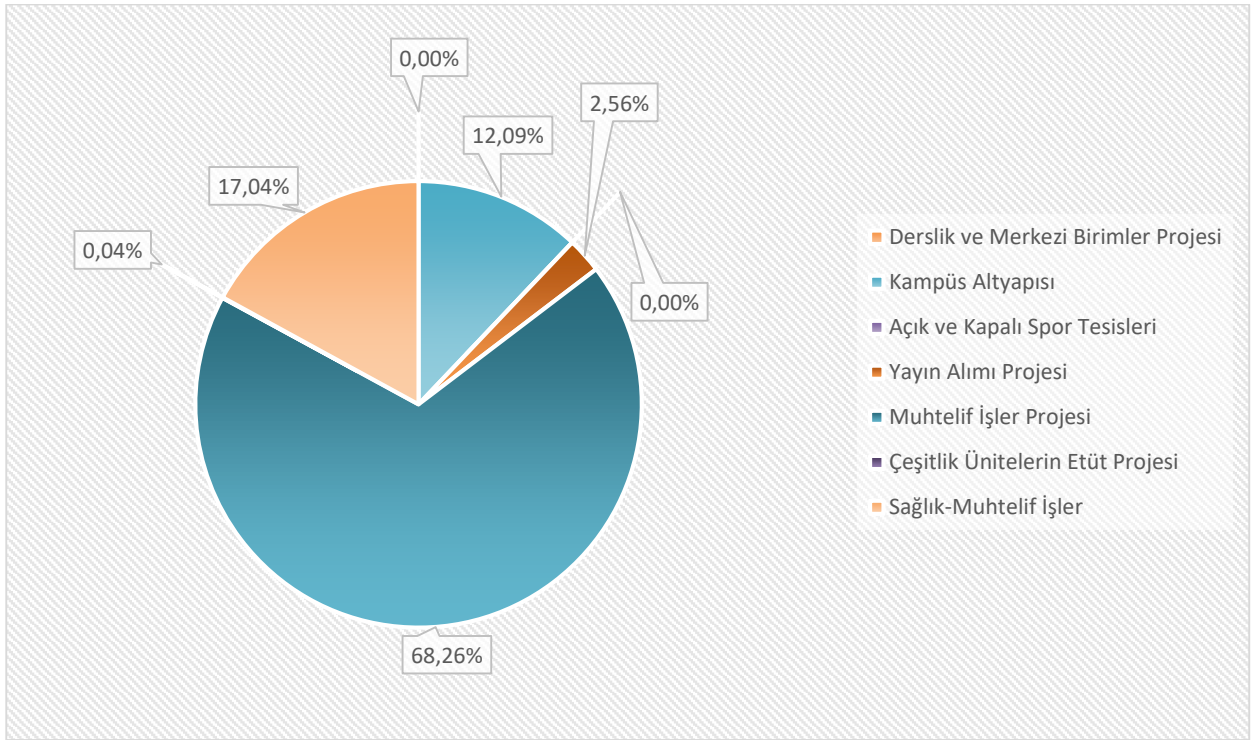

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı (Ödenek Eklemesi Yapılanlar)

2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması, ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca projenin uygulanması aşamasında sürekli artan fiyatlar nedeniyle yükleniciler zor durumda kalmaktadır.
- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.
- Kesin teminatın iadesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ihale mevzuatı gereğince geçici kabul yapıldıktan sonra kesin teminatın yarısının iade edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun'a göre kesin teminatın yarısının iadesinde ilişiksiz belgesi aranmamakta, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı Kanun'a göre ilişiksiz belgesi düzenlenmeden kesin teminatın yarısının iadesinin yapılamayacağı belirtilmekte olup SGK tarafından ilişiksiz belgesi düzenlenebilmesi için işe ait kesin hakediş tutarı istenilmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kesin hakediş tutarı, kesin kabul aşamasında kesin hakediş raporu ile tespit edilmektedir. Geçici kabul işleminden sonra işin kesin hakediş tutarı belli olmadığı için kesin teminatın yarısının iadesi mümkün olmamaktadır.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2021H03-167396 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2021 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Toplam harcama ise 10.207,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021H03-167396 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	200.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	200.000,00
Harcama TL	10.207,00
Kalan Ödenek TL	189.793,00
Gerçekleşme Oranı %	5,10

Çizelge 25: 2021H03-167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemiz tarafından 2021 yılında bir adet proje hizmeti alım işi gerçekleştirilmiştir.

2021H03-167396 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan harcamaya ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcama Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Cins Değişikliği Kapsamında Yerleşkelerin Aplikasyon ve Aplikasyon Projeleri Hizmet Alımı	10.207,00
TOPLAM	70.800,00

Çizelge 26: 2021H03-167396 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamalarının Detayı

3.2. 2021H03-167400 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi için 2021 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 8.753.000,00 TL olup finansman fazlasından 8.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 16.753.000,00 TL, toplam harcama ise 15.981.178,89 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021H03-167400 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	16.753.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	8.753.000,00
Eklenen TL ²	8.000.000,00
Toplam Ödenek TL	16.753.000,00
Harcama TL	15.981.178,89
Kalan Ödenek TL	771.821,11
Gerçekleşme Oranı %	95,39

Çizelge 27: 2021H03-167400 Nolu Muhtelif İşler Projesi

² Finansman fazlasından likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutar (TL)
Laboratuvar Cihazı Alımları	131	3.135.420,68
Laboratuvar Gereçleri Alımları	255	1.971.662,00
Büro Mefruşatı Alımları	2.659	1.804.340,25
Tıbbi Cihaz Alımları	42	1.797.470,31
Diğer Makine Teçhizat Alımları	188	1.704.716,53
Okul Mefruşatı Alımları	1.332	1.349.207,01
Hastane Mefruşatı Alımları	68	1.021.932,56
Bilgisayar Alımları	106	638.685,36
Bilgisayar Yazılımı Alımları	84	146.448,26
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	5	120.630,11
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri (Akü, UPS, yedek parça alımları)	172	116.588,46
Büro Makinaları Alımları	103	108.132,41
Diğer Mefruşat Alımları	613	65.820,40
Malzeme Giderleri (Yedek parça alımları)	82	33.582,96
Atölye Gereçleri Alımları	7	8.431,35
Akaryakıt ve Yağ Alımları	8	520,05
Genel Toplam	5.855	14.023.588,70

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Onarım İşİ	2	71.083,20
Dumas Yedek Parça	1	5.113,53
UV Cihazı Bakım Onarımı	1	4.500,00
UPS Bakım Onarımı	1	3.064,93
TG-DTA Cihazı Bakım Onarımı	1	500
TOPLAM	6	84.261,66

Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Büyük Bakım Onarım	1	1.028.960,00
Mal ve Malzeme Alımı (Otomasyon kısmı)	32	89.975,00
Mal Malzeme Alımı (Sulama ve Tesisat)	7.742	88.783,20
Elektrik Malzemesi Alımı	570	77.219,20
İnşaat Malzemeleri Alımı	5.162	70.120,32
Süs Havuzları Yalıtımlı Boya Alımı	75	47.253,10
Kazım Karabekir MYO Trafo ve Merkez Yerleşke OG Kök Hücrelerinde Bakım Onarım ve Revizyon İşİ	1	46.020,00
Asansörlerin Revizyon Bakım Onarımı	1	46.020,00
Spor Salonu Yatay Yağmur Oluğu ve Yağmur İniş Borusu Yenilenmesi İşİ	1	44.840,00
Sosyal Bilimler MYO Ortak Eğitim Alanlarındaki Islak Hacimlerin Tadilatı	1	42.480,00
Asansörlerin Bakım Onarımı	49	32.957,40
Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dış Cephe Bakım Onarımı	1	30.680,00
Alüminyum imalatlar bakım onarımı	1	29.367,29
Jenaratörlerin bakım onarımı	14	23.600,00
Mal ve Malzeme Alımı (Peyzaj Malzemesi Kısmı)	390	23.440,70
Çeşitli Hizmet Binalarının Çatı ve Oluk Tadilatı Bakım Onarımı	1	19.942,00
Turnike Sistemlerinin Bakım Onarımı	1	18.006,80
Merkezi Isıtma Sistemi Brülörleri Bakım Onarım İşİ	1	17.110,02
Kazım Karabekir MYO Spor Tesisi Bradaların Tamirâtı	1	11.800,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Klima Havalandırma Kanalı Yapımı	1	11.752,80
Yerleşke Binalarında Bulunan Basınçlı Kapların ve Yangın Tesisatlarının Periyodik Kontrolünün Yapılması	1	11.210,00
Jenaratör İçin Yedek Parça Alımı	6	6.372,00
Sulama Kuyusu bakım onarım yapım işi	1	5.900,00
TOPLAM	14.054	1.823.809,83

Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Dış Cephe Mantolama Bakım Onarımı	1	39.530,00
TOPLAM	1	39.530,00

Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan İşler (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yazıcı Transfer Filmi	5	4.985,50
Renkli Ribon	5	3.245,00
Yazıcı Pateni	10	1.758,20
TOPLAM	20	9.988,70

Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler (Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı)



Resim 1: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-1



Resim 2: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-2



Resim 3: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-3





Resim 4: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-4



Resim 5: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-5



Resim 6: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-6

3.3. 2021I00-162441 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi için 2021 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup yıl içerisinde ekleme yapılmamıştır. Toplam harcama ise 3.989.970,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021I00-162441 nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Makine Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	4.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	4.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	4.000.000,00
Harcama TL	3.989.970,58
Kalan Ödenek TL	10.029,42
Gerçekleşme Oranı %	99,75

Çizelge 33: 2021I00-162441 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi


Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Diş Üniti	16	1.805.309,38
Diş Hekimliği Fakültesi İçin Yedekleme Ünitesi Alımı	4	607.832,18
Sefolemetrik Röntgen Cihazı Alımı	1	336.798,00
Diş Hekimliği Fakültesi İçin Cihaz Alımı	22	309.521,52
Nemofab 3D Dijital Ortodontik Analitik Ölçüm Cihazı Programı	1	257.004,00
Anatomi Laboratuvarı, Optisyonik Laboratuvarı Ve Harita Ölçüm Mal Malzeme Alımı	134	251.375,40
Protez Malzemesi Alımı	12	68.337,50
Medikal Derin Dondurucu Alımı	1	61.182,00
Sürekli Form Kapatma ve Baskı Makinası	1	45.099,60
Röntgen Koltuğu ve Önlük	8	44.014,00
48 Port Koe Kenar Anahtar Alımı	1	34.998,80
Kumlama Makinası, Ölçü Karıştırma Cihazı ve Mikromotor	3	30.567,90
Hava Su Tabancası İle Yıkama ve Sterilizasyon Sepeti	34	30.368,48
Kablosuz Aktarıcı Cihazı, Çağrı Cihazı, Santral Sunucu	7	28.338,88
Diş Üniti Ve Santrafjüj Cihazı Alımı	2	23.480,00
Amfi Sınıf Ses Sistemi (Mikrofon + Hoparlör)	35	17.110,00
Tel Raf Sistemi	4	15.953,60
Hava Perdesi	2	12.071,40
Diş Hekimliği İçin El Yıkama Üniti	2	10.607,94
TOPLAM	290	3.989.970,58

Çizelge 34: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler



Resim 7: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-1

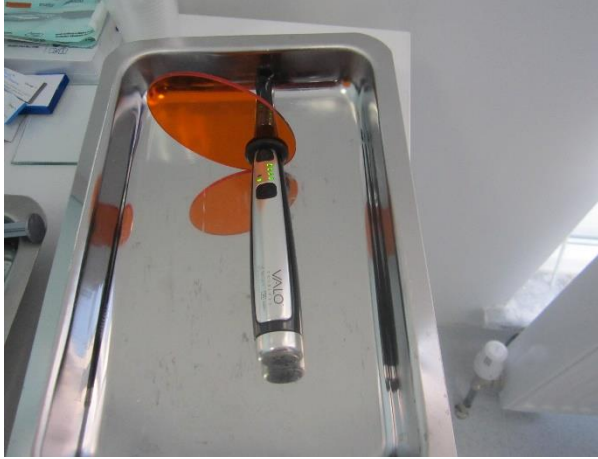

Resim 8: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-2



Resim 9: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Mal ve Malzemeler-3

3.4. 2020H03-151366 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2021 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 600.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam harcama ise 599.407,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,90 olarak gerçekleşmiştir.

2021H03-167398 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	600.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	600.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	600.000,00
Harcama TL	599.407,68
Kalan Ödenek TL	592,32
Gerçekleşme Oranı %	99,90

Çizelge 35: 2021H03-167398 Nolu Yayın Alımı Projesi

2021H03-167398 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Miktar (Adet)	Tutarı (TL)
Basılı Kitap Alımı	3.034	288.242,79
Hiperkitap Veritabanı	1	70.276,91
VETİS Veritabanı	1	64.900,00
İdealonline Veritabanı	1	35.400,00
AYEUM Veritabanı	1	33.000,00
Turcademy Elektronik Kitap Aboneliği	1	28.254,58
Piri Keşif Aracı 2021 Veritabanı	1	16.000,00
eOsmanlıca Veritabanı	1	14.160,00
Vidobu Veritabanı	1	13.275,00
Tümer ALTAŞ Veritabanı	1	11.000,00
SOBİAD Atıf Dizini	1	9.000,00
İntihal.net Yazılımı 2021 Kullanımı	1	7.500,00
AKAGEV Veritabanı	1	5.000,00
Lexpera Proplus Veritabanı Alımı	1	3.398,40
TOPLAM	3.047	599.407,68

Çizelge 36: 2021H03-167398 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **AYEUM Veritabanı**

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) , sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

- **AKAGEV Veritabanı**

Akademik Gelişim ve Eğitim Veritabanı (AKAGEV) üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanlarının ve iş dünyasının eğitim ihtiyaçlarını online ve interaktif bir ortamda sağlamak

amacıyla kurulmuş bir veri tabanıdır. Bilgisayar yazılımlarını, kişisel ve akademik gelişim eğitimlerini en az doktora derecesine sahip alan uzmanlarıyla ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

- **TURCADEMY Elektronik Veri Tabanı**

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademik ve idari personel ile öğrencilerimize kolay bir şekilde ulaştıran yerli bir e-kitap platformudur.

- **Tümer ALTAŞ Veritabanı**

Tümer Altaş veritabanında, e-YDS/YDS, PTE, IELTS ve TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla hızlı kelime öğrenme, gramer videoları, cümle çeviri videoları ve paragraf çeviri videoları gibi 10.000’e yakın indirilebilir içerik yer almaktadır.

- **Lexpera Proplus Veri Tabanı**

İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve multi-platform erişim imkânı ile LEXPERA akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yenilikçi çözümler sunmaktadır. Güncel mevzuatı, içtihatı, tam metin hukuk kitaplarını, makaleleri, kanun yorumlarını, bibliyografik bilgileri, sözleşme örneklerini ve genel internet arama sonuçlarını kapsamaktadır.

- **İdeal Online Veritabanı**

İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır. İdeal online içerisinde akademik dergiler, popüler dergiler, ideal tıp kitapları, konferans & armağanlar ve ideal ekitap olmak üzere 5 ayrı veri tabanı vardır.

İdealonline veri tabanlarının amacı; Türkçe bilgi kaynaklarını e-ortama taşımak, Türkçe bilgi kaynaklarına 7/24 erişim sağlamak, Türkçe içeriğe modern veri tabanı sistemi ve cihazlarla erişim sağlamak, Türkçe içeriği dünyanın kullanımına sunmak ve daha fazla Türkçe kaynak yayınlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır.

- **Hiperkitap Veritabanı**

Hukuk'tan Sağlık Bilimlerine, Ekonomiden Dil ve Edebiyata, Mimarlıktan Mühendislik, Bilgisayar, Tasarım, Teknik Bilimlere 28 temel konu başlığında 17.000 den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlayan Türkçe içerikli bir elektronik kitap veritabanıdır.

- **Piri Keşif Aracı 2021 Veritabanı**

Arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır. Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için araştırılan konu hakkında birçok veri tabanını tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. Yapay zekâ destekli modern arama algoritmaları ile ilgili içerikleri bulmayı amaçlar.

- **VETİS Veritabanı**

Ulusal veya uluslararası elektronik veritabanlarına, kampüs dışından, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayan bir araçtır.

- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atfın bulunduğu bir veritabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir.

- **Video Eğitim Platformu (VİDOBU) Veri Tabanı**

Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri ve Hobi Eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri Türkçe içerikler ile sağlayan çevrimiçi video eğitim platformudur. 12.000'den fazla eğitim videosuna sahip olan platform, Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine yönelik akademik destek sağlayacağı hedeflenmektedir.

- **E-Osmanlıca Online Eğitim Veri Tabanı**

E-Osmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "şıklı ve gördüğünü yaz" tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. E-Osmanlıca dersleri öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak, onları sınıftaki eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlamaktadır.

3.5. 2020H03-151368 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2021 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.501.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 2.900.000,00 TL finansman fazlasından, 750.000,00 TL hibe olmak üzere toplamda 3.650.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam bütçe içi ödenek 4.401.000,00 TL olup toplam harcama 2.830.298,45 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 65,81 olarak gerçekleşmiştir. 2020H03-151368 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı, Engelsiz Üniversite
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	8.510.205,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.501.000,00
Eklenen TL ³	3.650.000,00
Toplam Ödenek TL	5.151.000,00 (750.000,00 TL hibe)
Harcama TL	2.830.298,45
Kalan Ödenek TL	1.528.201,77
Gerçekleşme Oranı (%)	65,81

Çizelge 37: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

³ 2.900.000,00 TL finansman fazlasından olup, 750.000,00 TL hibe olarak eklenmiştir. Tıp Fakültesi ile Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin bulunduğu bölgede taşıt ve yaya trafiğinin güvenli kontrolünü sağlamak amacıyla giriş kapısı yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 750.000,00 TL tutarındaki Şifa Giriş Kapısı yapılan protokol gereğince bağışçı tarafından yapılacaktır.

2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
25 Ton Çimento Alımı	11.800,00
2 Kat Antipaslı Profil (480 Metre)	18.691,20
Güvenlik Kulübesi	21.240,00
İnşaat Malzemesi	560.665,20
Güney Giriş Kapısı Kaldırım Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşİ	1.276.948,85
Peyzaj Malzemesi Alımı	25.187,10
İş Makinası Kiralanması	35.624,20
İnşaat Malzemesi (16.750 m ² beton parke taşı)	336.005,00
Camii Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	486.636,68
Kabartma Harita (Engelsiz)	7.080,00
Mal ve Malzeme Alımı (Engelsiz)	50.420,22
TOPLAM	2.830.298,45

Çizelge 38: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

3.5.1. KMÜ Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşi

Toplam uzunluğu 1.120 m. genişliği 32 m. olan yol 2019 yılı itibarıyla ihale edilmiş olup 2020 yılında tamamlanmıştır. Bölünmüş yol olarak yapılan işte 2 gidiş + 2 dönüş yolu ve ortasında 5 m. orta kaldırım bulunmaktadır. Aynı zamanda yapılan yol üzerinde hem gidiş hem de dönüş istikametinde 3 m. bisiklet yolu bulunmaktadır. Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güneş Enerjisi Santrali ve yapımı planlanan diğer binalarımıza ulaşım imkânı sağlamaktadır. Söz konusu yolun aydınlatma işi için KMÜ Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşi ihalesi yapılmıştır. Sözleşme tutarı 1.000,000,00 (KDV hariç) TL'dir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Kentöz Hafriyat Nakliyat Makina Taahhüt Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Kmü Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşi
Proje Numarası	2020H03-151368
İhale Tarihi	12.04.2021
Sözleşme Tarihi	17.05.2021
Sözleşme Bedeli TL	1.000.000,00 TL + KDV
Projeye İlgili Revizyonlar	04.08.2021 Tarihinde 30 Günlük Süre Uzatımı, 04.08.2021 Tarihinde 85.463,14 TL İş Artışı
Revizyon Nedenleri	Yapım işlerinin yetiştirilememesinden dolayı süre uzatılmıştır. Güvenlik kulübesi, kompozit ızgara, ferforje ve alüminyum merdiven korkuluğu yapılması ile beton parke taşları ile döşeme yapılması sebebiyle iş artışına gidilmiştir.
Yer Teslim Tarihi	20.05.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	20.05.2021
İşin Bitim Tarihi	16.09.2021
2021 Yılı Harcama Tutarı	1.276.948,85
Toplam Harcama Tutarı	1.276.948,85
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatin Durumu	Geçici Kabul Yapıldı

Çizelge 39: KMÜ Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşi



Resim 10: Kmü Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşi



Resim 11: Kmü Güney Giriş Kapısı, Kaldırım, Refüj ve Yol Aydınlatma Yapım İşi

3.5.2. KMÜ Camii Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012 yılında imzalanan protokol ile Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde cami yapımına başlanmıştır.

Toplam 5.000 m² kapalı alanda 6.000 kişinin ibadet edebileceği Üniversite cami Osmanlı Selatin Camileri mimarisi örneğinde yapılmıştır.

Üniversitemiz tarafından 2021 yılı Eylül ayında Cami Çevre Düzenleme İhalesi yapılmış 2022 Haziran ayı sonunda çevre düzenleme çalışmalarını da tamamlanacaktır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 1.385.000,00 (KDV hariç) TL'dir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Kentöz Hafriyat Nakliyat Makina Taahhüt Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Kmü Camii Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2020H03-151368
İhale Tarihi	21.09.2021
Sözleşme Tarihi	15.10.2021
Sözleşme Bedeli TL	1.385.000,00 TL + KDV
Projeye İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	20.10.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	20.10.2021
İşin Bitim Tarihi	26.06.2022
2021 Yılı Harcama Tutarı	486.636,68
Toplam Harcama Tutarı	486.636,68
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	35
İnşaatin Durumu	Devam ediyor.

Çizelge 40: Camii Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

3.5.3. Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşi

2019 yılında geçici kabulü yapılan Eğitim Fakültesi binamızın ihtiyacı olan otopark ve peyzaj çalışmaları için Üniversitemiz teknik personeli tarafından 2020 yılı içerisinde uygulama projesi hazırlanmıştır. Uygulama projesi sürekli işçilerimiz tarafından 2021 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Otopark 50 araç kapasiteli olup 1.912 m² alan üzerine inşa edilmiştir. Peyzaj alanı ise 3.600 m² olup peyzaj bitki türleri dikim işlemi yapılmıştır. Ayrıca bitkilerin su ihtiyacı otomatik kontrol vanaları ile toprak yapısına ve özelliğine uygun olarak karşılanmaktadır.



Resim 12: Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşi



Resim 13: Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşi

3.5.4. Tıp Fakóltesi Çevre Düzenlemesi İŖi

2019 yılında geçici kabulü yapılan eğitim binamızın çevre düzenleme işleri için projelendirme çalışmaları 2020 yılı içerisinde yapılmış olup ön cephe bordür ve parke işleri ile binanın arka cephesinde bulunan otopark kısmı 2021 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Projelendirme ve uygulama Üniversitemiz teknik personeli ve sürekli işçilerimizin çalışmaları sonucu yapılmıştır. Ağaçlandırma işlerinin 2022 yılı içerisinde hayırsever tarafından yapılması planlanmaktadır.



Resim 14: Tıp Fakóltesi Çevre Düzenlemesi İŖi

3.5.5. Şifa Giriş Kapısı

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji binasına halkımızın ulaşım olanaklarını kolaylaştırmak adına Yunus Emre Yerleşkemizin Güney tarafına yapılması planlanan giriş kapısı için Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı ile protokol imzalanmış olup 750.000,00 TL tutarındaki şifa giriş kapısı bağışçı tarafından yapılacaktır.



Resim 15: Şifa Giriş Kapısı

3.5.6. Engelsiz Üniversite

Başkanlığımız bütün yerleşke alanlarında engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlamakta ve mevzuata uygun olarak uygulamaktadır. 57.500,22 TL harcama yapılmıştır.



Resim 16: Engelsiz Üniversite

3.6. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2021 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.000,00 TL olup yıl içerisinde herhangi bir ödenek revizesi olmamıştır. Ermenek MYO Uygulama Oteli için izin çıkmamasından dolayı bu proje kapsamında harcama yapılamamıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Uygulama Oteli (4.821 m ²)
Alt Projeler	Ermenek MYO Uygulama Oteli
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı TL	10.606.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	1.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek	1.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0,00

Çizelge 41: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

3.6.1. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli

2018 yılı yatırım programına alınan ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren rekreasyon bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. Yatırım programında olmasına karşın Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.

3.7. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2021 yılı bütçemize ayrılan ödenek 2.000,00 TL olup yıl içerisinde herhangi bir ödenek revizyonu yapılmamıştır.. 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)
Alt Projeler	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı TL	22.750.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	2.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek	2.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0

Çizelge 42: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu

2016 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak yatırım izni verilmeyen projemiz ihaleye çıkma aşamasındadır. İzin ile birlikte projemiz ihale edilecektir. Projemiz 500 kişilik seyirci oturma kapasitesine sahiptir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren rekreasyon bölümü programı öğrencileri başta olmak üzere Ermenek yerleşkesindeki bütün öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.

3.7.1. 5.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum

2016 yılında mimari proje çalışmalarına başlanan projemiz 2018 yılında ihale edilmiş ancak yaklaşık maliyetin çok üzerinde bir teklif verilmesi üzerine ihale iptal edilmiştir. 2019 - 2021 yıllarında spor sektörü harcamalarına izin verilmediğinden projenin ihalesine çıkılamamıştır. 2022 yatırım programında stadyum projesine yer verilmemiş olup proje sonlandırılmıştır.

4. Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı 12 Kasım 2018 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Stratejik Planımızda dört amaç ve bu amaçlarla ilişkili 18 hedef belirlenmiştir. Üniversitemiz, ortak akılla hazırlanan Stratejik Planımız ile farklılaşma alanları olarak belirlenen Türk dili, gıda-tarım ve temiz enerji alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik belirlenen hedeflerinin yanı sıra, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması, kurumsallaşma ve kalitenin artırılması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile bilgiye erişim imkânları ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik belirlenen amaç ve hedeflerini de gerçekleştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz stratejik planı ile yatırım programı ilişkisi kurularak aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler
A-1	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H05-1269	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi),	0,00	Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir
				2010H05-1269	Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)	0,00	Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir
		Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H03-1057	Uygulama Oteli (4.821 m ²)	0,00	Proje hazırlık aşamaları devam ediyor.
		Sağlık	Muhtelif İşler	2021I00-162441	Makine-Teçhizat	3.989.970,58	Dış üniteleri, ağız ve diş eğitim malzemeleri ile çeşitli sağlık ekipmanlarının alımı gerçekleştirilmiştir
		Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	2020H03-151368	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2.830.298,45	Güney Giriş Kapısı Kaldırım Refüj ve Yol Aydınlatma işinin geçici kabulü yapılmış, Camii Çevre Düzenlemesi işinin ihalesi yapılmıştır. Çevre düzenlemeleri alınan mal ve malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından yapılmıştır.

Stratejik Amaçlar		Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler
				Muhtelif İşler	2021H03-167400	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	15.981.178,89	Büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.
A-2	Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.	Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı	2021H03-167398	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	599.407,68	Abone veri tabanları, e-kitaplar ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir.
A-4	Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.	Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2021H03-167396	Etüt-Proje	10.207,00	Cins değişikliği kapsamında yerleşkelerin aplikasyon ve aplikasyon projeleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

5. Proje Bazında Harcamalar

Proje No	Proje Adı	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	2021 Yılı Ödeneği					
				Program		Revize		Harcama	
				Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.					15.057.000	0	26.707.000	0	23.411.063
EĞİTİM					11.057.000	0	22.707.000	0	19.421.092
Beden Eğitimi Ve Spor					2.000	0	2.000	0	0
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)	2010-2023	0	2.000	0	2.000	-	-
2010H05-1269-15497	Spor Salonu	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)	2016-2023	0	1.000	0	1.000	-	-
2010H05-1269-41168	Stadyum	Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)	2016-2023	0	1.000	0	1.000	-	-
Yükseköğretim					11.055.000	0	22.705.000	0	19.421.092
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	Uygulama Oteli (4.821 m²)	2009-2023	0	1.000	0	1.000	-	-
2009H03-1057-68203	Ermenek MYO Uygulama Oteli	Uygulama Oteli (4.821 m²)	2018-2023	0	1.000	0	1.000	-	-
2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	0	1.501.000	0	5.151.000	-	2.830.298
2020H03-151368-151369	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	0	1.501.000	0	5.151.000	-	2.830.298
2021H03-167396	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2021-2021	0	200.000	0	200.000	-	10.207
2021H03-167396-167397	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2021-2021	0	200.000	0	200.000	-	10.207
2021H03-167398	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	0	600.000	0	600.000	-	599.408
2021H03-167398-167399	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	0	600.000	0	600.000	-	599.408
2021H03-167400	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	0	8.753.000	0	16.753.000	-	15.981.179
2021H03-167400-167401	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	0	8.753.000	0	16.753.000	-	15.981.179
SAĞLIK					4.000.000	0	4.000.000	0	3.989.971
Sağlık					4.000.000	0	4.000.000	0	3.989.971
2021I00-162441	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	2021-2021	0	4.000.000	0	4.000.000	-	3.989.971
2021I00-162441-162442	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	2021-2021	0	4.000.000	0	4.000.000	-	3.989.971

5. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, E-bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) programları arasında düzenleme yapılmalıdır.
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
5. Proje ve ihale süreçlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.
6. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.
