



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

**2022
YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU**

KARAMAN



Milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
ÇİZELGELER.....	iii
1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	v
2. GENEL DEĞERLENDİRME	7
2.1. Uz görüşümüz	7
2.2. Özgörevimiz	7
2.3. Temel Değerlerimiz.....	7
2.4. Temel Amaç ve Hedefler	8
2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları	11
2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi.....	12
2.7. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	16
2.7.1. Hedeflenen.....	16
2.7.2. Gerçekleşen	17
2.7.3. Devam Edenler	17
2.8. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları	18
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	18
2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri	27
2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	31
3. Proje Uygulamaları.....	32
3.1. 2022H03-187479 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	32
3.2. 2022H03-187475 Muhtelif İşler Projesi	33
3.3. 2022I00-178965 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi	51
3.4. 2022H03-187477 Yayın Alımı Projesi	54
3.5. 2020H03-151368 Kampüs Altyapısı Projesi.....	58
3.5.1. KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	60
3.5.2. KMÜ Cami Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	61
3.5.3. Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenleme Yapım İşİ	64
3.5.4. Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşİ	64
3.5.5. Ermenek Meslek Yüksekokulu ve Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi İşleri	66
3.5.6. Uygulama Oteli Çevre Düzenleme İşleri	67
3.5.7. Engelsiz Üniversite	67
3.6. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	68
3.6.1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası.....	68
3.6.2. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli	71

3.7. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	72
3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu.....	72
4. Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi	73
5. Proje Bazında Harcamalar	75
6. Öneriler.....	76

ÇİZELGELER

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar	8
Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri	8
Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler	9
Çizelge 4: Farklılaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler	9
Çizelge 5: Kurumsallaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler	10
Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları.....	11
Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m ²).....	12
Çizelge 8: Taşınmazların Genel Dağılımı (m ²)	13
Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı.....	14
Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)	16
Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı.....	18
Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey).....	21
Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	22
Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	23
Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....	24
Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)	25
Çizelge 17: Geyrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	26
Çizelge 18: Revizyon (2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)	27
Çizelge 19: Revizyon (2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler).....	27
Çizelge 20: Revizyon (2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı).....	28
Çizelge 21: Revizyon (2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı).....	28
Çizelge 22: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)	29
Çizelge 23: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	29
Çizelge 24: Revizyon (2022I00-178965 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler).....	30
Çizelge 25: 2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	32
Çizelge 26: 2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamalarının Detayı.....	32
Çizelge 27: 2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	33

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....	34
Çizelge 29: Fizyolojik ve Biyofizik Sinyal Ölçüm ve Analiz Sistemi İhale Bilgileri.....	40
Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM)..	42
Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....	43
Çizelge 32: Yunus Emre Yerleşkesi Eğitim ve Hizmet Binaları Bakım Onarım Yapım İş İhale Bilgileri.....	50
Çizelge 33: 2022I00-178965 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi.....	52
Çizelge 34: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler.....	53
Çizelge 35: 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi	54
Çizelge 36: 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı.....	55
Çizelge 37: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	59
Çizelge 38: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı.....	59
Çizelge 39: Spor Bilimleri Fakültesi Çevresi Çevre Düzenleme İş Yapım İş İhale Bilgileri	60
Çizelge 40: Cami Çevre Düzenlemesi Yapım İş İhale Bilgileri.....	62
Çizelge 41: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi	74
Çizelge 42: Proje Bazında Harcamalar	75

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



2022 yılı Yatırım Programı kapsamında, eğitim-öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikalar önceliklendirilmiştir. Buna yönelik olarak gerekli ödenekler Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları başta olmak üzere makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları ile öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha estetik ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

2022 yılı içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi çevresi, cami çevresi çevre düzenleme işleri yapılmıştır. Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu çevresi, Tıp Fakültesi çevresi, Ermenek Meslek Yüksekokulu ve Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çevresi, uygulama oteli çevresi çevre düzenleme işleri yıl içerisinde yapılan ihaleler sonucu alınan malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından yapılmıştır. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlanarak mevzuata uygun olarak uygulanmaktadır.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ilkesi ile 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet GAVGALI
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Uzgörüřümüz

İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiřtiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliştirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.

2.2. Özgörevimiz

Üniversitemiz arařtırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine baėlı ve evrensel değerlerle donatılmıř görev ve sorumluluėunun bilincinde erdemli bir neslin yetiřtirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiřtir.

2.3. Temel Deėerlerimiz

- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Etik deėerlere baėlılık
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Öğrenci merkezlik
- ✓ Kent, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
- ✓ Türk dilinin doğru kullanılması ve yaygınlařtırılmasına karřı duyarlılık

2.4. Temel Amaç ve Hedefler

EKSENLER	AMAÇLAR
EĞİTİM EKSENİ	Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ	Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
FARKLILAŞMA EKSENİ	Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
KURUMSALLAŞMA EKSENİ	Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.
	Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.
	Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.
	Teoriye uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri

AMAÇ 2	HEDEFLER
<p>Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.</p>	<p>Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.</p>
	<p>Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.</p>
	<p>Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.</p>

Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 3	HEDEFLER
<p>Türk dili, gıda, tarım ve temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.</p>	<p>Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.</p>
	<p>Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.</p>
	<p>Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.</p>
	<p>Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.</p>
	<p>TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üretmek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.</p>

Çizelge 4: Farklılaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 4	HEDEFLER
<p>Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.</p>	<p>Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.</p>
	<p>Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.</p>
	<p>Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.</p>
	<p>Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.</p>
	<p>Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.</p>

Çizelge 5: Kurumsallaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 23.002.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 49.743.920,00 TL olmuştur. Projelerin sektörlere göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2022 Yılı Program Ödeneği	2022 Yılı Revizeli Ödenek	2022 Yılı Harcam a
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	161.000.000,00	0,00	12.002.000,00	22.002.000,00	0,00
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	10.829.905,00	7.759.205,00	1.500.000,00	3.070.700,00	2.981.874,79
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	7.750.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	86.000,00	0,00	400.000,00	86.000,00	85.550,00
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler	16.069.220,00	0,00	4.398.000,00	16.069.220,00	16.033.107,86
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	655.351,46
Sağlık-Sağlık	Muhtelif İşler Projesi	7.814.000,00	0,00	4.000.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00
TOPLAM		204.249.125,00	7.759.205,00	23.002.000,00	49.743.920,00	27.569.884,11


Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 95,54'ü Yunus Emre Yerleşkesi, % 3,04'ü Ermenek Yerleşkesi ve % 1,42'si da Kazım Karabekir Yerleşkesinde yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Taşınmaz Maliki	Alan
Yunus Emre Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	1.607.650,89
Ermenek Yerleşkesi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	51.581,75
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	23.938,98
Genel Toplam		1.683.171,62

Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m²)

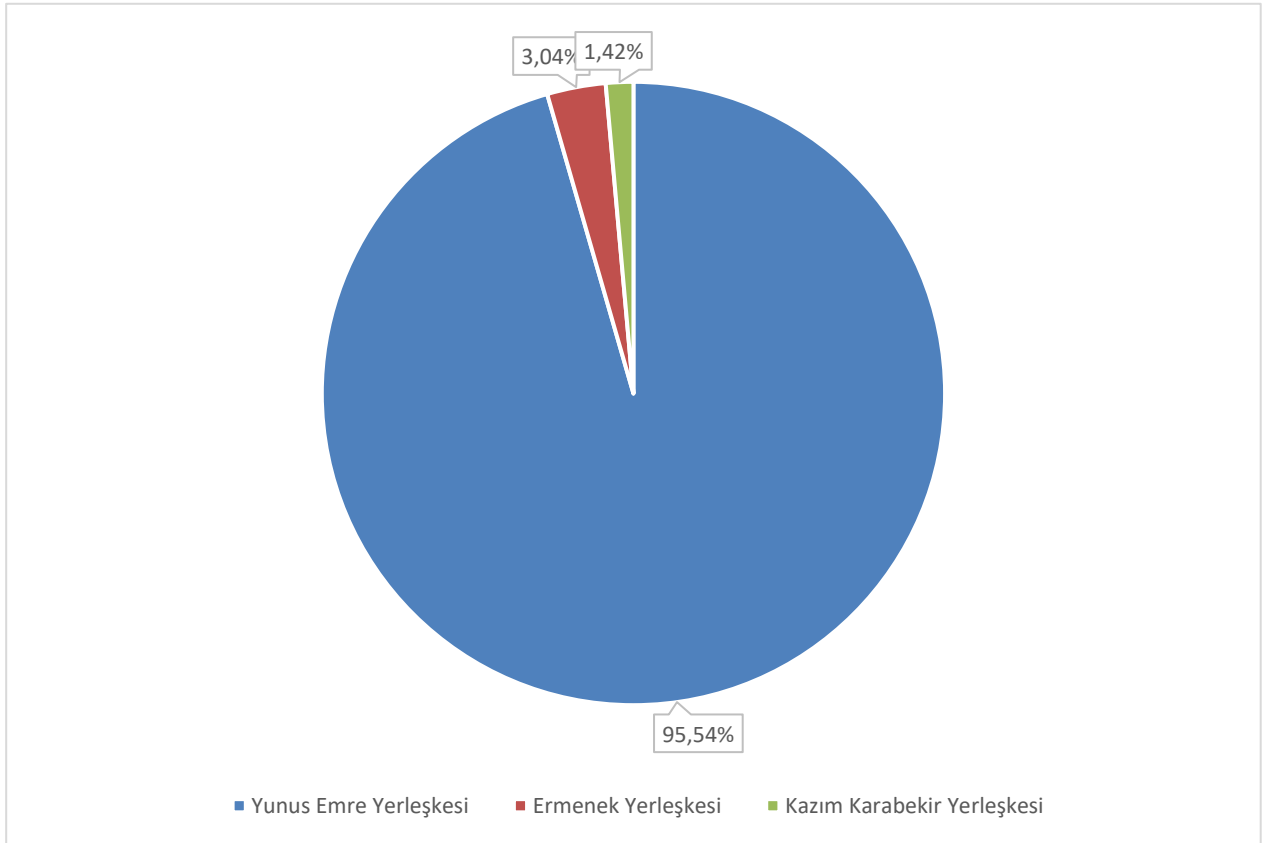

Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı


İLÇESİ	MAHALLE	ADA	PARSEL	YÜZÖLÇÜM (m ²)	CİNSİ	HİSSE	MÜLKİYET
MERKEZ	HAMİDİYE	361	27	49.438,06	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	HAMİDİYE	361	28	29.204,52	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	HAMİDİYE	361	33	30.076,57	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	KIRBAĞI	3911	30	1.607.650,89	Beş Katlı Betonarme Eğitim Fakültesi ve Beş Katlı Betonarme Sağlık Bilimleri Fakültesi Ve Beş Katlı Betonarme Diş Hekimliği Fakültesi Ve Meslek Yüksek Okulu Ve Arsası	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	YENİŞEHİR	5168	2	1.375,18	ARSA	TAM	KMÜ
MERKEZ	YENİŞEHİR	5169	1	4.117,15	ARSA	TAM	KMÜ
ERMENEK	SEYRAN	112	33	51.581,75	Bir Adet 4, Bir Adet 5 Katlı Yüksek Okul Binası, Bir Adet 5, Bir Adet 6 Katlı Öğrenci Yurdu Binası, Bir Adet 4 Katlı İlköğretim Okulu Binası, 4 Katlı Betonarme Atölye Binası ve Arsası	TAM	KMÜ
KAZIM KARABEKİR	EMSAL HAYAT	970	4	23.938,98	Beş Katlı Betonarme Okul, Üniversite Araştırma Binası Ve İki Katlı Karma Çok Amaçlı Salon Ve Arsası	TAM	MALİYE HAZİNESİ
KAZIM KARABEKİR	BOYACI	892	2	494,57	ARSA	HİSSE Lİ	KMÜ (31500/624018) KAZIMKARABEKİR BELEDİYESİ (592518/624018)
KAZIM KARABEKİR	SELÇUKLU	286	1	35.827,00	ARSA	HİSSE Lİ	KMÜ (23826/35827) Maliye Hazinesi (12001/358)
ERMENEK	SEYRAN	1059	1	6.754,29	ARSA	TAM	KMÜ

Çizelge 8: Taşınmazların Genel Dağılımı (m²)

Üniversitemizin kapalı mekânların hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
Yönetim	19.152	0	0	19.152
Eğitim	129.245	7.000	11.845	148.090
Sosyal	16.736	1.158	0	17.894
Spor	12.582	0	150	12.732
Barınma	473	0	0	473
Diğer	2.055	0	0	2.055
Genel Toplam	180.243	8.158	11.995	200.396

Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı

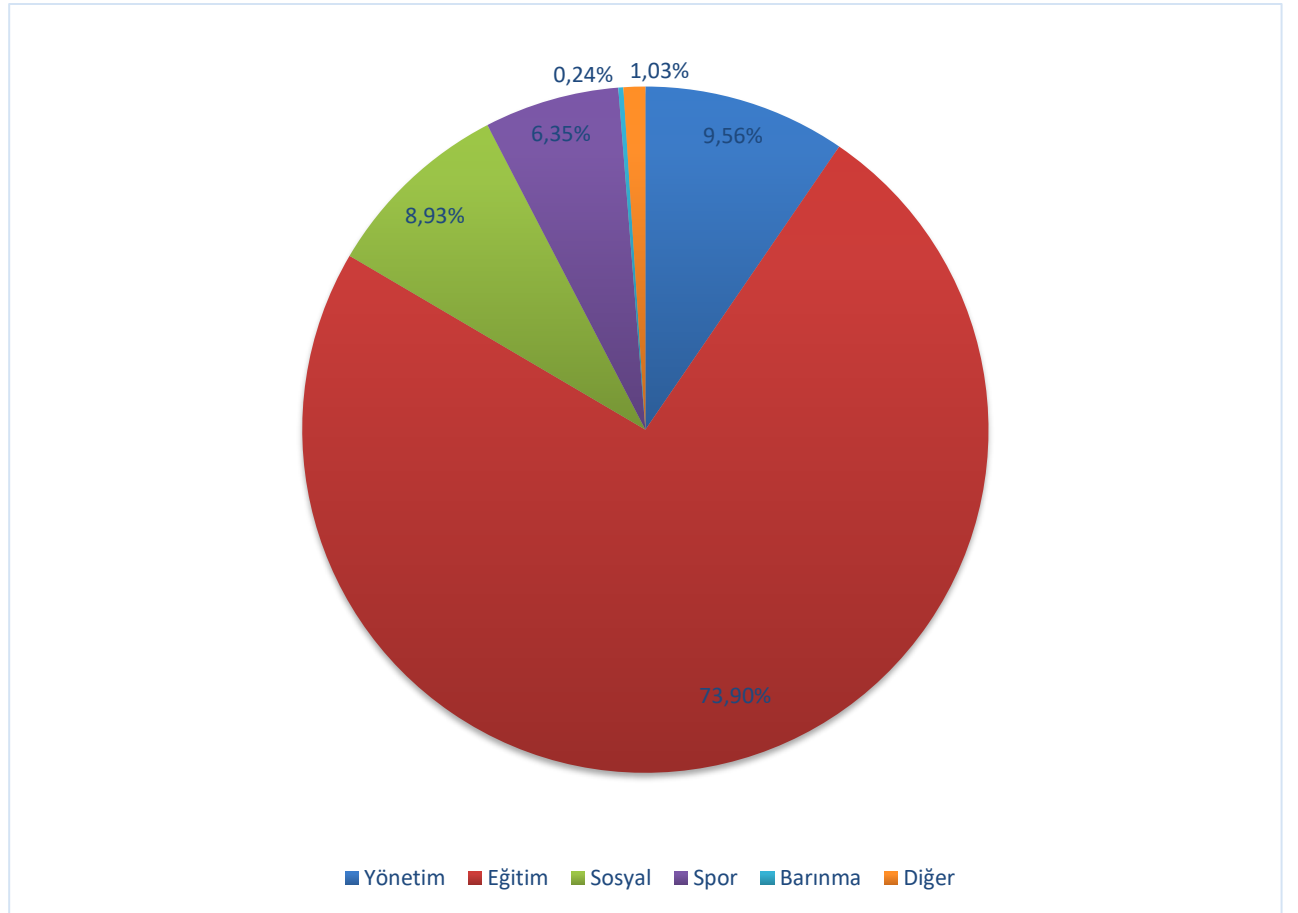

Grafik 2: Kapalı Alanların Hizmet Alanları İtibarıyla Dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı ve kapalı mekanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Yerleşke	Bina Adı	Birimi	Kapalı Alan	Fonksiyonu
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Meslek Yüksekokulu	Meslek Yüksekokulu	4.325	Eğitim(E)
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Meslek Yüksekokulu Atölye	Meslek Yüksekokulu	1.638	Eğitim(E)
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Spor Salonu	Meslek Yüksekokulu	150	Spor(S)
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Uysal Hasan Kalan Meslek Yüksekokulu	Meslek Yüksekokulu	5.882	Eğitim(E)
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	Meslek Yüksekokulu	7.000	Eğitim(E)
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Çok Amaçlı Salon	Konferans Salonu	1.158	Toplantı ve Konferans (C)
Yunus Emre Yerleşkesi	Misafirhane	İdari Bina	1.130	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	13.700	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	Fen Fakültesi	4.635	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Sosyal Bilimler MYO/Uygulamalı Bilimler MYO	Sosyal Bilimler MYO/Uygulamalı Bilimler MYO	6.640	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Bilgi İşlem / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanlıkları	3.652	Yönetim(M)
Yunus Emre Yerleşkesi	Rektörlük Binası	Rektörlük	5.000	Yönetim(M)
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.600	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Mühendislik Fakültesi	Mühendislik Fakültesi	20.435	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.170	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A Blok	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	3.798	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu B Blok	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	3.367	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	KMÜ Çarşı	Yemekhane	13.000	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	7.500	Spor Alanları(S)
Yunus Emre Yerleşkesi	Isı Merkezi	Isı Merkezi	2.055	Diğer(O)
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3.615	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Rektörlük Konutu	Rektörlük	473	Barınma(A)

Yerleşke	Bina Adı	Birimi	Kapalı Alan	Fonksiyonu
Yunus Emre Yerleşkesi	Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu	Edebiyat Fakültesi	17.420	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzları	5.082	Spor Alanları(S)
Yunus Emre Yerleşkesi	Amfi Tiyatro	Amfi Tiyatro	533	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	Amfi Tiyatro Depolar	Amfi Tiyatro	2.073	Sosyal Alanlar(G)
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	9.270	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	İslami İlimler Fakültesi	İslami İlimler Fakültesi	8.350	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Eğitim Fakültesi	Eğitim Fakültesi	8.480	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Kütüphane	Kütüphane	10.500	Yönetim(M)
Yunus Emre Yerleşkesi	Tıp Fakültesi	Tıp Fakültesi	10.765	Eğitim(E)
Yunus Emre Yerleşkesi	Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi	Ahmet Keleşoğlu Diş hekimliği Fakültesi	12.000	Eğitim(E)
GENEL TOPLAM			200.396	

Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

2.7. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.7.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programı'nda eğitim sektöründe altı, sağlık sektöründe ise bir adet proje yer almaktadır. Öncelikle 2019-2023 stratejik planı doğrultusunda Tıp Fakültesi, Ahmet KELEŞOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan makine teçhizatın alınması ile çevre düzenlemesi hedeflenmiştir. Ayrıca Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması da hedeflenmiştir.

2022 yılında yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2. Gerçekleşen

2022 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

✓ Spor Bilimleri Fakültesi çevresi, cami çevre düzenleme işleri,
✓ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu çevresi, Tıp Fakültesi çevresi, Ermenek Meslek Yüksekokulu ve Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çevresi, uygulama oteli çevresi çevre düzenleme işleri, (Yıl içerisinde yapılan ihaleler sonucu alınan malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından.)

✓ Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlanarak mevzuata uygun olarak uygulanması işi,

✓ Mimari proje ve haritacılık hizmeti alımları,
✓ Sağlık alanındaki birimler başta olmak üzere Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar.)

✓ Araç takip sistemi yazılımı güncellenmiş, Windows 10 işletim sistemleri, öğrenci otomasyonu, sürekli işçi takip programı, antivirüs programı, Plaxis 3D Worksuite Akademik Lisans programı gibi gerekli yazılım alımları,

✓ 2022 yılı içerisinde elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar.

2.7.3. Devam Edenler

Üniversitemizde 2022 yılı itibariyle devam eden projeler kapsamında 2010H05-1269 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi içinde yer alan Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu yapım işi, 2009H03-1057 numaralı Derslikler ve Merkezi Birimler projesi içinde yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli yapım işi olmak üzere toplam üç adet proje mevcuttur. Bu projelerden Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu ile Uygulama Oteli için çeşitli nedenlerden dolayı 2022 yılı için herhangi bir ödenek tahsis edilmemiş olup bu projeler iz ödenek bedeli ile takip edilmektedir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 2023 yılı içerisinde tekrar ihaleye çıkılacaktır. Bu projelere ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

✓ 2018 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak son dört yıldır yatırım için izin verilmeyen Ermenek 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu işinin izin ve gerekli kaynak tahsisinin sağlanması halinde 2023 yılında yapılması öngörülmektedir.

✓ 2018 yılı yatırım programına alınan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. İlgili projeye yatırım izni verilmemekle birlikte Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.

✓ Tıp Fakültesi morfoloji binası yapım işi için 05.12.2022 yılında ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir.


2.8. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 23.002.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 49.743.920,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 27.569.884,11 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 55,42'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir

Bütçe Tertibi	KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.01	7.500.000,00	13.814.000,00	0,00	21.314.000,00	21.263.484,05
06.03	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	397.336,48
06.05	13.903.500,00	11.570.700,00	314.000,00	25.160.200,00	3.067.424,79
06.06	200.000,00	1.104.590,00	0,00	1.304.590,00	1.280.586,32
06.07	1.000.500,00	566.630,00	0,00	1.567.130,00	1.561.052,47
Toplam	23.002.000,00	27.055.920,00	314.000,00	49.743.920,00	27.569.884,11

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı

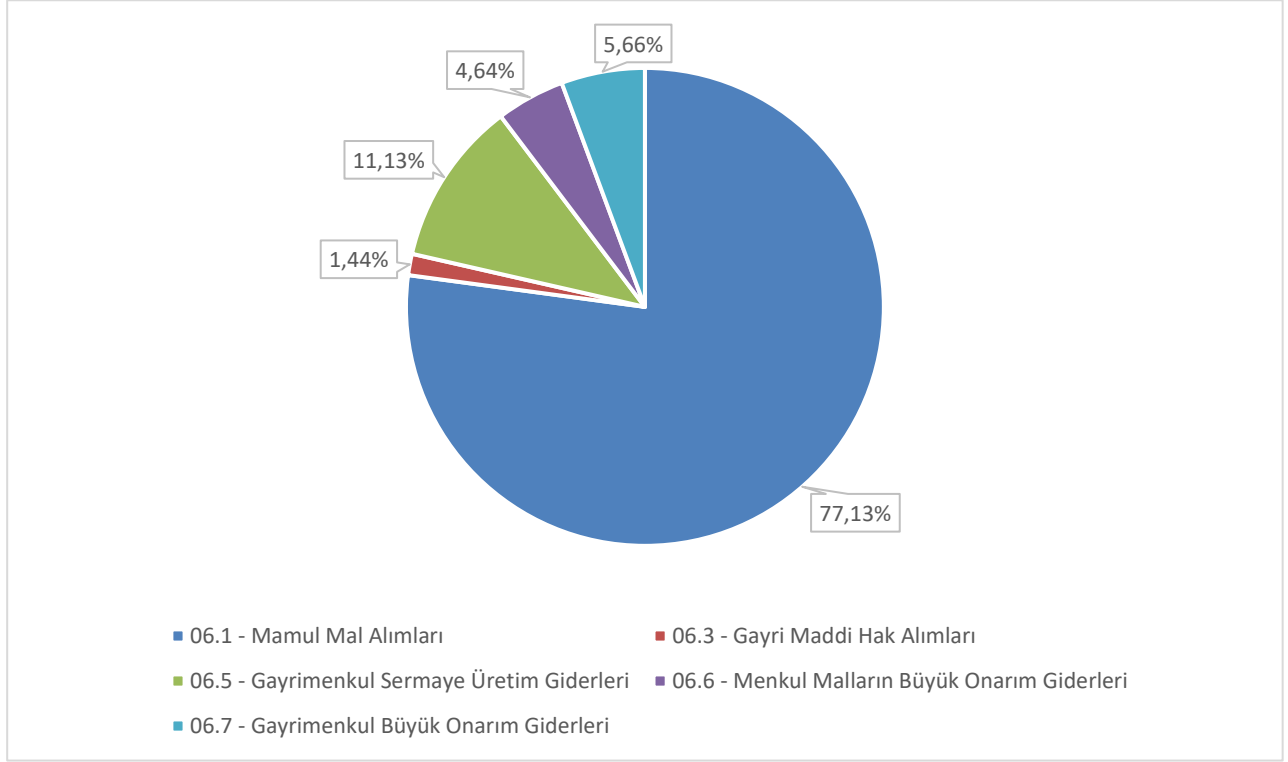

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Sermaye giderlerine ilişkin 2022 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
06	01	10	01	Büro Mefruşatı Alımları	1.078.381,20
06	01	10	05	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	2.494,80
06	01	10	90	Diğer Mefruşat Alımları	20.995,20
06	01	10		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.101.871,20
06	01	20	02	Bilgisayar Alımları	1.106.115,27
06	01	20	03	Tıbbi Cihaz Alımları	1.344.625,15
06	01	20	04	Laboratuvar Cihazı Alımları	14.230.024,66
06	01	20	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.276.049,85
06	01	20		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	18.956.814,93
06	01	30	03	Tıbbi Gereçler Alımı	538.670,00
06	01	30	04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	10.776,46
06	01	30		Avadanlık Alımları	549.446,46

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
06	01	60	01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	71.985,41
06	01	60	03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	561.345,05
06	01	60	90	Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	22.021,00
06	01	60		Yayın Alımları ve Yapımları	655.351,46
06	01			Mamul Mal Alımları	21.263.484,05
06	03	10	01	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	379.214,94
06	03	10		Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri	379.214,94
06	03	30	01	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	7.355,03
06	03	30		Lisans Alımları	7.355,03
06	03	90	01	Diğer Fikri Hak Alımları	10.766,51
06	03	90		Diğer Fikri Hak Alımları	10.766,51
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	397.336,48
06	05	10	01	Proje Giderleri	75.520,00
06	05	10	90	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	31.152,00
06	05	10		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	106.672,00
06	05	60	03	İş Makinası Kiralama Giderleri	82.889,10
06	05	60		Kira Giderleri	82.889,10
06	05	70	07	Karayolu Yapım Giderleri	29.308,57
06	05	70	90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	155.583,93
06	05	70		Müteahhitlik Giderleri	184.892,50
06	05	90	01	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.692.971,19
06	05	90		Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.692.971,19
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.067.424,79
06	06	20	01	Malzeme Giderleri	408.599,99
06	06	20		Malzeme Giderleri	408.599,99
06	06	40	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.103,50
06	06	40		Enerji Giderleri	5.103,50
06	06	90	01	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	866.882,83
06	06	90		Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	866.882,83

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.280.586,32
06	07	10	01	Proje Giderleri	3.577,97
06	07	10		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.577,97
06	07	20	03	Sıhhi Tesisat Giderleri	12.195,30
06	07	20		Malzeme Giderleri	12.195,30
06	07	70	01	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	1.038.400,00
06	07	70	90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	152.879,20
06	07	70		Müteahhitlik Giderleri	1.191.279,20
06	07	90	01	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	354.000,00
06	07	90		Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	354.000,00
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.561.052,47
06				Sermaye Giderleri	27.569.884,11

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

06.01 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 7.500.000,00 TL olan 06.01 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 13.814.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 21.314.000,00 TL olmuştur. 2022H03-187475 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 12.794.132,59 TL, 2022I00-178965 nolu Muhtelif İşler-Sağlık Projesi kapsamında 7.814.000,00 TL ve 2022H03-187477 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında 655.351,46 TL harcama yapılmıştır. Bu üç projenin toplam harcaması 21.263.484,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 99,76'dır. 06.01 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.01.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	1.078.381,20
06.01.10.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	2022H03-187475	Muhtelif İşler	2.494,80
06.01.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	20.995,20
06.01.10	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları				1.101.871,20

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.01.20.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	301.980,17
06.01.20.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	804.135,10
06.01.20.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	2022I00-178965	Muhtelif İşler Sağlık	81.220,00
06.01.20.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	1.263.405,15
06.01.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	2022I00-178965	Muhtelif İşler Sağlık	7.136.828,12
06.01.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	7.093.196,54
06.01.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	2022I00-178965	Muhtelif İşler Sağlık	293.971,71
06.01.20.90	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	1.982.078,14
06.01.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları				18.956.814,93
06.01.30.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Gereçler Alımı	2022H03-187475	Muhtelif İşler	538.670,00
06.01.30.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	2022H03-187475	Muhtelif İşler	10.776,46
06.01.30	Avadanlık Alımları				549.446,46
06.01.60.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	2022H03-187477	Yayın Alımı	71.985,41
06.01.60.03	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	2022H03-187477	Yayın Alımı	561.345,05
06.01.60.90	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	2022H03-187477	Yayın Alımı	22.021,00
06.01.60	Yayın Alımları ve Yapımları				655.351,46
06.01	Mamul Mal Alımları				21.263.484,05

Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 398.000,00 TL olan 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde ödenek eklenmemiştir. 2022H03-187475 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 397.336,48 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 99,76'dır. 06.03 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.03.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	2022H03-187475	Muhtelif İşler	379.214,94
06.03.10	Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri				379.214,94
06.03.30.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	2022H03-187475	Muhtelif İşler	7.355,03
06.03.30	Lisans Alımları				7.355,03
06.03.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Fikri Hak Alımları	2022H03-187475	Muhtelif İşler	10.766,51
06.03.90	Diğer Fikri Hak Alımları				10.766,51
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları				397.336,48

Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 13.903.500,00 TL olan 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 11.570.700,00 TL ödenek eklenmiş ve 314.000,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 25.160.200,00 TL olmuştur. 2022H03-187479 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 85.550,00 TL ve 2020H03-151368 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 2.981.874,79 TL olmak üzere toplamda 3.067.424,79 TL harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 12,19'dur. 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.05.10.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	2022H03-187479	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	75.520,00
06.05.10.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kapsamında Diğer Giderler	2022H03-187479	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	10.030,00
06.05.10.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kapsamında Diğer Giderler	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	21.122,00
06.05.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				106.672,00
06.05.60.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İş Makinası Kiralama Giderleri	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	82.889,10
06.05.60	Malzeme Giderleri				82.889,10
06.05.70.07	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Karayolu Yapım Giderleri	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	29.308,57
06.05.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	155.583,93
06.05.70	Müteahhitlik Giderleri				184.892,50
06.05.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	2.692.971,19
06.05.90	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				2.692.971,19
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				3.067.424,79

Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 200.000,00 TL olan 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 1.104.590,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 1.304.590,00 TL olmuştur. 2022H03-187475 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.280.586,32 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 98,16'dır. 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.06.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	376.834,39
06.06.20.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	31.765,60
06.06.20	Malzeme Giderleri				408.599,99
06.06.40.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2022H03-187475	Muhtelif İşler	5.103,50
06.06.40	Enerji Giderleri				5.103,50
06.06.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	455.465,60
06.06.90.01	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	99.888,97
06.06.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	311.528,26
06.06.90	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri				866.882,83
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri				1.280.586,32

Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.000.500,00 TL olan 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 566.630,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 1.567.130,00 TL olmuştur. 2022H03-187475 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.561.052,47 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 99,61'dir. 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.07.10.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	3.577,97
06.07.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				3.577,97
06.07.20.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sıhhi Tesisat Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	12.195,30
06.07.20	Malzeme Giderleri				12.195,30
06.07.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	1.038.400,00
06.07.70.90	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	Diğer Müteahhitlik Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	152.879,20
06.07.70	Müteahhitlik Giderleri				1.191.279,20
06.07.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2022H03-187475	Muhtelif İşler	354.000,00
06.07.90	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				354.000,00
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				1.561.052,47

Çizelge 17: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-18* ile 23'de yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'de gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2022H03-187479
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Yatırımı TL	400.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	-314.000,00
Proje Tutarı TL	86.000,00
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	86.000,00

Çizelge 18: Revizyon (2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2022H03-187475
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Yatırımı TL	4.398.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	11.671.220,00
Proje Tutarı TL	16.069.220,00
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	16.069.220,00

Çizelge 19: Revizyon (2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2022H03-187477
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Yatırımı TL	700.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Proje Tutarı TL	700.000,00
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	700.000,00

Çizelge 20: Revizyon (2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2020H03-151368
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2020-2022
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	7.759.205,00
2022 Yılı Yatırımı TL	1.500.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	1.570.700,00
Proje Tutarı TL	10.829.905,00
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	3.070.700,00

Çizelge 21: Revizyon (2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H03-1057
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2024
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2022 Yılı Yatırımı TL	12.002.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	10.000.000,00
Proje Tutarı TL	22.002.000,00
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	161.000.000,00


Çizelge 22: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)

Sektörü	Eđitim-Beden Eđitimi ve Spor
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H05-1269
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2023
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2022 Yılı Yatırımı TL	2.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Proje Tutarı TL	7.750.000,00
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	2.000,00

Çizelge 23: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2022I00-178965
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2022-2022
2022 Yılı Yatırımı TL	4.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	3.814.000,00
Proje Tutarı TL	7.814.000,00
2022 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	7.814.000,00

Çizelge 24: Revizyon (2022I00-178965 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler)

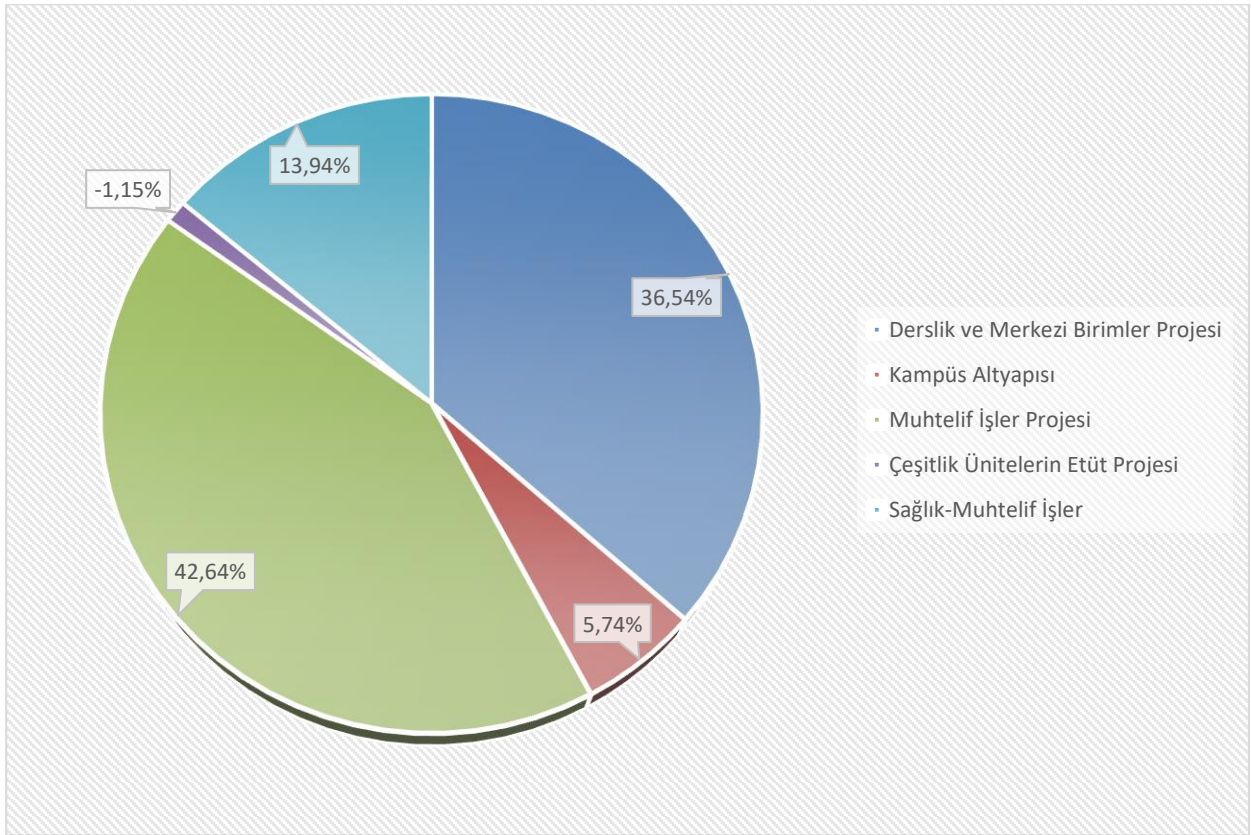

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı (Ödenek Eklemesi Yapılanlar)

2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması, ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca projenin uygulanması aşamasında sürekli artan fiyatlar nedeniyle yükleniciler zor durumda kalmaktadır.
- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının da etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.
- Kesin teminatın iadesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ihale mevzuatı gereğince geçici kabul yapıldıktan sonra kesin teminatın yarısının iade edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun'a göre kesin teminatın yarısının iadesinde ilişiksiz belgesi aranmamakta, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı Kanun'a göre ilişiksiz belgesi düzenlenmeden kesin teminatın yarısının iadesinin yapılamayacağı belirtilmekte olup SGK tarafından ilişiksiz belgesi düzenlenebilmesi için işe ait kesin hakediş tutarı istenilmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kesin hakediş tutarı, kesin kabul aşamasında kesin hakediş raporu ile tespit edilmektedir. Geçici kabul işleminden sonra işin kesin hakediş tutarı belli olmadığı için kesin teminatın yarısının iadesi mümkün olmamaktadır.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2022H03-187479 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2022 yılı bütçemize 400.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Yıl içerisinde 2022I00-178965 nolu Muhtelif İşler (Sağlık) projesine 314.000,00 TL aktarılmış olup toplam ödenek 84.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama ise 85.550,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022H03-187479 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	400.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	400.000,00
Düşülen TL	314.000,00
Toplam Ödenek TL	86.000,00
Harcama TL	85.550,00
Kalan Ödenek TL	450,00
Gerçekleşme Oranı %	99,48

Çizelge 25: 2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2022H03-187479 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yapılan harcamaya ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcama Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Proje Hizmet Alımı	62.540,00
Tıp Fakültesi 3 Boyutlu Mimari Proje Render Çizimi	12.980,00
Haritacılık Projesi Hizmet Alımı	10.030,00
TOPLAM	85.550,00

Çizelge 26: 2022H03-187479 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamalarının Detayı

3.2. 2022H03-187475 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.398.000,00 TL olup finansman fazlasından 6.671.220,00 TL ödenek eklenmiş, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 5.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Toplam ödenek 16.069.220,00 TL, toplam harcama ise 16.033.107,86 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022H03-187475 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	16.069.220,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	4.398.000,00
Eklenen - Aktarılan TL ¹	11.671.220,00
Toplam Ödenek TL	16.069.220,00
Harcama TL	16.033.107,86
Kalan Ödenek TL	36.112,14
Gerçekleşme Oranı %	99,78

Çizelge 27: 2022H03-187475 Nolu Muhtelif İşler Projesi

¹ 6.671.220,00 TL finansman fazlasından likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle, 5.000.000,00 TL Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 5.000.000,00 TL yedekten aktarma suretiyle karşılanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Farmakoloji Bölümü Laboratuvar Malzemesi Alımı	1.379.571,60
Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Biyofizik Sinyal Ölçüm ve Analiz Sistemi Alımı	1.067.900,00
Sıvı Kromatografi Cihazı Alımı	863.170,00
Diş Hekimliği Malzeme Alımı	859.729,82
Tıp Fakültesi Yarı Motorize Mikrotom Cihazı ve Makroskopi Kabini Alımı	735.966,00
Endüstriyel Fırın Enerji Verimlilik Merkezi Kop Projesi - Kalan Tutar	640.104,55
Akışkan Ekstraksiyon Sistemi	545.160,00
Tıp Fakültesi 15 Kalem Maket Alımı	538.670,00
Bilgisayar Güç Kaynağı Toner Alımı	451.447,86
Switch ve HDD Alımı	371.666,13
Azure Jel Görüntüleme Sistemi (Tıp)	350.460,00
Dijital Mikroskop Alımı	346.566,00
Laboratuvar Malzemesi	342.045,00
Switch Alımı	394.761,88
Bilgisayar Alımı	277.068,39
Öğrenci İşleri Otomasyonunda Kullanılmak Üzere Ek Modül Alımı	251.000,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Tıp Fakültesi Laboratuvar Cihazı Alımı	227.331,72
Tıp Fakültesi Kabin Çeker Ocak Alımı	192.104,00
Otomatik Pipet Seti Alımı	176.502,04
Tıp Fakültesi Floresan Trinoküler Mikroskop Alımı	171.336,00
FT-IR Cihazı Bakım Onarımı	170.000,00
Mikroskop Alımı	252.484,00
Ermenek SHMYO için Laboratuvar Malzemesi Alımı	162.873,61
Laboratuvar Malzemesi Alımı	157.058,00
Tıp Fakültesi Tezgah Yapımı (Endüstri Meslek Lisesi)	150.660,00
Switch ve Hard Disk Alımı	149.502,41
Homojenizatör Alımı	147.500,00
Tıp Fakültesi Laboratuvar Malzemesi Alımı	129.800,00
Masaüstü İş İstasyonu	129.458,33
Tıp Fakültesi İçin Dolap ve Tezgah Alımı	120.927,60
Laboratuvar Cihazı Alımları	119.122,64
Tabure Alımı	107.285,28
Laboratuvar Malzemesi Alımı (Pipet Seti)	96.052,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Tıp Fakültesi İçin ETÜV/İnkübatör Alımı	92.782,34
Yarı Motorize Mikrotom Cihazı ve Makroskopi Kabini Alımı	85.536,00
Bilgisayar Yedek Parça Alımı	85.404,27
Optik Okuyucu Alımı	80.464,20
Klima-Buzdolabı Alımı	79.632,30
Sağlık Hizmetleri MYO İş ve Uğraş Terapi Programı Malzeme Alımı	78.486,81
Güvenlik Hizmetinde Bulunan Telsizlere Batarya Alımı	78.470,00
Lastik Alımı	77.570,84
Buhar Sterilizatör Alımı	73.944,68
Kamera Sistemi Devreye Alma Ekipmanları	70.333,90
HPLC Cihazı Bakım Onarımı	69.999,96
Sarf Su Cihazı- Biyogüvenlik Kabini Bakım Onarımı	69.997,60
IP Güvenlik Kamerası	69.738,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 9 Aylık Kamera Bakım İşİ	63.720,00
Sanat Tasarım Fakültesi Elbise Dolabı	58.166,88
HDD Alımı	53.100,00
Microsoft Mcr-10 Pro İşletim Sistemi Alımı	49.333,44

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Bilişim Malzemeleri Alımı	49.088,00
Lamine Flo Cihazının Bakım Onarımı	39.164,20
Sanat Tasarım Keson Mutfak Dolabı Alımı	37.962,00
Tıp Fakültesi 3 Kalem Cihaz Alımı	34.220,00
Dijital Homojenizatör Alımı	31.860,00
Antivirüs Programı (1000 Kişilik) Alımı	30.000,00
Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü Cihaz Alımı	28.556,00
Klima Alımı	28.244,48
Dijital Duvar Piyanosu Alımı	28.147,72
Devexpress Yazılımı Alımı	26.550,00
Ekran Alımı	25.942,25
Halı ve Mobilya Alımı	20.995,20
Yoğuşmalı Kombi Alımı (45kw)	20.650,00
Araç Yedek Parça Alımı	19.708,09
Tıp Fakültesi ve Basın Odası Mobilya Alımı	18.360,00
Bekçi Kontrol Tur Sistemi Seti Alımı	17.700,00
Buzdolabı Alımı	16.536,52

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Tıp Fakültesi İçin Hava Perdesi Alımı	16.366,60
Fotokopi Makinası Bakım Onarımı	14.950,60
Makam Aracının Bakım Onarımı	14.829,06
Bilgisayar / Güç Kaynağı/ Toner Alımı	14.120,78
Araç Kışlık Lastik Alımı	13.876,80
Karıştırıcı Alımı	13.310,40
Fotokopi Makinesi İçin Yedek Parça Alımı	13.000,06
Voltaj Besleme Kartı Alımı	11.877,41
Askı Alımı (Endüstri Meslek)	10.746,00
Giriş Kapısı Araç Takip Sistemi (Lisans) Alımı	10.620,00
Derin Dondurucu Alımı	9.800,00
Sürekli İşçi Takip Programı (Çözüm Sql Access Kontrol Sistemi) Alımı	8.171,50
Ermenek SHMYO Spor Malzemesi Alımı (Set)	8.067,07
Lisans Programı Alımı	7.355,03
Üniversite Giriş-Çıkış Kapılarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı Ödemesi	5.888,20
Lastik Bakımı	5.838,64
Plaxis 3D Worksuite Akademik Lisans Alımı	5.395,50

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Araç Takip Sistemi Güncelleme Yazılımı Alımı	5.371,01
Araç Bakım Onarımı	5.266,34
Philips Airfryer Fritöz Alımı	4.720,00
Araçlara Klima Gazı Alımı (10 Kg)	4.484,00
Sınav Otomasyonu	3.540,00
Araç Bakım Malzemesi Alımı	3.304,00
Giriş Kapısı Araç Takip Sistemi (Kamera Direği) Alımı	3.186,00
Tekerlekli Sandalye Alımı (Ermenek SHMYO)	3.080,00
Otobüs Yedek Parça Alımı	2.937,02
Otobüs Bakım Malzemesi Alımı	2.784,80
Dilsiz Uşak Alımı	2.494,80
Yangın Söndürme Cihazı Alımı	2.478,00
Balata Alımı	2.177,10
Hava Filtresi Hortumu Alımı	1.650,00
Yağ-Yakıt-Hava Filtresi Alımı	1.380,60
Araç Kapı Fiteli Alımı	1.303,90
Makam Aracı Egzoz Partikül Temizleme ve Tamir İşİ	1.298,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Termostat Gövdesi Takımı Alımı	1.180,00
ABS Kablosu Alımı	796,50
El Freni Kolu Alımı	354,00
Ultrason Jeli Alımı	118,80
Genel Toplam	14.023.769,06

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	AES Teknik ve Tıbbi Sistemler Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Sözleşmenin Konusu	Fizyolojik ve Biyofizik Sinyal Ölçüm ve Analiz Sistemi
Proje Numarası	2022H03-187475
İhale Tarihi	03.10.2022
Sözleşme Tarihi	905.000,00 TL (KDV Hariç)
Sözleşme Bedeli TL	01.11.2022
Projeyle İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	30.12.2022
2022 Yılı Harcama Tutarı	1.067,90 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.067,90 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 29: Fizyolojik ve Biyofizik Sinyal Ölçüm ve Analiz Sistemi İhale Bilgileri



Resim 1: Fizyoloji Bölümü



Resim 2: Fizyoloji Bölümü-2

Bilimsel ve Teknolojik Arařtırmalar Uygulama ve Arařtırma Merkezi tarafından Muhtelif İřler Projesi kapsamında yapılan iřler ařađıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler	Tutarı (TL)
Nanomagnetics Instruments AFM Cihazının Bakım Onarımı	44.840,00
Bruker-Axs Marka D8 Discover Xrd Sistemi Bakım Onarımı	22.089,60
Temizleme Makinası Bakım Onarımı	11.195,45
Hassas Teraziler ve pH Metre Cihazının Bakım Onarımı	10.030,00
Fotokopi Makinası Bakım Onarımı	5.963,72
Akreditasyon Kapsamındaki Cihazların Kalibrasyon ve Bakım Onarımı	5.770,20
TOPLAM	99.888,97

Çizelge 30: Muhtelif İřler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler (BİLTEM)

Yapı İřleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler ařađıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler	Tutarı (TL)
Yunus Emre Yerleřkesi Binaları Bakım Onarımı	950.054,31
Yunus Emre Yerleřkesi Eğitim ve Hizmet Binaları Bakım Onarımı (2022/746781)	88.345,69
Yangın Algılama Sistemi Onarım Hizmet Alım İři	84.370,00
Taha Akgül Spor Salonu ahřap parke tadilatı ve cilalanması	80.240,00
BİLTEM ile Bilgi İşlem Binası Yađmur Oluđu Onarım ve Tadilat İři	75.405,54
KMÜ Yerleřkelerinde Bulunan Tüm Asansörlerin Revizyonu Yapım İři	70.800,00
Trafo Koruma Hücresi Mal Alımı	68.440,00
Yangın Algılama Sistemi Bakım Hizmet Alım İři	59.236,00
UPS Aylık Bakım	58.410,00
KMÜ 2021 Yılı Büyük Bakım Onarım Tadilat Yapım İři (2021/369157 İKN) - Ek Fiyat Farkı Ödemesi	52.187,42
Kesintisiz Güç Kaynađı Yedek Parça Alımı	52.122,96
Asansör Bakım Onarım	51.330,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Tıp Fakültesi Laboratuvarları Sıhhi Tesisat Altyapısı Bakım Onarımı	32.450,00
Üniversitemiz Yerleşkelerinde Bulunan Toplam 14 Adet Jeneratör İçin 11 Aylık Bakım ve Onarım Hizmet Alımı	29.500,00
Jeneratör Bakım Onarımı - Mal Alımı	29.216,80
Merkezi Isıtma Sistemi Bakım Onarımı	28.320,00
Asansör Mal Malzeme Alımı	22.998,20
Develop İneo 600 Fotokopi Makinası Fırın Ünitesi Bakım Onarımı Hizmet Alım İşİ	13.847,30
Kazım Karabekir MYO ve TR 2 Jeneratörlerine Ait Transfer Panoları Bakım Onarım Mal Alımı	13.098,00
Sıhhi Tesisat Malzeme Alımı	12.195,30
Hidromek Kepçenin 3.000 Saatlik Bakım Onarımı İçin Mal Alımı	12.154,00
Chiller Soğutma Yağ ve Drayer Filtre Alımı	8.260,00
Chiller Soğutma Cihazı Gaz Alımı (Kg)	3.540,00
Ermenek Meslek Yüksekokulu Orta Gerilim Hattı Onarım Yapım İşİ	2.950,00
Mal ve Malzeme Alımı (2021/205751)	2.882,59
Traktör İçin Yağ Alımı	2.548,80
Traktör Tamiri İçin Malzeme Alımı	1.563,50
2021 Yılı Mal/Malzeme Sulama Tesisatı Malzeme Kısmı (2021/205751 İKN) - Ek Fiyat Farkı Ödemesi	1.223,72
2021 Yılı Mal/Malzeme Elektrik Malzeme Kısmı (2021/205751 İKN) Ek Fiyat Farkı Ödemesi	1.064,32
Mal ve Malzeme Alımı (2021/205751) - Ek Fiyat Farkı	695,38
TOPLAM	1.909.449,83

Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)




Resim 3: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 4: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler




Resim 5: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler

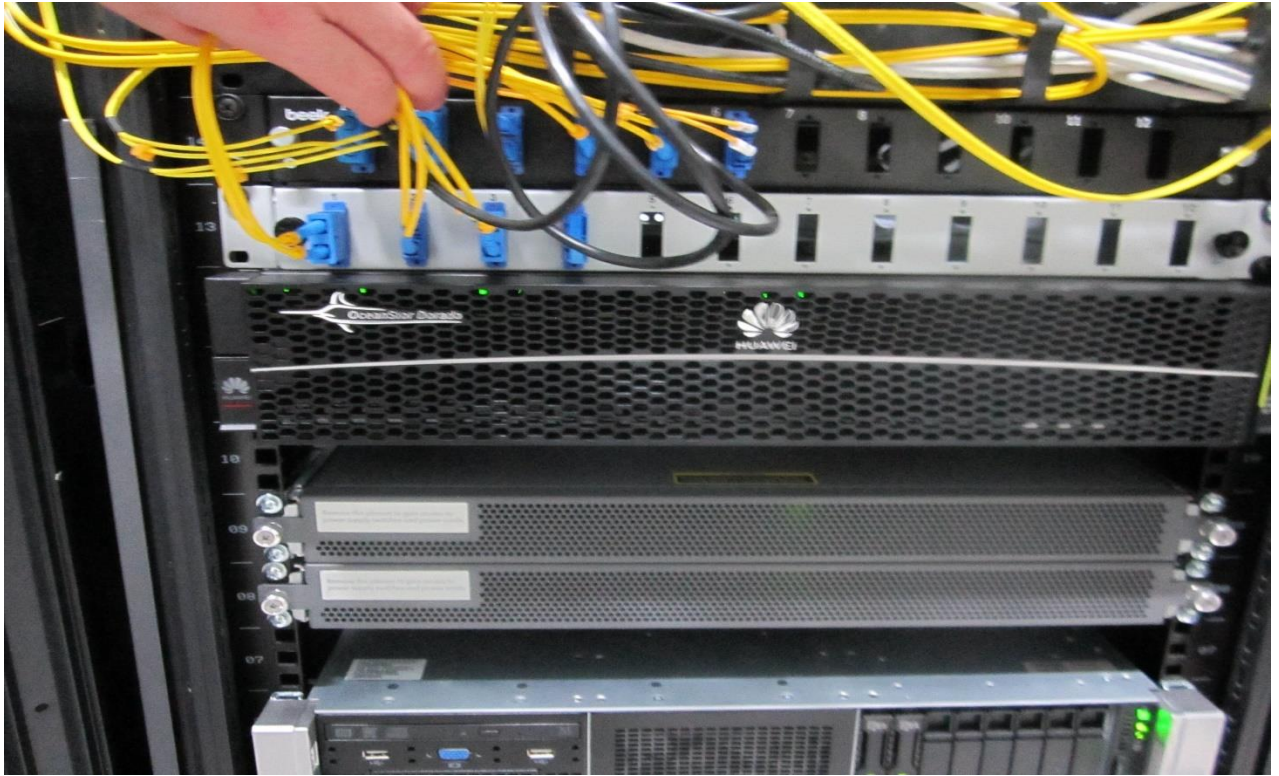

Resim 6: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 7: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 8: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 9: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 10: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 11: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 12: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 13: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 14: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler

3.2.1. Yunus Emre Yerleşkesi Eğitim ve Hizmet Binaları Bakım Onarım Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan eğitim ve hizmet binalarına, bakım onarım talepleri doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan projeler uygulanmıştır. Bu amaçla 880.000,00 (KDV hariç) TL sözleşme bedeli ile KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Eğitim ve Hizmet Binaları Bakım Onarım Yapım İşi ihalesi yapılmış ve 2022 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Özkon Yapı İnşaat Makina Asansör ve Doğalgaz Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Eğitim ve Hizmet Binaları Bakım Onarım Yapım İşi
Proje Numarası	2022H03-187475
İhale Tarihi	05.08.2022
Sözleşme Tarihi	24.08.2022
Sözleşme Bedeli TL	880.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	26.08.2022
Fiilen İşe Başlama Tarihi	26.08.2022
İşin Bitim Tarihi	19.10.2022
2022 Yılı Harcama Tutarı	950.054,31
Toplam Harcama Tutarı	950.054,31
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 32: Yunus Emre Yerleşkesi Eğitim ve Hizmet Binaları Bakım Onarım Yapım İşi İhale Bilgileri



Resim 15: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çatı Yahtım İşi

3.3. 2022I00-178965 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup yıl içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.500.000,00 TL, 2022H03-187479 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden 314.000,00 TL sektörler arası ödenek aktarması yapılmıştır. Ödeneğin tamamı olan 7.814.000,00 TL harcanmıştır. 2022I00-178965 nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Makine Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	4.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	4.000.000,00

Eklenen - Aktarılan TL ²	3.814.000,00
Toplam Ödenek TL	7.814.000,00
Harcama TL	7.814.000,00
Kalan Ödenek TL	0,00
Gerçekleşme Oranı %	100,00

Çizelge 33: 2022100-178965 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Diş Üniti Alımı	4.146.055,82
Performans Ölçüm ve Analiz Cihazı Alımı	735.966,00
Ağız İçi Tarayıcı Alımı	731.333,70
Laboratuvar Malzemeleri Alımı	436.946,40
Laboratuvar Cihazı Alımı	392.040,00
Preklinik Masa Alımı	384.208,00
Diş Hekimliği Fakültesi İçin Malzeme Alımı	305.841,60
Bilgisayar Alımı	263.095,87
Bilgisayar, Güç Kaynağı ve Toner Alımı	94.250,30
Alüminyum Çerçeve Panel Bölücü ve Temperli Kumlu Çift Cam Alımı	83.603,00
Tedavi Masası ve Solunum Cihazı Alımı	81.220,00
Klima Alımı	55.330,19
Projeksiyon Alımı	38.884,30
Switch Alımı	38.018,74

² Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.500.000,00 TL, Çeşitli Üniteler Etüt Projesinden sektörler arası ödenek aktarması ile 314.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
TV Alımı	12.110,34
Çamaşır Kurutma Makinesi Alımı	8.605,74
Çamaşır Makinesi Alımı	6.490,00
TOPLAM	7.814.000,00

Çizelge 34: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler



Resim 16: Sağlık Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar



Resim 17: Sağlık Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

3.4. 2022H03-187477 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 700.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam harcama ise 655.351,46 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,90 olarak gerçekleşmiştir.

2022H03-187477 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	700.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	700.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	700.000,00
Harcama TL	655.351,46
Kalan Ödenek TL	44.648,54
Gerçekleşme Oranı %	93,62

Çizelge 35: 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi

2022H03-187477 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Basılı Yayın Alımı – 933 Adet	71.985,41
Basılı Süreli Yayın Alımı – 63 Adet	22.021,00

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Acland's Anatomy Veri Tabanı	111.389,05
Axsis Veri Tabanı	88.500,00
Vetis Veri Tabanı (Kampüs Dışı Erişim Sistemi)	88.500,00
Hiperkitap Veri Tabanı	69.352,75
Turcademy Elektronik Kitap Koleksiyonu	48.727,19
İdeal Online Süreli Yayın ve Tıp Kitapları Veri Tabanı Aboneliği	42.480,00
Ayeum Veri Tabanı	35.000,00
Piri Keşif Aracı	16.896,00
Vidobu Veri Tabanı	14.998,98
Eosmanlıca Çevrimiçi Eğitim Platformu	14.160,00
BookCites Atıf Dizini	11.968,00
Sobiad Atıf Dizini	9.395,00
Lehçediz Veri Tabanı	5.900,00
LEXPERA Veri Tabanı	4.078,08
TOPLAM	655.351,46

Çizelge 36: 2022H03-187477 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **Acland's Anatomy Veri Tabanı**

Tıp, hemşirelik, doktor asistanı, fizik / mesleki terapi, konuşma / dil ve dişçilik programları dahilindeki herhangi bir kurumun çalışanları, fakülte ve öğrencileri için önemli bir kaynaktır. Acland's'ın İnsan Anatomisi Video Atlası, sınıfta ve pratikte aldıkları eğitim ve öğretimi desteklemek için temel bilgiler sağlar.

- **Axsis Veri Tabanı**

Akademik açık erişim, bilgi ve belge araştırması, istatistikleri konusunda akademik araştırmalara yönelik bir veri tabanıdır.

- **VETİS Veri Tabanı (Kampüs Dışı Erişim Sistemi)**

Ulusal veya uluslararası elektronik veri tabanlarına, kampüs dışından, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayan bir araçtır.

- **Hiperkitap Veri Tabanı**

Hukuk'tan Sağlık Bilimlerine, Ekonomiden Dil ve Edebiyata, Mimarlıktan Mühendislik, Bilgisayar, Tasarım, Teknik Bilimlere 28 temel konu başlığında 20.000'den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlayan Türkçe içerikli bir elektronik kitap veri tabanıdır.

- **TURCADEMY Elektronik Veri Tabanı**

Turcademy, Türkiye'de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademik ve idari personel ile öğrencilerimize kolay bir şekilde ulaştıran yerli bir e-kitap platformudur.

- **İdeal Online Süreli Yayın ve Tıp Kitapları Veri tabanı**

İdealonline, araştırmacıların Türkiye'de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve her zaman erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktadır. İdeal online içerisinde akademik dergiler, popüler dergiler, ideal tıp kitapları, konferans & armağanlar ve ideal e-kitap olmak üzere 5 ayrı veri tabanı vardır.

İdealonline veri tabanlarının amacı; Türkçe bilgi kaynaklarını e-ortama taşımak, Türkçe bilgi kaynaklarına 7/24 erişim sağlamak, Türkçe içeriğe modern veri tabanı sistemi ve cihazlarla erişim sağlamak, Türkçe içeriği dünyanın kullanımına sunmak ve daha fazla Türkçe kaynak yayımlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır.

- **AYEUM Veri Tabanı**

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) , sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

- **Piri Keşif Aracı Veri Tabanı**

Arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır. Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için araştırılan konu hakkında birçok veri tabanını tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. Yapay zekâ destekli modern arama algoritmaları ile ilgili içerikleri bulmayı amaçlar.

- **Video Eğitim Platformu (VİDOBU) Veri Tabanı**

Kişisel gelişim, mesleki gelişim, bilişim teknolojileri ve hobi eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri Türkçe içerikler ile sağlayan çevrimiçi video eğitim platformudur.

12.000'den fazla eğitim videosuna sahip olan platform, Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine yönelik akademik destek sağlaması hedeflenmektedir.

- **E-Osmanlıca Online Eğitim Veri Tabanı**

E-Osmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "doğru/yanlış, eşleştirme, şıklı ve gördüğünü yaz vb." tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. E-Osmanlıca dersleri öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak, onları sınıftaki eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlamaktadır.

- **BookCites Atıf Dizini**

Akademik kitaplar, akademik dünyada bilginin aktarılması için yapılan yayınların çok önemli bir türünü oluşturur. Çok büyük emek ve uğraşı sonucunda hazırlanan akademik kitaplarda bölüm sonlarında veya kitap sonunda kaynakçalar da yer alır. Atıf bulmak akademisyenin kendi yayınlarından yararlanan eserleri bulması anlamına gelir. Binlerce eserin taranması ve atıflar arasından araştırmacının kendi yayını bulması çok zor bir iştir.

BookCites aynı zamanda akademik bir veri tabanıdır. Kullanıcı tek arama panelinden binlerce kitap ve kitap bölümü içerisinden arama yapabilir. BookCites ile araştırmacılar açık erişimli kitapların tam metinlerine de kolaylıkla ulaşabilirler.

- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayımlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veri tabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, her ay düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayımlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir.

- **Lehçediz Elektronik Veri Tabanı**

Lehçediz Çalışması, Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri; Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir kelimesi ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa çevirmeden saniyeler içinde araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Sadece internet erişimi olan bir cihaz ile bilimsel bir kitap veya makale için binlerce veri elde edilebilmektedir. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal ve tek kaynaktır. Lehçediz çalışması araştırmacılar için önemli bir durak olmuştur. Çalışma üzerinden ülkemizin birçok üniversitesinden yüksek lisans, doktora tezi yapılmış; bildiriler sunulmuş, makaleler hazırlanmıştır

- **LEXPERA Veri Tabanı**

İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve multi-platform erişim imkânı ile LEXPERA akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yenilikçi çözümler sunmaktadır. Güncel mevzuatı, içtihadı, tam metin hukuk kitaplarını, makaleleri, kanun yorumlarını, bibliyografik bilgileri, sözleşme örneklerini ve genel internet arama sonuçlarını kapsamaktadır.

3.5. 2020H03-151368 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2022 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 1.570.700,00 TL finansman fazlasından eklenmesiyle birlikte toplam ödenek 3.070.700,00 TL olmuş toplam harcama 2.981.874,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı harcamalarının toplam ödenğe göre gerçekleşme oranı % 97,11'dir. 2020H03-151368 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı, Engelsiz Üniversite
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	10.829.905,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.500.000,00
Eklenen TL ³	1.570.700,00
Toplam Ödenek TL	3.070.700,00

³ Finansman fazlasından eklenmiştir.

Harcama TL	2.981.874,79
Kalan Ödenek TL	88.825,21
Gerçekleşme Oranı (%)	97,11

Çizelge 37: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Cami Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (2021/518306 İKN)	1.461.999,51
Spor Bilimleri Fakültesi Çevresi Çevre Düzenlemesi (2022/812693)	1.162.300,00
20 Tonluk Paletli Ekskavatör İş Makinası Kiralama Hizmeti (63 Saat)	82.889,10
Peyzaj İçin Bitkisel Toprak (3.780 M ³)	82.517,40
Uygulama Otelİ Çevresi Düzenleme	68.671,68
Engelli Platformu Mal Alımı	36.981,20
Güney Giriş Kapısı Kaldırım ve Refüj Yol Aydınlatma İşİ (Ek Fiyat Farkı) (2021/167725 İKN)	29.308,57
Mal ve Malzeme Alımı (2021/205751 İKN)	22.058,96
Engelsiz Üniversite İmalatları Yapılması Yapım İşİ	21.122,00
Çevre Duvarı Yapım İşİ İcra Ödemesi (2016/61083 İKN)	14.026,37
TOPLAM	2.981.874,79

Çizelge 38: 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

3.5.1. Spor Bilimleri Fakültesi Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi bulunan Spor Bilimleri Fakültesi çevresi çevre düzenleme işinin 985.000,00 (KDV hariç) TL bedel ile ihalesi yapılmış ve 2022 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Özkon Yapı İnşaat Makina Asansör ve Doğalgaz Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2020H03-151368
İhale Tarihi	02.09.2022
Sözleşme Tarihi	28.09.2022
Sözleşme Bedeli TL	985.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	30.09.2022
Fiilen İşe Başlama Tarihi	30.09.2022
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	23.11.2022
2022 Yılı Harcama Tutarı	1.162.300,00 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.162.300,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 39: Spor Bilimleri Fakültesi Çevresi Çevre Düzenleme İş Yapım İş İhale Bilgileri



Resim 18: : Spor Bilimleri Fakültesi Çevresi Çevre Düzenleme İşi

3.5.2. Cami Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012 yılında imzalanan Protokol ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde Cami yapımına başlanmıştır. Devlet - vatandaş işbirliği ile Cami 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Toplam 5.000 m² kapalı alanda 6.000 kişinin ibadet edebileceği Üniversite cami Osmanlı Selatin Camileri mimarisi örneğinde yapılmıştır.

Üniversitemiz tarafından 2021 yılı Eylül ayında Cami Çevre Düzenleme İhalesi yapılmış 2022 Haziran ayı sonunda çevre düzenleme çalışmalarını da tamamlanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 1.385.000,00 (KDV hariç) TL'dir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Caminin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarafından 30 Eylül 2022 de gerçekleştirilmiştir.

Ağaçlandırma işlemi personelimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla tamamlanmıştır.

Yapılan etkinlikte 34 adet iğde, 111 adet ters sarkık dut, 55 adet ıhlamur,71 adet bodur armut,68 adet erik, 35 adet kayısı, 101 adet şeftali,117 adet leylandi servisi,78 adet kiraz, 98 adet

elma, 42 adet ayva, 13 adet üzüm, 92 adet ılgın, 13 adet leylak, 74 adet gül, 138 adet böğürtlen, 124 adet ahududu, 38 adet frenk üzümü, 38 adet goji berry, 31 adet kuşburnu ve 38 adet alıç dikilmiştir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Kentöz Hafriyat Nakliyat Makina Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Cami Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
Proje Numarası	2020H03-151368
İhale Tarihi	21.09.2021
Sözleşme Tarihi	15.10.2021
Sözleşme Bedeli TL	1.385.000,00 TL + KDV
Projeye İlgili Revizyonlar	Süre Uzatımı – 26.07.2022
Revizyon Nedenleri	İmalat değişikliği nedeniyle süresinde bitirilememesi.
Fiyat Farkı (Pandemi nedeniyle)	200.857,40 TL + KDV
Yer Teslim Tarihi	20.10.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	20.10.2021
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	26.06.2022
2022 Yılı Harcama Tutarı	1.461.999,51 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.870.964,46 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 40: Cami Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ İhale Bilgileri



Resim 19: Cami



Resim 20: Cami Çevresi Düzenleme-1



Resim 21: Cami Çevresi Düzenleme-2

3.5.3. Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenleme Yapım İşi

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi içerisinde bulunan ve yapımı tamamlanan Kazım Karabekir Yerleşkesi cami çevresi, çok amaçlı salon ve kapalı spor tesislerini kapsayacak şekilde çevre düzenlemesi işi yapılmıştır. Ağaçlandırma işlemi personelimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla tamamlanmıştır.

Yapılan etkinlikte 1.200 adet lavanta ve 300 adet doğu mazısı dikilmiştir.



Resim 22: Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi

3.5.4. Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesi İşi

2019 yılında geçici kabulü yapılan eğitim binamızın çevre düzenleme işleri için projelendirme çalışmaları 2020 yılı içerisinde yapılmış olup ön cephe bordür ve parke işleri tamamlanmış binanın kuzey cephesinde bulunan otopark kısmı 2021 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Projelendirme ve uygulama Üniversitemiz teknik personeli ve sürekli işçilerimizin çalışmaları sonucu yapılmıştır. Yapılan çevre düzenleme işlemlerinin ağaçlandırma işleri hayırsever tarafından karşılanarak personelimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Yapılan etkinlikte 200 adet altınçanak, 200 adet alev çalısı, 200 adet ateş dikeni, 115 adet Japon ayvası, 200 adet kartopu, 200 adet kelebek çalısı, 100 adet ardıç, 100 adet hatmi, 100 adet kadın tuzluğu, 100 adet leylak, 60 adet yayılımcı ardıç, 200 adet lavanta, 30 adet top mazi, 10 adet doğu çınarı, 50 adet düz leylandi, 30 adet ters dut, 25 adet ıhlamur, 35 adet bodur armut, 25 adet kayısı, 50 adet top akasya, 35 adet şeftali, 100 adet hanımeli sarmaşık, 100 adet amerikan sarmaşığı, 35 adet erik ve 250 adet gül çeşidi dikilmiştir.



Resim 23: Tıp Fakültesi Çevre Düzenleme İşi-1



Resim 24: Tıp Fakültesi Çevre Düzenleme İşi-2

3.5.5. Ermenek Meslek Yüksekokulu ve Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi İşleri

Ermenek Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi içerisinde bulunan ve yapımı tamamlanan Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çevre düzenlemesi işi yapılmıştır. Ağaçlandırma işlemi personelimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla tamamlanmıştır.

Yapılan etkinlikte 114 adet mavi servi, 220 adet sabin ardıcı, 20 adet leylak, 100 adet gül, 10 adet bostan gülü, 20 adet bodur hanımeli, 300 adet ateş dikeni, 100 adet çalı hatmi, 205 adet dağ muşmulası, 5 adet ters dut, 10 adet ıhlamur, 10 adet süs elması, 5 adet süs eriği, 5 adet süs armudu ve 5 adet biberiye dikilmiştir.



Resim 25: Ermenek Meslek Yüksekokulu ve Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi İşleri-1



Resim 26: Ermenek Meslek Yüksekokulu ve Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi İşleri-2

3.5.6. Uygulama Oteli Çevre Düzenleme İşleri

Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Uygulama Otelinin çevre düzenlemesi işi yapılmıştır. Ağaçlandırma ve peyzaj işlemi personelimiz tarafından tamamlanmıştır.

Yapılan çalışmada 50 adet ligustrum, 20 adet bodur gül dikilmiş ve 250 m² çim alan ekilmiştir.



Resim 27: Uygulama Oteli Çevre Düzenleme İşleri

3.5.7. Engelsiz Üniversite

Üniversitemiz bütün yerleşke alanlarında engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlamakta ve mevzuata uygun olarak uygulamaktadır. 58.103,20 TL harcama yapılmıştır.



Resim 28: Engelsiz Üniversite

3.6. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2022 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 12.002.000,00 TL olup yıl içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 10.000.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 22.002.000,00 TL olmuştur.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m ²), Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m ²)
Alt Projeler	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m ²), Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m ²)
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	161.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	10.002.000,00
Eklenen TL ⁴	10.000.000,00
Toplam Ödenek TL	20.002.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek	20.002.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0,00

Çizelge 41: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

3.6.1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Üniversitemiz Tıp Fakültesinin kurulması 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14/06/2018 tarih ve 30451 sayılı Resmî Gazetede yayımlanması ile kararlaştırılmıştır. 07/08/2018 tarihinde Kurucu Dekan ataması yapılarak, kuruluş süreci başlamıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Konya Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde 31 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine

⁴ Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 10.000.000 TL ödenek aktarılmıştır.

başlayan Fakültemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Ortak Kullanım Protokolü ile Karaman Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesine dönüştürülerek afilyasyon sağlanmıştır.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Tıp fakültesi öğrencileri eğitimlerine Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi (3911 Ada 30 Parsel) içerisinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğu cephesinde kalan alan üzerine Morfoloji Binası yapılması için çalışmalara başlanmıştır.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Teknik personelimiz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hastane ile morfoloji binasının birbiri ile entegre olacak şekilde en uygun bağlantı noktasının hastanenin doğu cephesinden sağlanabileceği tespit edilmiştir.

Söz konusu morfoloji binası içerisinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeterli bulunmayan ve hasta tanılarında önemli rol oynayan laboratuvarlar kurulması planlanmaktadır. Bu sebeple hasta için yapılacak tetkiklerin birçoğu morfoloji binası içerisinde tasarlanacak laboratuvarlarda gerçekleştirileceğinden hastane ile morfoloji binasının bütünleşik tasarlanması planlanmıştır.

Morfoloji binamızın mimari projesi öğretim üyeleri ve teknik personelimiz tarafından titizlikle hazırlanmış olup hem öğrenci hem öğretim üyeleri hem de Karaman halkının istifade edebileceği şekilde planlanmıştır. Yapının toplam kapalı alanı yaklaşık 20.000 m² olarak belirlenmiştir.

2022 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından Tıp Fakültesi Morfoloji Binası alt projesinin proje büyüklüğü, 150.000.000,00 TL olarak revize edilmiş ve 2022 yılı ödeneğine yatırımları hızlandırma ödeneğinden 10.000.000,00 TL ödenek aktarılmış olup Derslik ve Merkezi Birimlerinin toplam proje büyüklüğü 161.000.000,00 TL olarak revize edilmiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 05.12.2022 yılında ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir.



Resim 29: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Vaziyet Planı



Resim 30: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası-1



Resim 31: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası-2

3.6.2. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Otel

2018 yılı yatırım programına alınan ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkimizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren rekreasyon bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik, rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. Yatırım programında olmasına karşın Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilmiş olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.



Resim 32: Ermenek Belediye Başkanlığı Tarafından Üniversiteye Uygulama Oteli İçin Tahsis Edilen Alan

3.7. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2021 yılı bütçemize ayrılan ödenek 2.000,00 TL olup yıl içerisinde herhangi bir ödenek revizyonu yapılmamıştır. 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)
Alt Projeler	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı TL	7.750.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	2.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek	2.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0

Çizelge 42: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu

2016 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak yatırım izni verilmeyen projemiz ihaleye çıkma aşamasındadır. İzin ile birlikte projemiz ihale edilecektir. Projemiz 500 kişilik seyirci oturma kapasitesine sahiptir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren rekreasyon bölümü programı öğrencileri başta olmak üzere Ermenek yerleşkesindeki bütün öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.

4. Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı 12 Kasım 2018 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Stratejik Planımızda dört amaç ve bu amaçlarla ilişkili 18 hedef belirlenmiştir. Üniversitemiz, ortak akılla hazırlanan Stratejik Planımız ile farklılaşma alanları olarak belirlenen Türk dili, gıda-tarım ve temiz enerji alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik belirlenen hedeflerinin yanı sıra, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması, kurumsallaşma ve kalitenin artırılması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile bilgiye erişim imkânları ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik belirlenen amaç ve hedeflerini de gerçekleştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz stratejik planı ile yatırım programı ilişkisi kurularak aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler	
A-1	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H05-1269	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi),	0,00	Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir
			Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H03-1057	Uygulama Oteli (4.821 m ²)	0,00	Proje hazırlık aşamaları devam ediyor.
			Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H03-1057	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m ²)	0,00	05.12.2022 yılında ihaleye çıkmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir.
			Sağlık	Muhtelif İşler	2022I00-178965	Makine-Teçhizat	7.814.000,00	Diş üniteleri, laboratuvar cihazları, ağız ve diş eğitim malzemeleri ile çeşitli sağlık ekipmanlarının alımı gerçekleştirilmiştir
			Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	2020H03-151368	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2.981.874,79	Spor Bilimleri Fakültesi çevresi, Cami çevresi ve Uygulama Oteli çevresi çevre düzenleme işleri tamamlanmıştır. Çevre düzenlemelerinin bir kısmı alınan mal ve malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından yapılmıştır.

Stratejik Amaçlar		Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler
				Muhtelif İşler	2022H03-187475	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	16.033.107,86	Büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.
			Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2022H03-187479	Etüt-Proje	85.550,00	Mimari proje ve haritacılık hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
A-2	Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.	Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı	2022H03-187477	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	655.351,46	Abone veri tabanları, e-kitaplar ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

Çizelge 41: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

5. Proje Bazında Harcamalar

Proje No	Proje Adı	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2021 Kümülatif Harcama	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.				204.249.125,00	7.759.205,00	23.002.000,00	49.743.920,00	27.569.884,11
EĞİTİM				196.435.125,00	7.759.205,00	19.002.000,00	41.929.920,00	19.755.884,11
Yükseköğretim				188.685.125,00	7.759.205,00	19.000.000,00	41.927.920,00	19.755.884,11
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (12.000 m ²), Uygulama Oteli (4.821 m ²)	2009-2024	161.000.000,00	0,00	12.002.000,00	22.002.000,00	0,00
2009H03-1057-187482	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	Eğitim (12.000 m ²)	2022-2024	150.000.000,00	0,00	12.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2009H03-1057-68203	Ermenek MYO Uygulama Oteli	Uygulama Oteli (4.821 m ²)	2018-2023	11.000.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	10.829.905,00	7.759.205,00	1.500.000,00	3.070.700,00	2.981.874,79
2020H03-151368-151369	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	10.829.905,00	7.759.205,00	1.500.000,00	3.070.700,00	2.981.874,79
2022H03-187475	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2022-2022	16.069.220,00	0,00	4.398.000,00	16.069.220,00	16.033.107,86
2022H03-187475-187476	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2022-2022	16.069.220,00	0,00	4.398.000,00	16.069.220,00	16.033.107,86
2022H03-187477	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022-2022	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	655.351,46
2022H03-187477-187478	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022-2022	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	655.351,46
2022H03-187479	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2022-2022	86.000,00	0,00	400.000,00	86.000,00	85.550,00
2022H03-187479-187480	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2022-2022	86.000,00	0,00	400.000,00	86.000,00	85.550,00
Beden Eğitimi ve Spor				7.750.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)	2010-2023	7.750.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2010H05-1269-15497	Spor Salonu	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)	2016-2023	7.750.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SAĞLIK				7.814.000,00	0,00	4.000.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00
Sağlık				7.814.000,00	0,00	4.000.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00
2022I00-178965	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat	2022-2022	7.814.000,00	0,00	4.000.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00
2022I00-178965-178966	Makine Teçhizat	Makine-Teçhizat	2022-2022	7.814.000,00	0,00	4.000.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00
Genel Toplam				204.249.125,00	7.759.205,00	23.002.000,00	49.743.920,00	27.569.884,11

Çizelge 42: Proje Bazında Harcamalar

6. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
3. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
4. Proje ve ihale süreçlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.
5. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.
6. Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı finansman programı ile dağıtımı yapılırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca zamanında tahakkuka bağlanması kurumlara kolaylık sağlayacaktır.
