



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

# 2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMAN



**Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.**

*Atatürk*

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ



2025 yılı Yatırım Programı kapsamında, eğitim-öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikalar önceliklendirilmiştir. Buna yönelik olarak gerekli ödenekler Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları başta olmak üzere makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları ile öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha estetik ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

2025 yılı içerisinde altyapı ve çevre düzenlemesi işleri tamamlanmış, bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş, peyzaj ve çevre düzenleme işleri Üniversitemiz personeli tarafından yapılmıştır. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlanmıştır.

Modern eğitim olanakları, ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarları, geniş kapsamlı araştırma merkezleri ve nitelikli eğitim kadrosu ile genç doktor adaylarına en iyi eğitim ortamını sunmayı amaçlayan Tıp Fakültemiz, Morfoloji Binası ile daha da güçlenecektir.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ilkesi ile 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı 2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Prof. Dr. Mehmet GAVGALI**  
**Rektör**

## İÇİNDEKİLER

<b>1. YÖNETİCİ ÖZETİ .....</b>	<b>2</b>
<b>İÇİNDEKİLER .....</b>	<b>3</b>
<b>ÇİZELGELER .....</b>	<b>4</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>6</b>
2.1. ÖZGÖREVİMİZ .....	6
2.2. UZGÖRÜŞÜMÜZ .....	6
2.3. MİSYON FARKLILAŞMA VE İHTİSASLAŞMA .....	6
2.4. TEMEL YETKİNLİK TERCİHLERİ .....	6
2.5. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER .....	7
2.6. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	9
2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ .....	10
2.8. 2025 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI .....	14
2.8.1. Hedeflenen .....	14
2.8.2. Gerçekleşen .....	14
2.8.3. Devam Edenler .....	15
2.9. 2025 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	16
2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	16
2.9.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar .....	31
<b>3. PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>32</b>
3.1. 2025H03-258323 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ .....	32
3.2. 2025H03-258333 MUHTELİF İŞLER PROJESİ .....	33
3.2.1 2025 Yılı Asansör Periyodik Bakım İşİ .....	39
3.2.2 2025 Yılı Bakım Onarım İşİ .....	40
3.3. 2025I00-248129 SAĞLIK-MUHTELİF İŞLER PROJESİ .....	44
3.4. 2025H03-258331 YAYIN ALIMI PROJESİ .....	49
3.5. 2023H03-212700 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ .....	53
3.5.1. Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ .....	54
3.5.3. Engelsiz Üniversite .....	55
3.6. 2009H03-1057 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ .....	56
3.6.1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası .....	56
3.6.2. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli .....	62
3.7. 2010H05-1269 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ .....	63
3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu .....	63
3.7.2. Spor Tesislerinin Bakım Onarımı .....	64
3.8. 2023K12-214484 İHTİSASLAŞMA PROJESİ .....	66
<b>4. STRATEJİK PLAN YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ .....</b>	<b>69</b>
<b>5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR .....</b>	<b>72</b>
<b>6. ÖNERİLER .....</b>	<b>74</b>

## ÇİZELGELER

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar .....	7
Çizelge 2: Araştırma-Geliştirme Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefleri .....	7
Çizelge 3: İhtisaslaşma Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefler .....	7
Çizelge 4: Tedavi Edici Sağlık Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefler .....	8
Çizelge 5: Yükseköğretim Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefler .....	8
Çizelge 6: Kurumsallaşma Eksenini Stratejik Amaç ve Hedefleri .....	8
Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları .....	9
Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m <sup>2</sup> ) .....	10
Çizelge 9: Taşınmazların Genel Dağılımı (m <sup>2</sup> ) .....	11
Çizelge 10: Kapalı Mekânların Dağılımı .....	12
Çizelge 11: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m <sup>2</sup> ) .....	14
Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı .....	17
Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) .....	19
Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) .....	19
Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) .....	20
Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey) .....	21
Çizelge 17: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) .....	23
Çizelge 18: Diğer Sermaye Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) .....	23
Çizelge 19: Revizyon (2025H03-258323 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi) .....	24
Çizelge 20: Revizyon (2025H03-258333 Nolu Muhtelif İşler) .....	25
Çizelge 21: Revizyon (2025H03-258331 Nolu Yayın Alımı) .....	26
Çizelge 22: Revizyon (2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı) .....	27
Çizelge 23: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler) .....	28
Çizelge 24: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri) .....	29
Çizelge 25: Revizyon (2025I00-248129 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler) .....	29
Çizelge 26: Revizyon (2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi) .....	30
Çizelge 27: 2025H03-258323 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	32
Çizelge 28: 2025H03-258333 Nolu Muhtelif İşler Projesi .....	33

<i>Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)</i> .....	36
<i>Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM)</i> .....	37
<i>Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Kütüphane ve Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kamil Özdağ Fen Fakültesi)</i> .....	37
<i>Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)</i> .....	38
<i>Çizelge 33: 2025 Yılı Asansör Aylık Periyodik Bakım İşi İhale Bilgileri</i> .....	39
<i>Çizelge 34: 2025 Yılı Bakım Onarım İşi İhale Bilgileri (Muhtelif İşler)</i> .....	40
<i>Çizelge 35: 2025I00-248129 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi</i> .....	45
<i>Çizelge 36: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)</i> .....	46
<i>Çizelge 37: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)</i> .....	46
<i>Çizelge 38: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi)</i> .....	46
<i>Çizelge 39: 2025H03-258331 Nolu Yayın Alımı Projesi</i> .....	49
<i>Çizelge 40: 2025H03-258331 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı</i> .....	50
<i>Çizelge 41: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi</i> .....	53
<i>Çizelge 42: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı</i> .....	54
<i>Çizelge 43: Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhale Bilgileri</i> .....	55
<i>Çizelge 44: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi</i> .....	56
<i>Çizelge 45: KMÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi İhale Bilgileri</i> .....	58
<i>Çizelge 46: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi</i> .....	63
<i>Çizelge 47: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Spor Tesislerinin Bakım Onarımı) Harcamalarının Detayı</i> .....	64
<i>Çizelge 48: 2025 Yılı Bakım Onarım İşi İhale Bilgileri (Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)</i> .....	65
<i>Çizelge 49: 2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi</i> .....	66
<i>Çizelge 50: Sanayi ile yapılan proje sayısı</i> .....	68
<i>Çizelge 51: Mevcut projeler</i> .....	68
<i>Çizelge 52: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi</i> .....	71
<i>Çizelge 53: Proje Bazında Harcamalar</i> .....	73

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1. Özgörevimiz

Üniversitemiz öğrenmeyi ve araştırmayı bilen mesleki açıdan donanımlı ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi, evrensel bilgiler üreten bir kurum olmayı, ihtisaslaşma alanlarında bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

### 2.2. Uzgörüşümüz

Dinamik, yeteneğini keşfeden, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bireyler yetiştiren; evrensel ölçütleri karşılamanın yanı sıra güncel sıralama ölçütlerinde yer alan saygın üniversitelerden biri olmak.

### 2.3. Misyon Farklılaşma ve İhtisaslaşma

Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri.

### 2.4. Temel Yetkinlik Tercihleri

- ✓ Yenilikçi,
- ✓ Üniversite kültürünü kurumsallaştıran,
- ✓ Güçlü akademik kadroya sahip,
- ✓ Birçok disiplinde çalışmalarda yetkinleşmiş,
- ✓ Zengin kütüphane kaynaklarına sahip,
- ✓ Güçlü laboratuvarlar, uygulama alanları ve teknolojik altyapı,
- ✓ TEKNOPARK, İŞGEM ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve is dünyası ile güçlü ilişkiler kuran,
- ✓ Şehir ve üniversite bütünleşmesini tesis etmiş.

## 2.5. Temel Amaç ve Hedefler

EKSENLER	AMAÇLAR
<b>ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME EKSENİ</b>	Amaç 1: Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğinin artırılması.
<b>İHTİSASLAŞMA EKSENİ</b>	Amaç 2: Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
<b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK EKSENİ</b>	Amaç 3: Tedavi edici sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkili olarak sunulması.
<b>YÜKSEKÖĞRETİM EKSENİ</b>	Amaç 4: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarılması.
<b>KURUMSALLAŞMA EKSENİ</b>	Amaç 5: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünün oluşturulması, kurumsal gelişmenin sağlanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğinin artırılması.	Üniversitemizde yenilikçi ve özgün bilimsel çalışmaların artırılması.
	Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere Üniversitemizin araştırma altyapısının güçlendirilmesi.
	Üniversite ve özel sektör kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar için ihtiyaç duyulan fiziki altyapının geliştirilmesi yanında kaliteli ve güvenilir test ve analiz hizmeti sunulması.
	Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilerek bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması.
	Akademik personelin alanında yetkin, bilgi üreten ve bilgiyi paydaşlarına aktaran bir birey olması için teşvik edilmesi.

Çizelge 2: Araştırma-Geliştirme Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefleri

AMAÇ 2	HEDEFLER
Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.	Bölge üreticisi ile teknik personelin eğitim düzeyini, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasını ve tarımda teknoloji kullanımını arttıracak çalışmalar yapılması.
	Bölgenin endüstriyel gıda çeşitliliği, ürün kalitesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına ve yenilikçi gıda işleme tekniklerinin kullanımına katkıda bulunulması.

Çizelge 3: İhtisaslaşma Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 3	HEDEFLER
Tedavi edici sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkili olarak sunulması.	Sunulan tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sürdürülebilirliğin korunması ve klinik kalitenin iyileştirilmesi.
	Ağız ve diş sağlığı farkındalığının artırılması ile ulusal ağız ve diş sağlığı araştırma faaliyetlerine katkıda bulunulması.

Çizelge 4: Tedavi Edici Sağlık Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 4	HEDEFLER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarılması.	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi.
	Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık ve kültür hizmetlerinin kalitesinin artırılması, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi.
	Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak uygulamalar yaparak uluslararası tanınırlığın artırılması.
	Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi; kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulması.

Çizelge 5: Yükseköğretim Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 5	HEDEFLER
Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünün oluşturulması, kurumsal gelişiminin sağlanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması.	Karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
	Tüm akademik ve idari birimlerde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması.
	Plan dönemi sonuna kadar yükseköğretim kalite güvencesi kapsamında akreditasyonun tamamlanması.
	Kurumsal olarak üretilen bilgilerin doğruluğu, takibi ve değerlendirilmesi ile envanterinin oluşturulabilmesi için bütünleşik, dinamik, esnek ve kullanıcı dostu bilgi sisteminin geliştirilmesi.
	Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile toplumsal katkının artırılması.

Çizelge 6: Kurumsallaşma Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefleri

## 2.6. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 228.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 323.589.000,00 TL olmuştur. Projelerin sektörlere göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2025 Yılı Program Ödeneği	2025 Yılı Revizeli Ödenek	2025 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	557.000.000	84.000.000	111.200.000	217.215.000	217.213.819
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	39.794.000	23.800.000	18.300.000	15.994.000	15.097.446
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10.198.100	6.498.100	5.000.000	3.700.000	3.518.474
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	0,00	1.000.000	200.000	30.000
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler	65.680.000	0,00	66.500.000	65.680.000	63.430.201
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı	2.800.000	0,00	3.000.000	2.800.000	2.799.995
Sağlık-Sağlık	Muhtelif İşler Projesi	13.000.000	0,00	13.000.000	13.000.000	5.751.695
DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	İhtisaslaşma Projesi	54.472.000	19.000.000	10.000.000	5.000.000	0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>743.144.100</b>	<b>133.298.100</b>	<b>228.000.000</b>	<b>323.589.000</b>	<b>307.841.629</b>


Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

## 2.7. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların %95,61'i Yunus Emre Yerleşkesi, %3,04'ü Ermenek Yerleşkesi ve %1,34'ü de Kazım Karabekir Yerleşkesinde yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	-	1.607.650,89	-	1.607.650,89
Ermenek Yerleşkesi	51.581,75	-	-	51.581,75
Kazım Karabekir Yerleşkesi	-	22.578,04	-	22.578,04
<b>Genel Toplam</b>	<b>51.581,75</b>	<b>1.630.228,93</b>	<b>-</b>	<b>1.681.810,68</b>

Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m<sup>2</sup>)



Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı

İLÇESİ	MAHALLE	ADA	PARSE L	YÜZÖLÇÜM (m <sup>2</sup> )	CİNSİ	HİSSE	MÜLKİYET
MERKEZ	HAMİDİYE	361	27	49.438,06	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	HAMİDİYE	361	28	29.204,52	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	HAMİDİYE	361	33	30.076,57	TARLA	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	KIRBAĞI	3911	30	1.607.650,89	Beş Katlı Bet. Eğitim Fak. ve Beş Katlı Bet. Sağlık Bilimleri Fak. ve Beş Katlı Bet. Dış Hekimliği Fak. ve Meslek Yüksek Okulu, 1 Katlı 3 Adet Çelik Konstrüksiyon Spor Tesisi, 1 Katlı 1 Adet Bet. Kapalı Spor Tesisi, 1 Katlı 1 Adet Bet. Sosyal Tesis, 2 Katlı 3 Adet Bet. Üni. Binası, 3 Katlı 1 Adet Bet. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 3 Katlı 1 Adet Bet. Mesken, 3 Katlı 5 Adet Bet. Üni. Binası, 4 Katlı 6 Adet Bet. Üni. Binası, 5 Katlı 5 Adet Bet. Üni. Binası, 6 Katlı 1 Adet Bet. Üni. Binası ve Arsası	TAM	MALİYE HAZİNESİ
MERKEZ	YENİŞEHİR	5168	2	1.375,18	ARSA	TAM	KMÜ
MERKEZ	YENİŞEHİR	5169	1	4.117,15	ARSA	TAM	KMÜ
ERMENEK	SEYRAN	112	33	51.581,75	Bir Adet 4, Bir Adet 5 Katlı Yüksek Okul Binası, Bir Adet 5, Bir Adet 6 Katlı Öğrenci Yurdu Binası, Bir Adet 4 Katlı İlköğretim Okulu Binası, 4 Katlı Betonarme Atölye Binası ve Arsası	TAM	KMÜ
KAZIM KARABEKİR	EMSAL HAYAT	970	5	22.578,04	Beş Katlı Betonarme Okul, Üniversite, Araştırma Binası ve İki Katlı Karma Çok Amaçlı Salon, Bir Katlı Çelik Spor Binası ve Arsası	TAM	MALİYE HAZİNESİ
KAZIM KARABEKİR	BOYACI	1147	6	373,31	ARSA	HİSSE Lİ	KMÜ (31500/624018) KAZIMKARABEKİR BELEDİYESİ (592518/624018)
KAZIM KARABEKİR	SELÇUKLU	286	1	35.827,65	ARSA	HİSSE Lİ	KMÜ (23826/35827) Maliye Hazinesi


Çizelge 9: Taşınmazların Genel Dağılımı (m<sup>2</sup>)

Üniversitemizin kapalı mekânların hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
Yönetim	8.652	0	0	8.652
Araştırma	3.170	0	0	3.170
Eğitim	136.575	7.000	11.845	155.420
Sosyal	15.606	0	0	15.606
Toplantı ve Konferans	0	1.158	0	1.158

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
Spor	12.582	0	0	12.582
Barınma	1.603	0	0	1.603
Diğer	2.219	0	150	2.369
<b>Genel Toplam</b>	<b>180.407</b>	<b>8.158</b>	<b>11.995</b>	<b>200.560</b>

Çizelge 10: Kapalı Mekânların Dağılımı

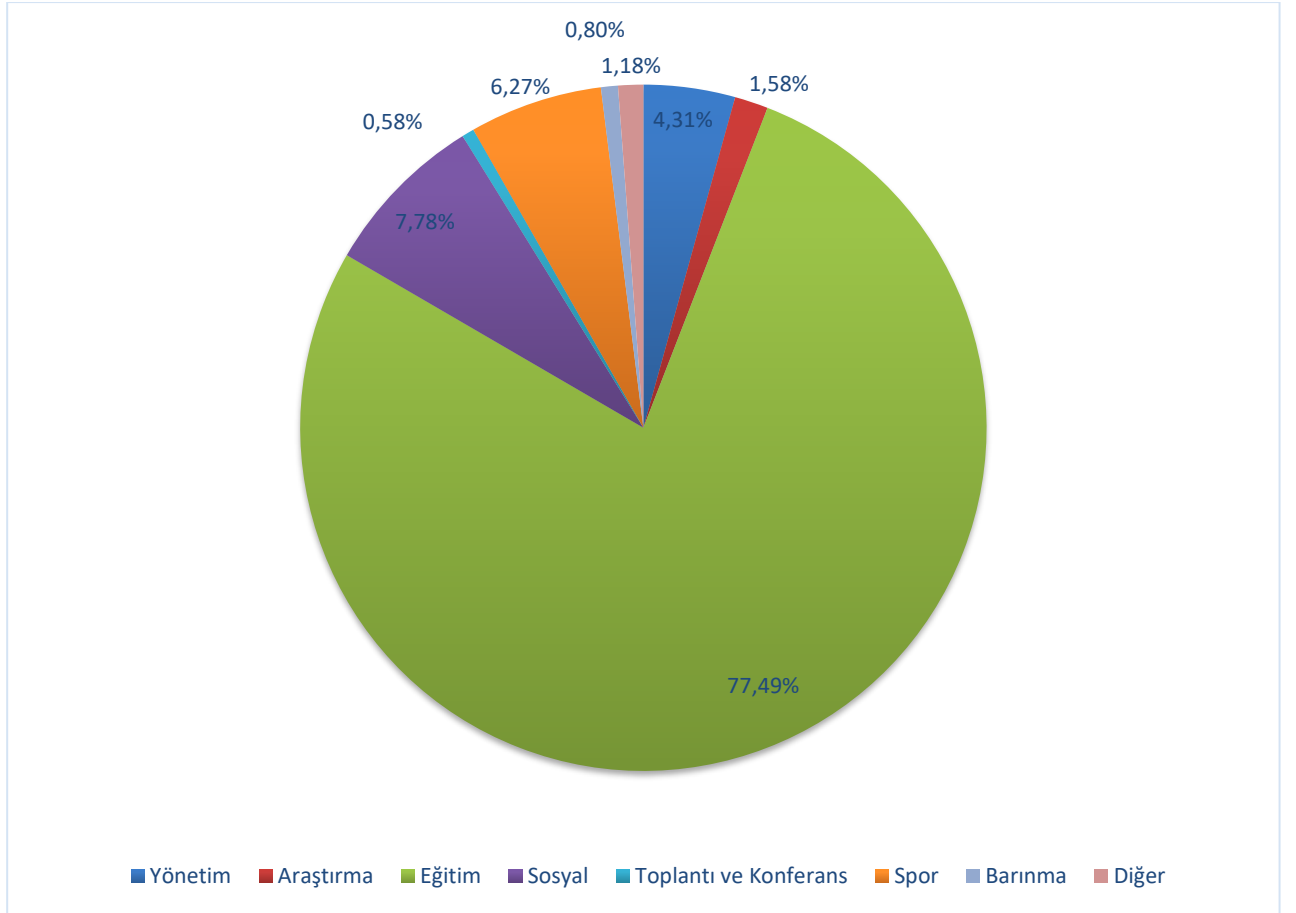

Grafik 2: Kapalı Alanların Hizmet Alanları İtibarıyla Dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı ve kapalı mekanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Yerleşke	Bina Adı	Birim	Brüt Alan	Fonksiyon
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Meslek Yüksekokulu	Ermenek Meslek Yüksekokulu	4.325	Eğitim Alanları
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Atölye	Ermenek Meslek Yüksekokulu	1.638	Eğitim Alanları

Yerleşke	Bina Adı	Birim	Brüt Alan	Fonksiyon
Ermenek Yerleşkesi	Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Ermenek Uysal ve Hasan Kalan SHMYO	5.882	Eğitim Alanları
Ermenek Yerleşkesi	Depo	Ermenek Meslek Yüksekokulu	150	Diğer Alanlar
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	7.000	Eğitim Alanları
Kazım Karabekir Yerleşkesi	Konferans Salonu	Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	1.158	Toplantı ve Konferans Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi	Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi	12.000	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Amfi A Blok Yunus Emre Kültür Evi	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	533	Sosyal Alanlar
Yunus Emre Yerleşkesi	Amfi Tiyatro B Blok Depolar	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.073	Sosyal Alanlar
Yunus Emre Yerleşkesi	KMÜ Yemekhane	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	13.000	Sosyal Alanlar
Yunus Emre Yerleşkesi	Bilgi İşlem / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	3.652	Yönetim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Isı Merkezi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.055	Diğer Alanlar
Yunus Emre Yerleşkesi	Rektörlük	Rektörlük	5.000	Yönetim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Rektörlük Konutu	Özel Kalem (Rektörlük)	473	Barınma Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Edebiyat Fakültesi	Edebiyat Fakültesi	17.420	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Eğitim Fakültesi	Eğitim Fakültesi	8.480	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	4.635	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Merkezi Laboratuvar	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	3.170	Araştırma Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Mühendislik Fakültesi	Mühendislik Fakültesi	20.435	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.600	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Spor Bilimleri Fakültesi	Spor Bilimleri Fakültesi	9.270	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Spor Salonu	Spor Bilimleri Fakültesi	7.500	Spor Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Spor Bilimleri Fakültesi	5.082	Spor Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	13.700	Eğitim Alanları

Yerleşke	Bina Adı	Birim	Brüt Alan	Fonksiyon
Yunus Emre Yerleşkesi	İlahiyat Fakültesi	İlahiyat Fakültesi	8.350	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	3.615	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	B Blok Makine Otomotiv Atölyesi	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	3.367	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	A Blok Halıcılık Seramik Atölyesi	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	3.798	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Sosyal Bilimler MYO ve Uygulama Fak.	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	6.640	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Uygulama Oteli	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	1.130	Barınma Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Tıp Fakültesi	Tıp Fakültesi	10.765	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Kütüphane	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	10.500	Eğitim Alanları
Yunus Emre Yerleşkesi	Hazırlık Binası (Wc+Duş)	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	164	Diğer Alanlar
<b>TOPLAM</b>			<b>200.560</b>	

Çizelge 11: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m<sup>2</sup>)

## 2.8. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

### 2.8.1. Hedeflenen

✓ Üniversitemiz 2025 Yılı Yatırım Programı'nda eğitim sektöründe altı, sağlık sektöründe bir ve DKH-Sosyal sektöründe bir adet proje yer almaktadır. Öncelikle 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda Tıp Fakültesi, Ahmet KELEŞOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere diğer fakültelerin eğitim öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan makine teçhizatın alınması ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından alt yapı ve çevre düzenlemesi yapım işi hedeflenmiştir. Ayrıca Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayım ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması da hedeflenmiştir.

### 2.8.2. Gerçekleşen

2025 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

1. Sağlık alanındaki birimler başta olmak üzere Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları. (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar)
2. Bilgi işlem altyapısının güçlendirilebilmesi amacıyla anahtarlama cihazı (switch) alımı,
3. Altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ile iş makinesi kiralama hizmeti, kamyon kiralama hizmeti alımı, renkli ağaç yongası, renkli dekoratif dere taşı, beton pinpon ve satranç masası alımları,
4. Kurakçıl Peyzaj Düzenleme mal alımı işi (Yıl içerisinde yapılan ihale sonucu alınan malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından.)
5. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlanarak mevzuata uygun olarak uygulanması işi,
6. Fortimail güvenlik yazılımı, santral ses kayıt programı yazılımı, ıp abone lisans alımı, güvenlik duvarı lisansı, güvenlik kamerası yazılımı kanal lisansı, kimlik yönetim yazılımı alımları,
7. 2025 yılı içerisinde elektronik veri tabanı (TURCADEMY, Lexpera, eOsmanlıca, SOBİAD vb.) ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar,
8. Spor salonları, laboratuvarlar ve asansör sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiş; bu kapsamda mevcut tesislerin kullanım ömrü uzatılmış, güvenlik standartları iyileştirilmiş ve hizmet kalitesinin artırılması sağlanmıştır. Ayrıca, ilgili alanlarda yapılan periyodik kontroller ve teknik iyileştirmeler ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunulmuştur
9. İhtisaslaşma projesi kapsamında Yenilikçi İşleme Teknolojileri ve Hassas Tarım Uygulamaları projelerinin özel hesaplarına toplam 10.000.000,00 TL aktarılmıştır.

---

### **2.8.3. Devam Edenler**

Üniversitemizde 2025 yılı itibarıyla devam eden projeler kapsamında 2010H05-1269 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi içinde yer alan Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu yapım işi, 2009H03-1057 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesi içinde yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli yapım işi olmak üzere toplam üç adet proje mevcuttur. Bu projelerden Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu ile Uygulama Oteli için 2025 yılı için herhangi bir ödenek tahsis edilmemiş olup bu projeler iz ödenek bedeli ile takip edilmektedir. Bu projelere ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

✓ Tıp Fakültesi morfoloji binası yapım işi için 05.12.2022, 06.04.2023 ve 20.12.2023 tarihlerinde ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 05.07.2024 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmış ve 14.08.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2025 yılı içerisinde 217.213.819,30 TL harcama yapılmış olup 2025 yılı aralık ayı içerisinde geçici kabulünün yapılması ve işin süre uzatımı ile 22.05.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

✓ 2018 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak son dört yıldır yatırım için izin verilmeyen Ermenek 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu işinin izin verilmesi ve gerekli kaynak tahsisinin sağlanması halinde 2026 yılında yapılması öngörülmektedir.

✓ 2018 yılı yatırım programına alınan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. İlgili projeye yatırım izni verilmemekle birlikte Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.

## 2.9. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları


### 2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 228.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 323.589.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 307.841.629,26 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı %95,13'tür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir

Bütçe Tertibi	KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.01	63.500.000,00	360.000,00	12.200.000,00	51.660.000,00	45.972.855,25
06.03	3.000.000,00	1.673.000,00	1.348.000,00	3.325.000,00	3.144.700,21
06.05	130.501.000,00	106.015.000,00	3.106.000,00	233.410.000,00	232.341.265,38
06.06	5.000.000,00	1.096.950,00	1.601.950,00	4.495.000,00	3.260.124,78
06.07	15.999.000,00	12.374.500,00	2.674.500,00	25.699.000,00	23.122.683,64
06.09	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Bütçe Tertibi	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
<b>Toplam</b>	<b>228.000.000,00</b>	<b>121.519.450,00</b>	<b>25.930.450,00</b>	<b>323.589.000,00</b>	<b>307.841.629,26</b>

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı

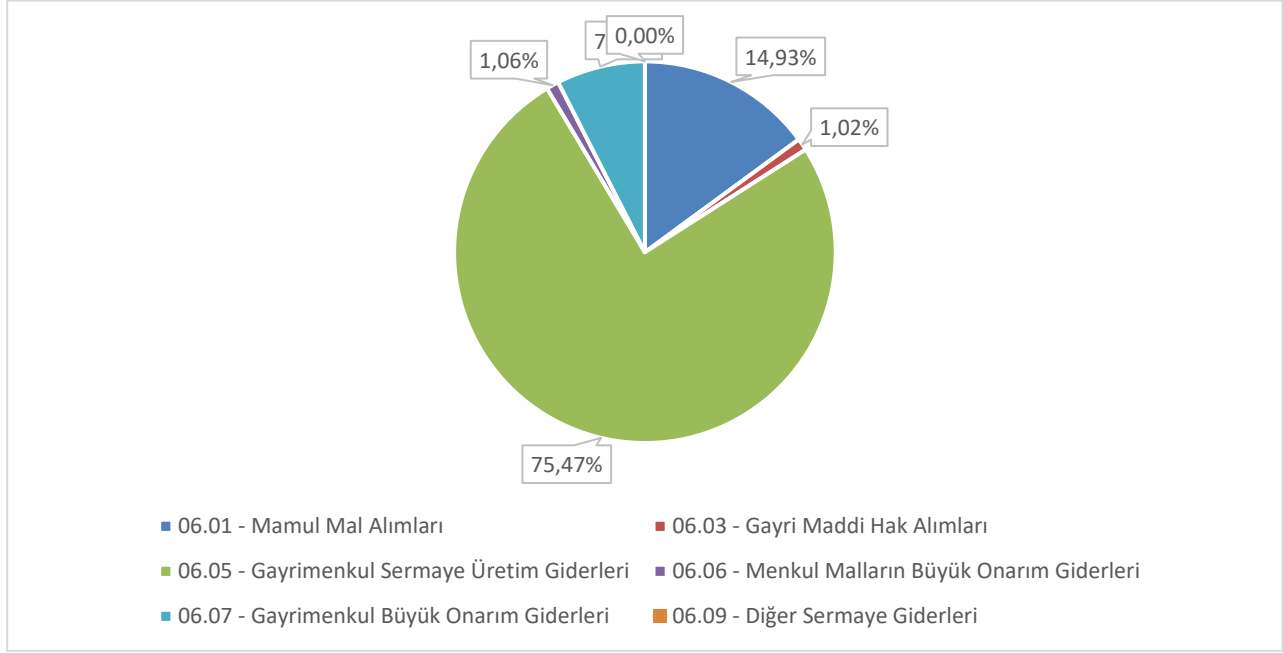

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

## 06.01 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 63.500.000,00 TL olan 06.01 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 360.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 12.200.000,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 51.660.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258333 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 38.359.993,75 TL, 2025I00-248129 nolu Muhtelif İşler-Sağlık Projesi kapsamında 4.812.866,66 TL ve 2025H03-258331 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında 2.799.994,84 TL harcama yapılmıştır. Bu üç projenin toplam harcaması 45.972.855,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %88,99'dur. 06.01 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.01.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	2025H03-258333	Muhtelif İşler	870.347,80
06.01.10.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Mefruşatı Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	2.530,80
06.01.10.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	1.294.641,22

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.01.10.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hastane Mefruşatı Alımları	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	417.054,00
06.01.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	2025H03-258333	Muhtelif İşler	1.720.871,79
<b>06.01.10</b>	<b>Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları</b>				<b>4.305.445,61</b>
06.01.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	154.793,28
06.01.20.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	2025H03-258333	Muhtelif İşler	461.500,00
06.01.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	1.270.500,00
06.01.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	2025H03-258333	Muhtelif İşler	8.551.748,50
06.01.20.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	28.000,00
06.01.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	2.367.719,01
06.01.20.90	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	2025H03-258333	Muhtelif İşler	7.035.629,18
<b>06.01.20</b>	<b>Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları</b>				<b>19.869.889,97</b>
06.01.30.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Atölye Gereçleri Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	98.000,00
06.01.30.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	3.508.656,00
06.01.30.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Zirai Gereç Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	31.900,00
<b>06.01.30</b>	<b>Avadanlık Alımları</b>				<b>3.638.556,00</b>
06.01.40.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	6.930.831,00
<b>06.01.40</b>	<b>Taşıtı Alımları</b>				<b>6.930.831,00</b>
06.01.60.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın ve Alımları ve Yapımları	2025H03-258331	Yayın Alımı	266.000,00
06.01.60.03	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	2025H03-258331	Yayın Alımı	2.533.994,84
<b>06.01.60</b>	<b>Yayın Alımları ve Yapımları</b>				<b>2.799.994,84</b>
06.01.80.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Güvenlik Donanımı Cihazları Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	51.995,90
06.01.80.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	677.507,59
06.01.80.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	1.583.551,72

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.01.80.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	497.140,06
06.01.80.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	5.617.942,56
06.01.80	<b>Bilişim Donanım Alımları</b>				<b>8.428.137,83</b>
06.01	<b>Mamul Mal Alımları</b>				<b>45.972.855,25</b>

Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

### 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL olan 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde 1.673.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 1.348.000,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 3.325.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258333 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 3.144.700,21 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %94,58'dir. 06.03 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.03.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	1.315.600,00
06.03.10	<b>Bilgisayar Yazılım Alımları ve Geliştirme Giderleri</b>				<b>1.315.600,00</b>
06.03.30.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Güvenlik Lisans Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	338.247,00
06.03.30.03	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güvenlik Lisans Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	1.067.525,21
06.03.30.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Lisans Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	145.328,00
06.03.30	<b>Lisans Alımları</b>				<b>1.551.100,21</b>
06.03.90.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Diğer Fikri Hak Alımları	2025H03-258333	Muhtelif İşler	278.000,00
06.03.90	<b>Diğer Fikri Hak Alımları</b>				<b>278.000,00</b>
06.03	<b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>				<b>3.144.700,21</b>

Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 130.501.000,00 TL olan 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 106.015.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 3.106.000,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 233.410.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258323 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 30.000,00 TL, 2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 15.097.446,08 TL, 2009H03-1057 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası kapsamında 217.213.819,30 TL olmak üzere toplamda 232.341.265,38 TL harcama yapılmış olup toplam harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %99,54'tür. 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.05.10.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	2025H03-258323	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	30.000,00
06.05.10	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				30.000,00
06.05.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	2023H03-212700	Kampüs Altyapısı	468.792,00
06.05.20	Malzeme Giderleri				468.792,00
06.05.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2023H03-212700	Kampüs Altyapısı	13.761.600,00
06.05.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2023H03-212700	Kampüs Altyapısı	867.054,08
06.05.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2009H03-1057-187482	Morfoloji Binası	217.213.819,30
06.05.90	Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				231.842.473,38
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				232.341.265,38

Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olan 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 1.096.950,00 TL ödenek eklenmiş ve 1.601.950,00 TL düşürülmüş olup toplam ödenek 4.495.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258333 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında

2.455.140,78 TL, 2025I00-248129 nolu Muhtelif İşler Sağlık Projesi kapsamında 804.984,00 TL olmak üzere toplamda 3.260.124,78 TL harcama yapılmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %72,52'dir. 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.06.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	360.000,00
06.06.20	<b>Malzeme Giderleri</b>				<b>360.000,00</b>
06.06.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	959.436,00
06.06.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	649.396,80
06.06.90.01	Kâmil Özdağ Fen Fakültesi	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	115.000,00
06.06.90.01	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	371.307,98
06.06.90.01	Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	804.984,00
06.06.90	<b>Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri</b>				<b>2.900.124,78</b>
06.06	<b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>				<b>3.260.124,78</b>

Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)

### 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 15.999.000,00 TL olan 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 12.374.500,00 TL ödenek eklenmiş ve 2.674.500,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 25.699.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258333 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 19.470.365,85 TL, 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 3.648.073,79 TL, 2025I00-248129 nolu Muhtelif İşler Sağlık Projesi kapsamında 133.844,00 TL olmak üzere toplamda 23.122.683,64 TL harcama yapılmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine

göre oranı %89,98'dir. 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
06.07.10.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	2010H05-1269-212942	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	60.000,00
<b>06.07.10</b>	<b>Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler</b>				<b>60.000,00</b>
06.07.20.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İnşaat Malzemesi Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	527.938,80
06.07.20.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İnşaat Malzemesi Giderleri	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	90.078,00
06.07.20.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Elektrik Tesisatı Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	434.628,62
06.07.20.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Elektrik Tesisatı Giderleri	2010H05-1269-212942	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	33.601,44
06.07.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Malzeme Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	2.692.739,36
06.07.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Malzeme Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	749.460,00
<b>06.07.20</b>	<b>Malzeme Giderleri</b>				<b>4.528.446,22</b>
06.07.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	2010H05-1269-212942	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	129.600,00
06.07.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	2010H05-1269-212942	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.755.272,35
06.07.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	2025I00-248129	Muhtelif İşler Sağlık	43.766,00
06.07.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	11.334.650,27
<b>06.07.70</b>	<b>Müteahhitlik Giderleri</b>				<b>14.263.288,62</b>
06.07.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2025H03-258333	Muhtelif İşler	3.730.948,80
06.07.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Gayrimenkul	2010H05-1269-212942	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	540.000,00

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
		Büyük Onarım Giderleri			
<b>06.07.90</b>		<b>Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</b>			<b>4.270.948,80</b>
<b>06.07</b>		<b>Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</b>			<b>23.122.683,64</b>

Çizelge 17: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.09 Diğer Sermaye Giderleri

Başlangıç ödeneği 10.000.000,00 TL olan 06.09 Diğer Sermaye Giderleri için yıl içinde 5.000.000,00 TL ödenek düşülmüştür. 2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesi kapsamında harcama yapılmamıştır.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Proje No	Projenin Adı	Harcama Tutarı (TL)
<b>06.09.90.01</b>	Rektörlük (Özel Kalem)	Diğer Sermaye Giderleri	2023K12-214484	İhtisaslaşma Projesi	0,00
<b>06.09.90</b>		<b>Diğer Sermaye Giderleri</b>			<b>0,00</b>
<b>06.09</b>		<b>Diğer Sermaye Giderleri</b>			<b>0,00</b>

Çizelge 18: Diğer Sermaye Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 2.9.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-20 ile 27*'de yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'te gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2025H03-258323
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2025-2025
2025 Yılı Yatırımı TL	1.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	800.000,00
Proje Tutarı TL	200.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	200.000,00

Çizelge 19: Revizyon (2025H03-258323 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

2025H03-258323 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, tasarruf tedbirleri doğrultusunda 800.000,00 TL tutarında ödenek kesintisi yapılmıştır. Söz konusu tutarın daha sonra 2009H03-1057-187482 nolu Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesine aktarılması nedeniyle, ilgili projede yıl sonu itibarıyla gerçekleşme oranı düşük seviyede kalmıştır.

2025H03-258333 nolu Muhtelif İşler (Eğitim) Projesinden tasarruf tedbirleri kapsamında 1.000.000,00 TL tutarında kesinti yapılmış olup söz konusu tutar daha sonra 2009H03-1057-187482 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesine aktarılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2025H03-258333
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2025-2025
2025 Yılı Yatırımı TL	66.500.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	15.504.450,00
Düşülen TL	16.324.450,00
Proje Tutarı TL	65.680.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	65.680.000,00

Çizelge 20: Revizyon (2025H03-258333 Nolu Muhtelif İşler)

2025H03-258331 nolu Yayın Alımı Projesinden tasarruf tedbirleri kapsamında 200.000,00 TL tutarında kesinti yapılmış olup söz konusu tutar daha sonra 2009H03-1057-187482 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesine aktarılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2025H03-258331
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2025-2025
2025 Yılı Yatırımı TL	3.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	200.000,00
Proje Tutarı TL	2.800.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	2.800.000,00

Çizelge 21: Revizyon (2025H03-258331 Nolu Yayın Alımı)

2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı Projesinden tasarruf tedbirleri kapsamında 2.126.000,00 TL tutarında kesinti yapılmış olup söz konusu tutar daha sonra 2009H03-1057-187482 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesine aktarılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2023H03-212700
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2023-2025
2025 Yılı Yatırımı TL	18.300.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	2.306.000,00
Proje Tutarı TL	39.794.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	15.994.000,00

Çizelge 22: Revizyon (2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı)

2025H03-258323 nolu eřitli nitelerin Etüt Projesinden 800.000,00 TL, 2025H03-258333 nolu Muhtelif İşler (Eđitim) Projesinden 1.000.000,00 TL, 2025H03-258331 nolu Yayın Alımı Projesinden 200.000,00 TL, 2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı Projesinden 2.126.000,00 TL, 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden 1.300.000,00 TL ve 2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesinden 5.000.000,00 TL olmak üzere tasarruf tedbirleri kapsamında toplam 10.426.000,00 TL, 2009H03-1057 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında yer alan 2009H03-1057-187482 nolu Tıp Fakóltesi Morfoloji Binası projesine aktarılmıştır. Bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan finansmanın 84.000.000,00 TL tutarındaki kısmı yedek ödenekten yapılan aktarma ile 11.589.000,00 TL tutarındaki kısmı ise likit karşılığı ödenek eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H03-1057
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2025
2025 Yılı Yatırımı TL	111.200.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	106.015.000,00
Düşülen TL	0,00
Proje Tutarı TL	557.000.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	217.215.000,00

izelge 23: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)

2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden tasarruf tedbirleri kapsamında 1.300.000,00 TL tutarında kesinti yapılmış olup söz konusu tutar daha sonra 2009H03-1057-187482 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesine aktarılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H05-1269
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2025
2025 Yılı Yatırımı TL	5.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	1.300.000,00
Proje Tutarı TL	10.198.100,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	3.700.000,00

Çizelge 24: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)


Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2025I00-248129
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2025-2025
2025 Yılı Yatırımı TL	13.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Proje Tutarı TL	13.000.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	13.000.000,00

Çizelge 25: Revizyon (2025I00-248129 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler)

2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesinden tasarruf tedbirleri kapsamında 2023K12-214484-216864 Hassas Tarım Uygulamaları projesinden 2.500.000,00 TL ve 2023K12-214484-216865 Yenilikçi İşleme Teknolojileri projesinden 2.500.000,00 TL olmak üzere 5.000.000,00 TL tutarında kesinti yapılmış olup söz konusu tutar daha sonra 2009H03-1057-187482 nolu Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesine aktarılmıştır.

Sektörü	DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2023K12-214484
Proje Adı	İhtisaslaşma Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2023-2027
2025 Yılı Yatırımı TL	10.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	5.000.000,00
Proje Tutarı TL	54.472.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	5.000.000,00

Çizelge 26: Revizyon (2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi)

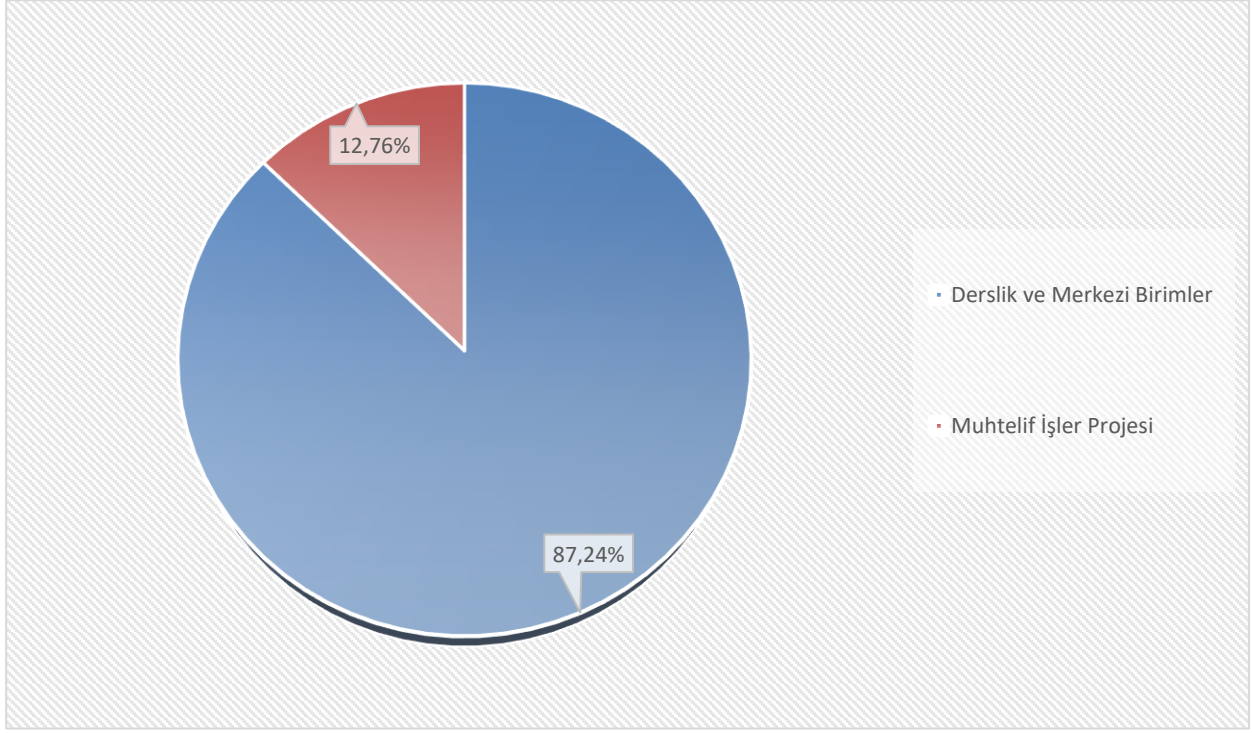

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı (Ödenek Eklemesi Yapılanlar)

### 2.9.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması, ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca projenin uygulanması aşamasında sürekli artan fiyatlar nedeniyle yükleniciler zor durumda kalmaktadır.
- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının da etkisi ile proje revizyonları daha uzun sürmektedir.
- Kesin teminatın iadesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ihale mevzuatı gereğince geçici kabul yapıldıktan sonra kesin teminatın yarısının iade edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun'a göre kesin teminatın yarısının iadesinde ilişiksiz belgesi aranmamakta, Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı Kanun'a göre ilişiksiz belgesi düzenlenmeden kesin teminatın yarısının iadesinin yapılamayacağı belirtilmekte olup SGK tarafından ilişiksiz belgesi düzenlenebilmesi için işe ait kesin hakediş tutarı istenilmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kesin hakediş tutarı, kesin kabul aşamasında kesin hakediş raporu ile tespit edilmektedir. Geçici kabul işleminden sonra işin kesin, hakediş tutarı belli olmadığı için kesin teminatın yarısının iadesi mümkün olmamaktadır.

### 3. Proje Uygulamaları

#### 3.1. 2025H03-258323 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2025 yılı bütçemize 1.000.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. 2025H03-258323 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2025
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.000.000,00
Eklenen- Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	800.000,00
Toplam Ödenek TL	200.000,00
Harcama TL	30.000,00
Kalan Ödenek TL	170.000,00
Gerçekleşme Oranı %	15,00

Çizelge 27: 2025H03-258323 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2025H03-258323 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, tasarruf tedbirleri doğrultusunda 800.000,00 TL tutarında ödenek kesintisi yapılmıştır. Söz konusu tutarın daha sonra 2009H03-1057-187482 nolu Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesine aktarılması nedeniyle ilgili projede yıl sonu itibarıyla gerçekleşme oranı düşük seviyede kalmıştır.

### 3.2. 2025H03-258333 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 66.500.000,00 TL'dir. 2025H03-258333 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları ve cihazların bakım onarımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2025
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	65.680.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	66.500.000,00
Eklenen- Aktarılan TL	15.504.450,00
Düşülen TL	16.324.450,00
Toplam Ödenek TL	65.680.000,00
Harcama TL	63.430.200,59
Kalan Ödenek TL	2.191.749,41
Gerçekleşme Oranı %	96,57

Çizelge 28: 2025H03-258333 Nolu Muhtelif İşler Projesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Güvenlik Monitörü	37.775,67
Klima	306.636,00
Sehpa	11.566,28
Switch	155.094,36
Tabure	73.412,90
Klinik Beceri Laboratuvarı malzemeleri	1.597.200,00
İp Abone Lisans Alımı (50 Kullanıcılı ve Mevcut Santrale Uyumlu)	27.600,00
Dolap, Masa, Tezgâh Alımı (Meslek Lisesi)	217.998,00
Güvenlik Kamerası	230.102,79
Arıza Tespit Cihazı	89.000,00
Fizik Bölümünün ARGE Laboratuvar Kurulumu için İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımı	287.369,80
Kitaplık	27.917,21
Koltuk	7.163,06
Sahne Platformu	54.999,92
Madalya Kürsüsü	9.592,00
Şovalye (Metal)	288.000,00
Ekran Kartı	84.240,00
Konferans Sandalyesi	348.962,90
Ağır Yük Rafı	453.743,19
TV, Güvenlik Monitörü ve Klima Alımı	184.140,70
Çapa Makinesi Alımı (Balsüzen Makina)	31.900,00
Büst Alımı	30.000,00
Pilates Malzemesi Alımı	120.000,00
Robotik ve Yazılım Atölyesi Eğitim Seti	550.440,00
Yaprak Üfleme Makinası ve Akülü Dal Budama Makinası	150.000,00
Dizüstü Bilgisayar	68.890,99
Maket, Simülatör Cihaz ve Sarf Malzeme Alımı	551.798,50
Eğitim Seti Alımı	154.980,00
Otomatik Bariyer Sistemi Alımı	120.000,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Yangın Söndürme Cihazları Dolumu ve Alımı	63.480,00
Switch ile Omurga (Backbone) Alımı	664.988,92
Video ve Fotoğraf Ekipmanı Alımı	319.200,00
Kimlik Yönetim Yazılımı Alımı	338.247,00
Barkod Yazıcı ve Güvenlik Kamerası	70.553,28
Laboratuvar Cihazı Alımı	630.000,00
Mikro Plaka ve Küvet Okuyucu Alımı	778.800,00
Çekme Basma Test Cihazı Alımı	1.518.000,00
Dijital Duvar Piyanosu Alımı	92.988,00
Klima Alımı	33.501,60
Vücut Analiz Cihazı Alımı	1.321.056,00
Dizüstü Bilgisayar Alımı	116.445,65
Tümleşik Bilgisayar, Monitör ve Projeksiyon Cihazı Alımı	1.985.829,20
Bilgisayar Masası ve Toplantı Masası Alımı	144.980,00
Laboratuvar Tezgâh Alımı	317.710,08
Tıbbi Cihaz Alımı	149.500,00
Dijital Palpasyon Cihazı Alımı	512.160,00
Tam Boy Turnike Alım İşİ	204.000,00
Ferforje Kapınının Satın Alım İşİ	240.012,00
Dolap, Masa ve Tezgâh Alımı	220.000,00
Mikroskop Alımı	110.000,00
Hasta Sedyesi ve Masaüstü Kardiyo Pulmoner Egzersiz Cihazı Alımı	689.700,00
Temizlik Otomat Alımı	266.332,16
Togg Taşıt Alımı	2.336.115,00
Bilgisayar Donanım Malzemesi Alımı	3.801.600,00
Kart Yazıcısı Alımı	120.000,00
Monitör ve Sandalye Alımı	539.139,00
Kolçaklı Sandalye Alımı	175.275,87
Çelik Raf Alımı	244.252,60
Akıllı Kütüphane Sistemi Alımı	3.102.726,00
Kantatif Termal Duyu Cihazı Alımı	1.557.600,00
Rat Beyin Mikro İnfüzyon Sistemi	2.094.840,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutar (TL)
Laboratuvar Malzemesi	699.600,00
Dijital Siyah Beyaz Fotokopi Makinesi ve Teçhizatı Alımı	594.000,00
Klima ve Taşınabilir Bilgisayar Alım	56.575,20
Binicisiz Yer Temizleme Makinesi ve Lazer Yazıcı Alımı	211.067,37
Anahtarlama Cihazı	68.517,58
Ses Sistemi Alımı	180.000,00
Tarayıcı ve Fotokopi Makinesi	319.200,00
Malzeme Alımı	17.280,00
Dondurulmuş Ayak Bilek Kadavrası Alımı	590.400,00
Hidrostatik Tip Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Makinası	4.594.716,00
Klima ve Taşınabilir Bilgisayar Alımı	35.738,77
Mal/Malzeme Alımı	23.640,00
Diploma Belgesi, Transkript Belgesi, Öğrenci Belgesi, Görevlendirme Belgesi ve İzin Evrakı Entegrasyonu Alımı	288.000,00
Akreditasyon Uyum ve Raporlama İşlemleri Modülü- Yabancı Uyruklu Başvuru ve Otomatik Değerlendirme Yerleştirme Modülü Sosyal Transkrip On-Line Başvuru Değerlendirme Modülü Alımı	1.000.000,00
E-Reçete Uygulaması	45.000,00
Santral Ses Kayıt Programı Yazılımı	77.000,00
İlave Varlık Tanımlayıcı Kullanıcı Lisans	23.328,00
Otomatik Kapılar İçin Yedek Parçalar ve Togg Şarj Cihazı Alımı	96.000,00
Yer Temizleme Makineleri Yedek Parça Alımı	264.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>41.170.084,75</b>

Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Bilimsel ve Teknolojik Arařtırmalar Uygulama ve Arařtırma Merkezi tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan işler ařağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Sıvı Azot Cihazı Bakım Onarımı	99.600,00
Xerox 5330 Fotokopi Makinesi Bakım Onarım	16.500,00
ICP-OES Cihazı Bakım Onarımı	40.166,40
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (AAS) Cihazı Bakım ve Onarımı	43.350,00
SEM Cihazı Bakım Onarımı	171.691,58
<b>TOPLAM</b>	<b>371.307,98</b>

Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM)

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
2025 Incites Api veritabanı Ödemesi	278.000,00
Fortimail Güvenlik Yazılım Alımı	1.067.525,21
Kimya Laboratuvarı Bakım Onarım	115.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.460.525,21</b>

Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Kütüphane ve Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kamil Özdağ Fen Fakültesi)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler ařağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
2025 Yılı Asansör Periyodik Bakım Hizmeti	1.079.998,80
Atölye Gereçleri ve Makine Teçhizat Alımları	308.520,00
Ups Cihazı Sürücü Kartı	24.120,00
Çevre Duvarı Jiletli Tel Yapım İşİ	318.000,00
Asansör Parça Alımı	312.960,00
2025/423639 İkn 2025 Yılı Mal Alımı İhalesi (İnşaat Malzemeleri)	4.140.749,98
Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) 2025 Yılı Periyodik Bakım ve Onarımı	132.000,00
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi İçin Bakım ve Onarım Hizmet Alım	276.000,00
Asansörün Mavi Etiketlendirilmesi Yapım İşİ	289.980,00
2025 Yılı GES Periyodik Bakım Hizmet Alım	100.800,00
Chilleri Periyodik Bakım Hizmet Alımı	79.200,00
2025 Yılı Bakım Onarım İşİ (1 Nolu Hakediş Ödemesi)	8.343.466,76

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
İnverter Tamirat Hizmet Alım İşİ	240.000,00
2025 Yılı Bakım Onarım İşİ 2 Nolu Hakediş Ödemesi	2.275.798,91
Asansör Parçaları İçin Mal Alımı	293.640,00
GES Og Hattı Arızasının Giderilmesi ve Bakım Onarım	36.000,00
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Bakım ve Onarımı	24.000,00
Jeneratör Periyodik Bakım	153.600,00
UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları) Bakım	236.476,80
Sihhi Tesisat Mal Alımı	264.016,80
2025 Yılı Bakım Onarım İşİ 3 Nolu Hakediş	715.384,60
İnşaat Mal Malzeme Alımı	193.110,00
Asansörlerin Yedek Parça Alımı	245.040,00
Asansörü Revizyonu	201.000,00
Doğrama İmalatları Bakım Onarım	144.420,00
<b>TOPLAM</b>	<b>20.428.282,65</b>

Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

### 3.2.1 2025 Yılı Asansör Periyodik Bakım İşi

Üniversitemiz 2025 yılı asansör periyodik bakım işinin 899.999,00 TL (KDV hariç) bedel ile ihalesi yapılmış ve 2025 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 2025 Yılı Asansör Periyodik Bakım İşi
Proje Numarası	2025H03-258333
İhale Tarihi	03.01.2025
Sözleşme Tarihi	16.01.2025
Sözleşme Bedeli TL	899.999,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	17.01.2025
Fiilen İşe Başlama Tarihi	17.01.2025
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	15.12.2025
2025 Yılı Harcama Tutarı	1.079.998,80 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.079.998,80 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 33: 2025 Yılı Asansör Aylık Periyodik Bakım İşi İhale Bilgileri

### 3.2.2 2025 Yılı Bakım Onarım İşi

2025 yılı bakım ve onarım işi, toplam 12.495.000,00 TL (KDV hariç) bedel üzerinden ihale edilmiş olup söz konusu ihale 3 farklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ihalenin Muhtelif İşler (Eğitim) projesine ilişkin bakım ve onarım çalışmalarına ayrılan kısma ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 2025 Yılı Bakım Onarım İşi
Proje Numarası	2025H03-258333
İhale Tarihi	20.06.2025
Sözleşme Tarihi	14.07.2025
Sözleşme Bedeli TL	12.495.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	17.07.2025
Fiilen İşe Başlama Tarihi	17.07.2025
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	27.09.2025
2025 Yılı Harcama Tutarı	10.532.774,13 TL
Toplam Harcama Tutarı	10.532.774,13 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 34: 2025 Yılı Bakım Onarım İşi İhale Bilgileri (Muhtelif İşler)



Resim 1: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 2: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 3: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 4: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 5: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 6: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler

### 3.3. 2025I00-248129 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 13.000.000,00 TL'dir. Harcama 5.751.694,66 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025I00-248129 nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Makine Teçhizat, Büyük Onarım
Proje Başlama Yılı	2025
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	13.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	13.000.000,00
Eklenen - Aktarılan TL	0,00
Yedeğe Aktarma TL	0,00
Toplam Ödenek TL	13.000.000,00
Harcama TL	5.751.694,66
Kalan Ödenek TL	6.248.305,34
Gerçekleşme Oranı %	44,24

Çizelge 35: 2025I00-248129 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların büyük bir kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olup Devlet Malzeme Ofisi (DMO) sürecindeki ihale işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle ödemeler bir sonraki yıla devretmiş; bu durum gerçekleşme oranının düşük kalmasına yol açmıştır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Diş Röntgen Cihazı	69.081,86
Taşınabilir (Transport) Ünit Alımı	1.270.500,00
Ağız İçi Fosfor Plak Tarayıcı, Bilgisayar, Masaüstü Buhar Sterilizatörü	669.482,72
Dijital Panoramik Röntgen Cihazı Alımı	1.629.154,43
Ağız İçi Fosfor Plak Tarayıcı, Bilgisayar, Masaüstü Buhar Sterilizatörü	624.321,81
Projeksiyon Cihazı, Taşınabilir Bilgisayar, Monitör, Lazer Yazıcı	53.185,78
Projeksiyon Cihazı, Taşınabilir Bilgisayar, Monitör, Lazer Yazıcı	497.140,06
<b>Toplam</b>	<b>4.812.866,66</b>

Çizelge 36: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Sağlık Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Bakım Onarım Kapsamında Mal Alım İşİ	90.078,00
2025 Yılı Bakım Onarım İşİ	43.766,00
<b>Toplam</b>	<b>133.844,00</b>

Çizelge 37: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Acil Kod Sistemi Bakım Onarımı	90.000,00
Fantom Laboratuvarı Bakım Onarımı	30.000,00
Sterilizasyon Cihazlarının Bakım-Onarımı	288.000,00
Su Regülatörü, Vakum Filtresi ve Kompresör Filtresi Bakım Onarımı	312.840,00
Cihazın Kalibrasyonu Hizmeti	84.144,00
<b>Toplam</b>	<b>804.984,00</b>

Çizelge 38: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi)



Resim 7: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 8: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 9: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alınmış Yapılan Malzemeler



Resim 10: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alınmış Yapılan Malzemeler

### 3.4. 2025H03-258331 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. Toplam ödenek 2.800.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama ise 2.799.994,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %98,45 olarak gerçekleşmiştir.

2025H03-258331 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2025
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	2.800.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	3.000.000,00
Eklenen- Aktarılan TL	0,00
Düşülen TL	200.000,00
Toplam Ödenek TL	2.800.000,00
Harcama TL	2.799.994,84
Kalan Ödenek TL	5,16
Gerçekleşme Oranı %	100,00

Çizelge 39: 2025H03-258331 Nolu Yayın Alımı Projesi

2025H03-258331 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Alımı Yapılan Basılı ve Elektronik Yayınlar	Tutarı (TL)
Turcademy Veritabanı	372.609,11
Basılı Yayın Ödemesi	266.000,00
2025 Incites Api Veritabanı Ödemesi	667.360,36
Vetis Online Veritabanı	180.000,00
2025 Uptodate Veritabanı	348.555,37
İdeal Online Süreli Yayın Ve Tıp Kitapları Veri Tabanı	228.000,00
E-Osmanlıca Veritabanı	82.592,00
Sobiad Veritabanı	74.513,00
Bookcites Veritabanı	58.487,00
Piri AI Veritabanı	73.200,00
Piri Keşif Veritabanı	158.238,00
Lexpera Hukuk Veritabanı	45.000,00
2025 Elektronik Kitap Alımı	245.440,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.799.994,84</b>

Çizelge 40: 2025H03-258331 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **TURCADEMY Elektronik veri Tabanı**

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademik ve idari personel ile öğrencilerimize kolay bir şekilde ulaştırılan yerli bir e-kitap platformudur.

Akademik bilgiye ve üniversitelerde kullanılan teknolojinin kullanımına odaklanmış bir eğitim platformudur. Eğitimler en az lisans seviyesinde hazırlanmış ve eğitimin ileri dersleri mesleki bilgilerle donatılmıştır.

- **Vetis Online veritabanı**

Vetis, veteriner hekimliği ve hayvan sağlığı alanında akademik ve mesleki bilgi kaynakları sunan çevrim içi bir veri tabanıdır. Platformda veterinerlik bilimleri ile ilgili kitaplar, makaleler ve çeşitli akademik içerikler yer almakta olup araştırmacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin güncel bilgilere hızlı ve kolay şekilde erişmesine imkân sağlamaktadır.

- **UpToDate veri Tabanı**

Lexpera, hukuk alanında kapsamlı içerik sunan bir elektronik veri tabanıdır. Platformda mevzuat, içtihat, makale, kitap ve hukuki değerlendirmeler gibi birçok akademik ve mesleki kaynak bir arada sunulmakta olup kullanıcıların güncel hukuki bilgilere hızlı ve kolay şekilde erişmesine imkân sağlamaktadır.

- **BookCites Atıf Dizini**

Akademik kitaplar, akademik dünyada bilginin aktarılması için yapılan yayınların çok önemli bir türünü oluşturur. Çok büyük emek ve uğraşı sonucunda hazırlanan akademik kitaplarda bölüm sonlarında veya kitap sonunda kaynakçalar da yer alır. Atıf bulmak akademisyenin kendi yayınlarından yararlanan eserleri bulması anlamına gelir. Binlerce eserin taranması ve atıflar arasından araştırmacının kendi yayını bulması çok zor bir iştir.

BookCites aynı zamanda akademik bir veri tabanıdır. Kullanıcı tek arama panelinden binlerce kitap ve kitap bölümü içerisinde arama yapabilir. BookCites ile araştırmacılar açık erişimli kitapların tam metinlerine de kolaylıkla ulaşabilirler.

- **E-Osmanlıca Online Eğitim veri Tabanı**

E-Osmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "doğru/yanlış, eşleştirme, şıklı ve gördüğünü yaz vb." tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. E-Osmanlıca dersleri öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak, onları sınıftaki eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlamaktadır.

- **SOBİAD veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayımlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veri tabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilir. Sobiad, her ay düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayımlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir.

- **Piri Keşif Aracı veri Tabanı**

Arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır. Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için araştırılan konu hakkında birçok veri tabanını tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. Yapay zekâ destekli modern arama algoritmaları ile ilgili içerikleri bulmayı amaçlar.

- **LEXPERA veri Tabanı**

İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve multi-platform erişim imkânı ile LEXPERA akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yenilikçi çözümler sunmaktadır. Güncel mevzuatı, içtihadı, tam metin hukuk kitaplarını, makaleleri, kanun yorumlarını, bibliyografik bilgileri, sözleşme örneklerini ve genel internet arama sonuçlarını kapsamaktadır.

### 3.5. 2023H03-212700 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 18.300.000,00 TL'dir. Toplam harcama 15.097.446,08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %94,39'dur. 2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı, Engelsiz Üniversite
Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	39.794.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	18.300.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	2.306.000,00
Toplam Ödenek TL	15.994.000,00
Harcama TL	15.097.446,08
Kalan Ödenek TL	865.553,92
Gerçekleşme Oranı (%)	94,39

Çizelge 41: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Engelli Asansörünün Bakım Onarım	67.200,00
2025/423639 İkn 2025 Yılı Mal Alımı İhalesi (Engelsiz Malzemeleri)	468.792,00
Güvenlik Kamera Sistemlerinin Genişletilmesi ve Geliştirilmesi Yapım İşİ	318.000,00
2025 Yılı Bakım Onarım İşİ	799.854,08
2025 Yılı Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	13.443.600,00
<b>TOPLAM</b>	<b>15.097.446,08</b>

Çizelge 42: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

### 3.5.1. Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ

Üniversitemiz altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 11.203.000,00 (KDV hariç) TL bedel ile ihalesi yapılmış ve 2025 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
Proje Numarası	2023H03-212700
İhale Tarihi	09.07.2025
Sözleşme Tarihi	31.07.2025
Sözleşme Bedeli TL	11.203.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	04.08.2025
Fiilen İşe Başlama Tarihi	04.08.2025
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	14.11.2025
Süre Uzatımı ile İşin Bitim Tarihi	05.12.2025
2025 Yılı Harcama Tutarı	13.443.600,00 TL

Toplam Harcama Tutarı	13.443.600,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatin Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 43: Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhale Bilgileri



Resim 11: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Alt Yapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi



Resim 12: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Alt Yapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

### 3.5.3. Engelsiz Üniversite

Üniversitemiz bütün yerleşke alanlarında engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlamakta ve mevzuata uygun olarak uygulamaktadır. 2025 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL olup 1.335.846,08 TL harcama yapılmıştır.

### 3.6. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2025 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 111.200.000,00 TL olup toplam harcama 217.213.819,30 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,46'dır. KaYa ve e-bütçe programları arasında uyum sağlanabilmesi amacıyla 1.000,00 TL tutarında ödenek Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesinden Ermenek Spor Salonu projesine aktarılmıştır. 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m <sup>2</sup> ), Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> )
Alt Projeler	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m <sup>2</sup> ), Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> )
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	557.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	111.200.000,00
Eklenen TL	106.015.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	217.215.000,00
Harcama TL	217.213.819,30
Kalan Ödenek	180,70
Gerçekleşme Oranı (%)	100,00

Çizelge 44: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

#### 3.6.1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Üniversitemiz Tıp Fakültesinin kurulması 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14/06/2018 tarih ve 30451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanması ile kararlaştırılmıştır. 07/08/2018 tarihinde Kurucu Dekan ataması yapılarak, kuruluş süreci başlamıştır. 2019-2020 eğitim öğretim

yılında Konya Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde 31 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlayan Fakültemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Ortak Kullanım Protokolü ile Karaman Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesine dönüştürülerek afilyasyon sağlanmıştır.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Tıp fakültesi öğrencileri eğitimlerine Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi (3911 Ada 30 Parsel) içerisine Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğu cephesinde kalan alan üzerine Morfoloji Binası yapılması için çalışmalara başlanmış olup 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Teknik personelimiz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hastane ile morfoloji binasının birbiri ile entegre olacak şekilde en uygun bağlantı noktasının hastanenin doğu cephesinden sağlanabileceği tespit edilmiştir.

Söz konusu morfoloji binası içerisinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeterli bulunmayan ve hasta tanılarında önemli rol oynayan laboratuvarlar kurulması planlanmaktadır. Bu sebeple hasta için yapılacak tetkiklerin birçoğu morfoloji binası içerisinde tasarlanacak laboratuvarlarda gerçekleştirileceğinden hastane ile morfoloji binasının bütünleşik tasarlanması planlanmıştır.

Morfoloji binamızın mimari projesi öğretim üyeleri ve teknik personelimiz tarafından titizlikle hazırlanmış olup hem öğrenci hem öğretim üyeleri hem de Karaman halkının istifade edebileceği şekilde planlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanan projemiz, 2022 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun bulunarak 2022 yılı yatırım programına alınmıştır.

2022 ve 2023 yılında çıkılan 3 ihaleye istekli çıkmaması sebebiyle iptal edilen proje 2024 yılı yatırım programında yerini almış olup bu 3 teklifin yaklaşık maliyet ve proje ödeneğinin üstünde kalmasından dolayı ihale iptal edilmiştir.

Son ihalede teklif edilen bedeller de dikkate alınarak Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işinin proje maliyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 496.350.000,00 TL olarak revize

edilmiş olup buna bağılı olarak Derslik ve Merkezi Birimler Projesi de 557.000.000,00 TL olarak revize edilmiştir.

2024-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 05/07/2024 tarihinde ihale edilen 2024/753462 ihale kayıt numaralı Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için 340.800.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre bitiş tarihi 23/12/2025 olup süre uzatımı ile birlikte işin 22/05/2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Fiyat farkı ile birlikte işin toplam maliyeti 396.887.206 TL'dir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H03-1057
İhale Tarihi	05.07.2024
Sözleşme Tarihi	14.08.2024
Sözleşme Bedeli TL	284.000.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	15.08.2024
Fiilen İşe Başlama Tarihi	15.08.2024
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi	22.12.2025
Süre Uzatımı ile İşin Bitim Tarihi	22.05.2026
2025 Yılı Harcama Tutarı	217.213.819,30 TL
Toplam Harcama Tutarı	301.752.664,71 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	80
İnşaatın Durumu	Geçici kabulü yapıldı. (Devam etmekte)

Çizelge 45: KMÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşİ İhale Bilgileri



Resim 13: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Vaziyet Planı



Resim 14: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası -1



Resim 15: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası -2



Resim 16: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım Aşaması- 1



Resim 17: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım Aşaması



Resim 18: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Son Aşaması

### 3.6.2. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli

2018 Yılı Yatırım Programı'na alınan ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren rekreasyon bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik, rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. Yatırım programında olmasına karşın Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilmiş olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.



Resim 19: Ermenek Belediye Başkanlığı Tarafından Üniversiteye Uygulama Oteli İçin Tahsis Edilen Alan

### 3.7. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi


Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2025 yılı bütçemize ayrılan ödenek 5.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 3.518.473,79 TL harcama gerçekleştirilmiş olup 2025 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %95,09'dur. 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Spor Salonu, Spor Tesislerinin Bakım Onarımı
Alt Projeler	Spor Salonu, Spor Tesislerinin Bakım Onarımı
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	10.198.100,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	5.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	1.300.000,00
Toplam Ödenek TL	3.700.000,00
Harcama TL	3.518.473,79
Kalan Ödenek	181.526,21
Gerçekleşme Oranı (%)	95,09

Çizelge 46:2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

#### 3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu

2016 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak yatırım izni verilmeyen projemiz ihaleye çıkma aşamasındadır. İzin ile projemiz ihale edilecektir. Projemiz 500 kişilik seyirci oturma kapasitesine sahiptir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Rekreasyon Bölümü öğrencileri başta olmak üzere Ermenek Yerleşkesindeki bütün öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.

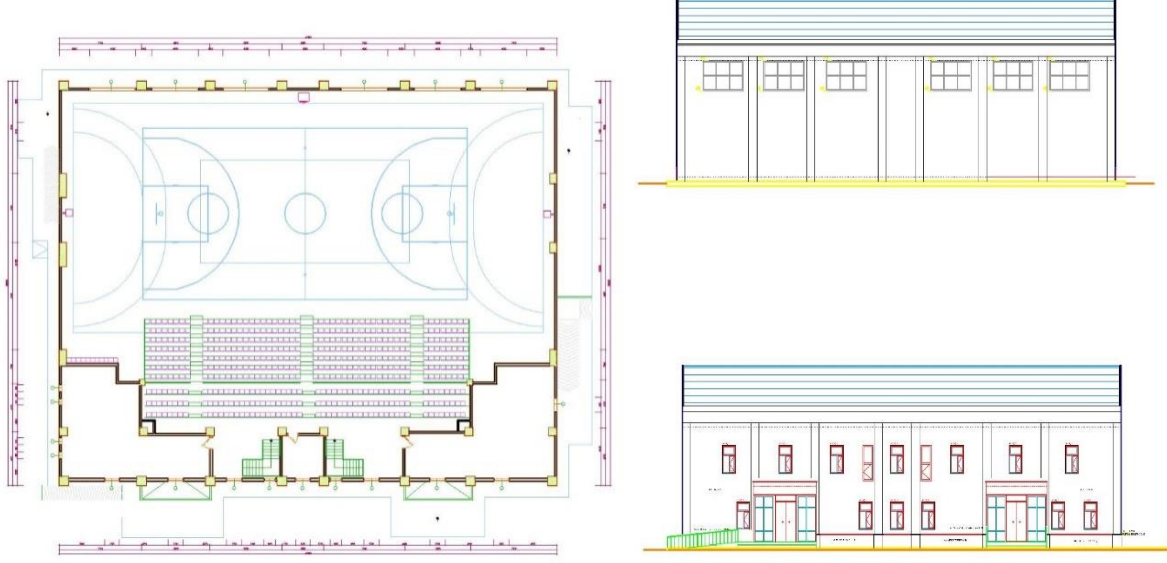

Resim 20: Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu Mimari Görselleri

### 3.7.2. Spor Tesislerinin Bakım Onarımı

2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde yer alan Spor Tesislerinin Bakım Onarımı alt projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
0-2 mm İnce Volkanik Kum	60.000,00
Kapalı Tenis Kortu Taşıyıcı Kolon Bakım ve Onarım	129.600,00
Atletizm Pisti Sulama Sistemi Mal Alım	33.601,44
2025 Yılı Bakım Onarım İşleri	2.755.272,35
Spor Sahaları Akrilik Zemin Onarımı	300.000,00
Halı Saha Çatısı Aşık Bakım Onarımı	240.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.518.473,79</b>

Çizelge 47: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Spor Tesislerinin Bakım Onarımı) Harcamalarının Detayı

Spor tesisleri ile ilgili olarak onarım ve bakım alıřmaları iin 12.495.000 TL (KDV Hari) bedel ile ihalesi yapılmıř ve szleřme 14.07.2025 tarihinde imzalanmıřtır.

İlgili Daire	Karamanođlu Mehmetbey niversitesi Yapı İřleri ve Teknik Daire Bařkanlıđı
Szleřmenin Konusu	KM 2025 Yılı Bakım Onarım İři
Proje Numarası	2010H05-1269-212942
İhale Tarihi	20.06.2025
Szleřme Tarihi	14.07.2025
Szleřme Bedeli TL	12.495.000 TL (KDV Hari)
Projeyle İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	17.07.2025
Fiilen İře Bařlama Tarihi	17.07.2025
Szleřmeye Gre İřin Bitim Tarihi	27.09.2025
2025 Yılı Harcama Tutarı	2.755.272,35 TL
Toplam Harcama Tutarı	2.755.272,35 TL
Fiziki Gerekleřme Oranı (%)	100
İnřaatın Durumu	Geici kabul yapıldı.

izelge 48:2025 Yılı Bakım Onarım İři İhale Bilgileri (Aık ve Kapalı Spor Tesisleri)

### 3.8. 2023K12-214484 İhtisaslaşma Projesi

İhtisaslaşma Projesi için 2025 yılı bütçemize ayrılan ödenek 10.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 5.000.000,00 TL düşürülmüş olup toplam ödenek 5.000.000,00 TL olmuştur. Hassas Tarım Uygulamaları Projesi özel hesabına 2.500.000,00 TL ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri Projesi Özel Hesabına 2.500.000,00 TL olmak üzere toplamda 5.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları
Alt Projeler	Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları
Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2027
Proje Tutarı TL	54.472.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	10.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	5.000.000,00
Toplam Ödenek TL	5.000.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek	0,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0,00

Çizelge 49: 2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi

Yükseköğretim Kurulu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Üniversitemiz "Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri" (HASTUYİT) alanında ihtisas üniversitesi olarak onaylanmıştır.

İhtisaslaşma programı kapsamındaki iki alt projeden biri olan yenilikçi işleme teknolojilerinin kullanımı ancak kaliteli ve yeterli tarımsal hammaddenin temini ile mümkün olacaktır. Bu da hassas tarım uygulamaları sayesinde elde edilebilmektedir. Tarımsal üretimde temel amaç, optimum masrafla daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmektir. Ancak yetiştiricilikte yapılan hatalar üretiminin ekonomik olmaktan çıkmasına ve bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle aşırı kimyasal kullanımı ile arazilerin verimliliği ve sürdürülebilir üretim potansiyeli azalmaktadır.

Hassas tarım teknolojileri, tarımda bilgi ve teknolojiyi birlikte kullanan tarımsal işletmeciliği değiştirebilecek yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Hassas tarım teknolojileri, uydu teknolojisi, elektronik ölçüm ve kontrol sistemleri ve bilgisayar yazılımları gibi yüksek teknolojileri kullanarak çok küçük alanlarda tarımsal girdi uygulama miktarını değiştirerek, kârlılık ve tarımsal etkinliğin artırılması ve daha da önemlisi çevreyi korumayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz hassas tarım uygulamaları konusunda tematik üniversite olarak YÖK tarafından atandıktan sonra hızlı bir şekilde bu konuda alt yapısını oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla bölgenin kalkınması için ihtiyaç duyulan konularda hem uygulamalı eğitimlerin verilmesi hem de uygulamalı AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi için “Tarımsal Eğitim ve Araştırma Tesisi Kurulumu (1. Aşama)” alt yapı projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynaklarının daha etkin kullanılması, tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha kaliteli bir üretim için bölge üreticisine hizmet sunacak “Tarımsal Analiz Laboratuvarı” ile üreticilerin rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Tarımsal Analiz Laboratuvarı kurulumu 2. Aşamada gerçekleştirilecektir.

İhtisaslaşma programı kapsamında Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri alanında “Duyusal Analiz ve Tüketici Tercihleri Belirleme Ünitesi Kurulumu” başlıklı alt yapı projesinin kurulumu tamamlanmış olup Şubat 2025 tarihinde proje süresi sonlandırılarak resmi açılışı yapılmıştır.

Desteklenmesine karar verilen “Tarımsal Eğitim ve Araştırma Tesisi Kurulumu (1. Aşama)” satın alma süreçleri tamamlanmış olup sonuç raporu HASTUYİT Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir.

Hassas Tarım Uygulamaları kapsamında üniversiteye ait uygulama alanlarında tarımsal eğitim ve araştırma faaliyetlerine yönelik altyapı çalışmaları yürütülmüştür. Bu çerçevede üniversiteye ait elma bahçesinde deneme parselleri oluşturulmuş, tarımsal meteoroloji istasyonu

kurulmuş, tam otomasyonlu sulama ve gübreleme sistemi hayata geçirilmiştir. Ayrıca tarımsal uygulamalarda kullanılmak üzere çeşitli tarımsal alet ve ekipmanlar temin edilmiştir.

Hassas Tarım Uygulamaları alanında proje çağruları yapılmış, bu çağrılarda toplam 14 Ar-Ge projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Bu projelerden 2 tanesi tamamlanmış, 12 tanesi devam etmektedir. Hassas Tarım Uygulamaları alanında 1 tane de Üniversite-Sanayi iş birliği projesine destek verilmiş ve proje devam etmektedir. Desteklenen Projeler kapsamında akademik çalışmalar yürütülmüş ve uygulamaya dönük faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Sanayi iş birliği kapsamında yapılan proje sayısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Proje Türü	Ar-Ge Projesi	Toplam
2017	2	2
2018	1	1
2020	4	4
2021	1	1
2023	1	1
2024	1	1
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Çizelge 50:Sanayi ile yapılan proje sayısı

Proje Türü	2024	Toplam
1505-Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı	1	1
HASTU SANAYİ	1	1
<b>Toplam</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Çizelge 51:Mevcut projeler

#### 4. Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı 22 Haziran 2023 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Stratejik Planımızda beş amaç ve bu amaçlarla ilişkili 18 hedef belirlenmiştir. Üniversitemiz, ortak akılla hazırlanan Stratejik Planımız ile farklılaşma alanları olarak belirlenen ihtisaslaşmaya yönelik belirlenen hedeflerinin yanı sıra yenilikçilik ve kurumsal kültürün oluşturulması, kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi, güçlü laboratuvarlar, uygulama alanları ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, sanayi ve iş dünyası ile güçlü ilişkiler kurulması, şehir ve üniversite bütünleşmesini tesis etmeye yönelik belirlenen amaç ve hedeflerini de gerçekleştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz stratejik planı ile yatırım programı ilişkisi kurularak aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler	
A-1	Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğinin artırılması.	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.	Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı	2025H03-258331	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2.799.994,84	Abone veri tabanları, e-kitaplar ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir.
A-2	Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.	Bölge üreticisi ile teknik personelin eğitim düzeyini, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasını ve tarımda teknoloji kullanımını artıracak çalışmalar yapılması.	DKH-Sosyal – Teknolojik Araştırma	İhtisaslaşma Projesi	2023K12-214484	Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları	0,00	Proje özel hesabına ödenek aktarılmıştır

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler	
A-4	Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarılması.	Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi.	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H05-1269	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi),	0,00	Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir
			Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H05-1269	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	3.518.473,79	Spor tesislerinin bakım onarımı yapılmıştır.
			Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H03-1057	Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> )	0,00	Proje hazırlık çalışmaları devam ediyor.
			Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H03-1057	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m <sup>2</sup> )	217.213.819,30	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için 14/08/2024 tarihinde 284.000.000 TL + KDV değer ile sözleşme imza edilmiş olup süre uzatımı ile birlikte işin 22/05/2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Fiyat farkı ile işin toplam maliyeti 396.887.206 TL'dir.
		Sağlık	Muhtelif İşler	2025I00-248129	Makine-Teçhizat, Büyük Onarım	5.751.694,66	Güvenlik kamerası ve monitör, makine teçhizat, hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve laboratuvar gereçleri, diş ünitesi, ağız içi fosfor plak tarayıcı, bilgisayar destekli üretim yazılımı alımları yapılmış, menkul malların bakım onarımları gerçekleştirilmiş, acil çıkış rampası çevre duvarı panel çit yapılmış, sirkülasyon pompası ile servis asansörlerinin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir	

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler
		Eğitim- Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	2023H03-212700	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	15.097.446,08	2025/423639 ihale kayıt numaralı 2025 Yılı Mal alımı ihalesi için dönem içerisinde 468.792,00 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. 2025/920230 ihale kayıt numaralı 2025 Yılı Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşleri için 31/07/2025 Tarihinde 11.203.000,00 TL + KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır.
			Muhtelif İşler	2025H03-258333	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	63.430.200,59	Büro ve okul mefruşatı, kadavra, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. Peyzaj ve çevre düzenlemesi işi için malzeme alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı ile asansörlerin mavi etiketlendirme işleri yapılmıştır.
		Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2025H03-258323	Etüt-Proje	30.000,00	-

Çizelge 52: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

## 5. Proje Bazında Harcamalar

Proje No	Proje Adı	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2024 Kümülatif Harcama	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama
<b>KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.</b>				<b>743.144.100</b>	<b>133.298.100</b>	<b>228.000.000</b>	<b>323.589.000</b>	<b>307.841.629</b>
<b>EĞİTİM</b>				<b>675.672.100</b>	<b>114.298.100</b>	<b>205.000.000</b>	<b>305.589.000</b>	<b>302.089.935</b>
<b>Yükseköğretim</b>				<b>665.474.000</b>	<b>107.800.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>301.889.000</b>	<b>298.571.461</b>
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	Eğitim (12.000 m <sup>2</sup> ), Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> )	2009-2026	557.000.000,00	84.000.000,00	111.200.000,00	217.215.000,00	217.213.819,30
2009H03-1057-187482	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	Eğitim (12.000 m <sup>2</sup> )	2022-2026	407.000.000,00	84.000.000,00	111.199.000,00	217.214.000,00	217.213.819,30
2009H03-1057-68203	Ermemek MYO Uygulama Oteli	Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> )	2018-2026	150.000.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2024H03-233248	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2025-2025	200.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	30.000,00
2024H03-233248-233249	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Etüt-Proje	2025-2025	200.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	30.000,00
2025H03-258331	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2025-2025	2.800.000,00	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.799.994,84
2025H03-258331-233228	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2025-2025	2.800.000,00	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.799.994,84
2025H03-258333	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2025-2025	65.680.000,00	0,00	66.500.000,00	65.680.000,00	63.430.200,59
2025H03-258333-233696	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2025-2025	65.680.000,00	0,00	66.500.000,00	65.680.000,00	63.430.200,59
2023H03-212700	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025	39.794.000	23.800.000,00	18.300.000,00	15.994.000,00	15.097.446,08
2023H03-212700-212701	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023-2025	39.794.000	23.800.000,00	18.300.000,00	15.994.000,00	15.097.446,08
<b>Beden Eğitimi ve Spor</b>				<b>10.198.100</b>	<b>6.498.100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.518.474</b>
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)	2010-2025	10.198.100	6.498.100	5.000.000	3.700.000	3.518.473,79

Proje No	Proje Adı	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2024 Kümülatif Harcama	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama
2010H05-1269-15497	Spor Salonu	Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)	2016-2025	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00
2010H05-1269-212942	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2023-2025	10.196.100	6.497.100	4.999.000	3.699.000	3.518.473,79
<b>SAĞLIK</b>				<b>13.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>5.751.695,00</b>
<b>Sağlık</b>				<b>13.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>5.751.695,00</b>
2025I00-248129	Muhtelif İşler	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	2024-2024	13.000.000	0,00	13.000.000	13.000.000	5.751.694,66
2025I00-248129-248130	Makine Teçhizat	Makine-Teçhizat	2025-2025	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	5.617.850,66
2025I00-248129-248131	Büyük Onarım	Büyük Onarım	2025-2025	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	133.844,00
<b>DKH-SOSYAL</b>				<b>54.472.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Teknolojik Araştırma</b>				<b>54.472.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>
2023K12-214484	İhtisaslaşma Projesi	Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın	2023-2027	54.472.000	19.000.000	10.000.000	5.000.000	0,00
2023K12-214484-216864	Hassas Tarım Uygulamaları	Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın	2023-2027	27.236.000	9.500.000	5.000.000	2.500.000	0,00
2023K12-214484-216865	Yenilikçi İşleme Teknolojileri	Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın	2023-2027	27.236.000	9.500.000	5.000.000	2.500.000	0,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>743.144.100</b>	<b>133.298.100</b>	<b>228.000.000</b>	<b>323.589.000</b>	<b>307.841.629</b>

Çizelge 53: Proje Bazında Harcamalar

## 6. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör iş birliđi modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluđunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
3. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
4. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.
5. Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı finansman programı ile dağıtım yapılırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca zamanında tahakkuka bağlanması kurumlara kolaylık sağlayacaktır.
