



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart 2010, KARAMAN

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti	2
2. Genel Değerlendirme.....	3
2.1. Kuruluşun Uzgörüşü	3
2.2. Kuruluşun Özgörevi.....	3
2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	3
2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi.....	5
2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	8
2.6.1. Hedeflenen	8
2.6.2. Gerçekleşen	8
2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları	9
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	9
2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	12
3. Proje Uygulamaları.....	13
3.1. 2009H031560 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	13
3.2. 1991H031260 Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (16000 m ²).....	15
3.3. 2009H031570 Muhtelif İşler	18
3.4. 2009H031580 Kampüs Altyapısı.....	23
3.5. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler	30
4. Öneriler.....	33
5. 2009 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*).....	34
6. 2009 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu	35

1. Yönetici Özeti

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12'nci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunmak, üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7'nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72'nci maddesiyle kurulmuştur.

2009 yılı yatırım programımızda öncelikli hedefimiz yapılan yatırımların tamamlanma sürelerini kısaltarak, hızla kapasite artırımı sağlamak olmuştur. Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesiyle mümkündür.

2009 yılı yatırım ödeneklerimizle acil ihtiyacımız olan Ermenek 300 yataklı Yurt ve Yunus Emre Yerleşkesinde Meslek Yüksekokulu hizmet binalarımızın inşaatına başlanılmış, bu yıl eğitim-öğretime başlayan Edebiyat Fakültesi ve Kamil Özdağ Fen Fakültesi binalarımız ile yine bu yıl hizmete açılan kütüphane binamızın tefrişi yapılarak hizmete alınması sağlanmıştır. Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere makine-teçhizat alımı yapılmış ve hizmetin yürütülmesinde acil ihtiyaç duyulan taşıtların satın alınması ile kütüphanemize basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Kuruluşun Uzgörüşü

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üzerinde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiştirmede öncü, öğrencileriyle ve tüm çalışanlarıyla mensubu bulunmaktan kıvanç duyacakları aranan bir üniversite olmaktır.

2.2. Kuruluşun Özgörevi

Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, demokratik ve laik cumhuriyetimizin kazanımlarının belirlediği çizelgede ilerleyerek; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı yapabilecek üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.

2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri


- ✓ Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde ezbercilikten uzak, yalnızca aklın ve bilimin geçerli olduğu, doğruları sorgulayarak, araştırarak, tartışarak ulaşmayı öğreten uluslararası kalitede çağdaş eğitim vermek.
- ✓ Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, katılımcı bir üniversite ortamı oluşturmak.
- ✓ Sürekli öğrenmeyi öğrenen, soran, sorgulayan, araştıran, problem değil çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiştirmek.
- ✓ Gelişen ve değişen dünyada, ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak.
- ✓ Üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmak ve bu işbirliğinin gelişimine katkı yapmak.
- ✓ Eğitimde kalite ve etkinliği artırmak için eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak.
- ✓ Eğitimin erişilebilirliğini ve fırsat eşitliğine dayalı yapısını güçlendirmek.

2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun' da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükeköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2009 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 8.500.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 1.456.000,00 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 9.956.000,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı hazine yardımları olarak özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.


Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları (TL)				
Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2009 Yılı Program Ödenegi	2009 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	32.590.000,00	8.500.000,00	9.956.000,00
TOPLAM	Özel Bütçe	32.590.000,00	8.500.000,00	9.956.000,00

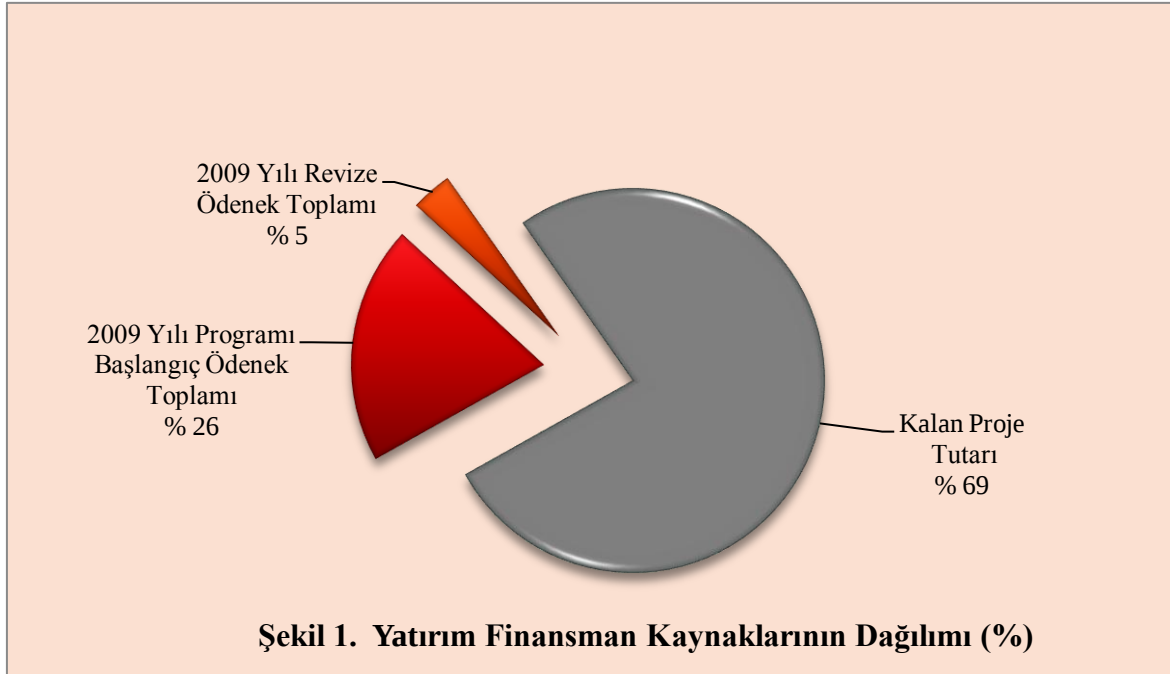

2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı:

Tablo 2. Taşınmazların Dağılımı (m ²)				
Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	-	1.306.438,67	1.236.024	2.542.462,67
Meslek Yüksekokul Yerleşkesi	-	398.200	-	398.200
Ermenek Yerleşkesi	54.787	-	-	54.787
Kazımkarabekir Yerleşkesi	55.326	3.259	-	58.585
Sağlık Yüksekokul	-	-	9.036	9.039
Genel Toplam	110.113	1.707.897,67	1.245.060	3.063.073,67

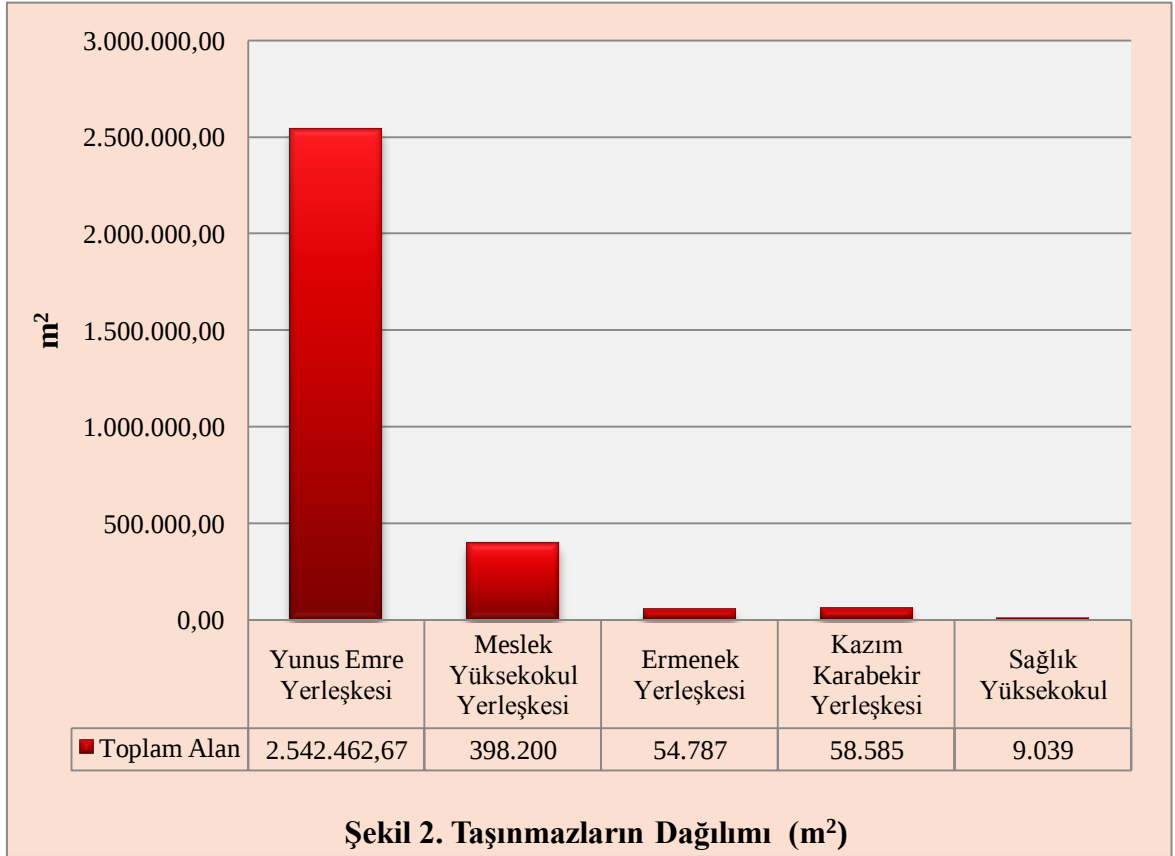


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Tablo 4. Kapalı Mekanların Dağılımı (m ²)						
Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi	Toplam
İdari	8.134	729	982,73	654	680	11.179,73
Eğitim	8.820	1247	217,07	1763	1431	13.478,07
Sosyal	5.702	-	300,20	1392	263	7.657,2
Spor	1.146	-	-			1.146
Toplam	23.802	1.976	1.500	3.809	2.374	33.461

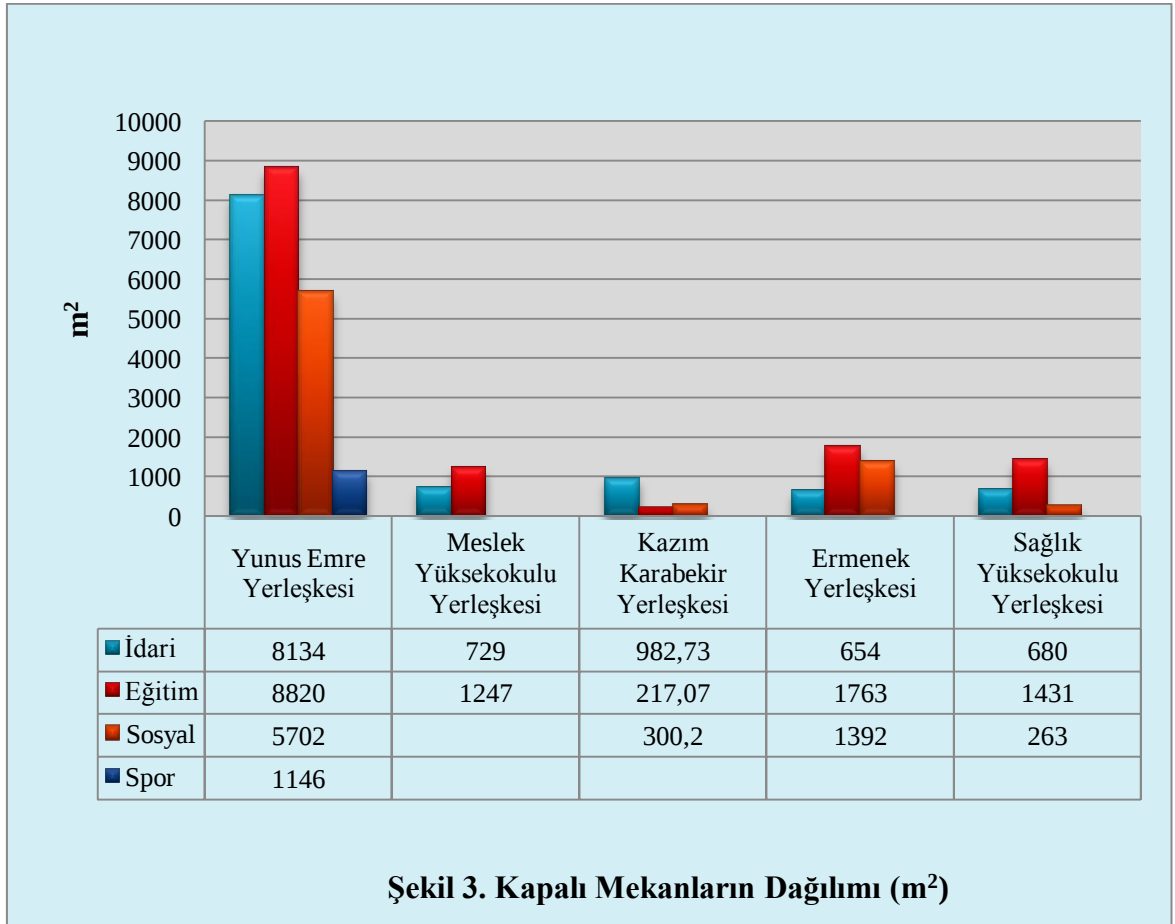

Yunus Emre Yerleşkesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Tablo 5. Yunus Emre Yerleşkesi Kapalı Mekanların Dağılımı (m ²)						
Hizmet Alanı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Edebiyat Fakültesi	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	Kütüphane	Toplam
İdari	4.040	1.990	1.704	-	400	8.134
Eğitim	3.341	2.830	1.502	-	1.147	8.820
Sosyal	3.176	1.566	408	-	552	5.702
Spor	-	-	-	1.146	-	1.146
Toplam	10.557	6.386	3.614	1.146	2.099	23.802

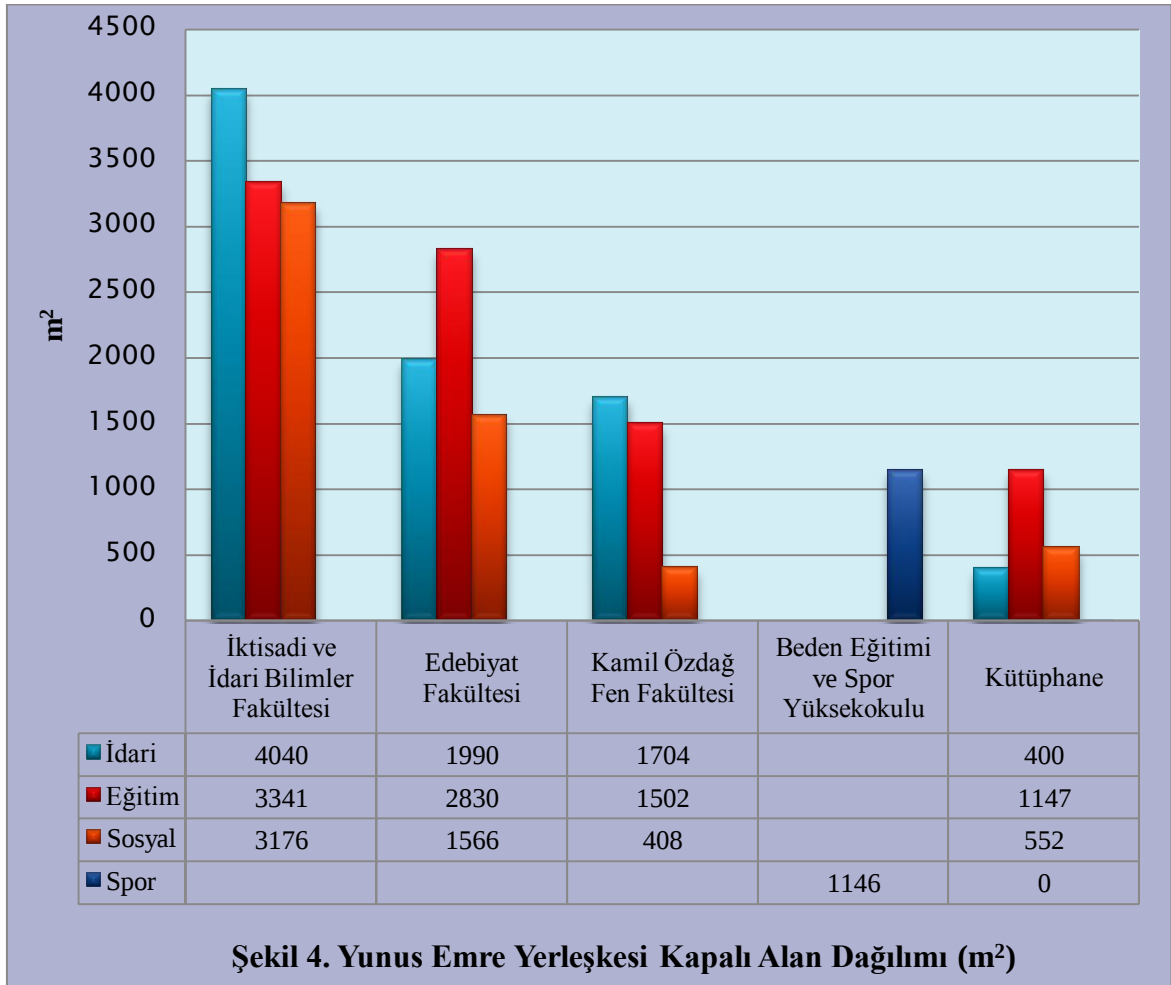

2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**2.6.1. Hedeflenen**

Üniversitemiz 2009 yılı yatırım programında, tamamı eğitim sektöründe olmak üzere beş adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüd projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

2009 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2009 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;


- ✓ Kütüphanemizin elektronik ve basılı yayın alımları hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürdürülmüştür.
- ✓ Üniversitemiz birimlerini ihtiyacı olan, büro ve bina mefruşat alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürmüştür.
- ✓ Taşıt alımlarının tamamı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Kanalizasyon yapım işi tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.
- ✓ Trafo yapım işi tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.
- ✓ Telefon ve internet fiberoptik kablo sistemi yeraltı düzenlemeleri ve bağlantıları tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz yerleşke alanlarının ve yapılacak tesis ve binaların proje ve etüt işlemleri programlanan seviyelere ulaşması için çalışmalar sürmüştür. Çevre düzenlemesi çalışmaları başlatılmıştır.
- ✓ Meslek Yüksekokulu hizmet binası (18.500 m²) ihalesi ve Ermenek yurt binası (7.500 m²) ihalesi gerçekleştirilmiş olup, inşaatları devam etmektedir.

2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları**2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Üniversitemize 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 8.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde gerek likit fazlası kayıtlarla gerek yatırımların hızlandırmak ödeneğinden yapılan aktarmalarla yıl sonu ödenek toplamı 9.956.000,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 4.309.856,70 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 43.29 dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları (TL)

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Bloke	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	1.970.000,00	1.256.000,00	3.226.000,00	0,00	2.051.912,93	% 63,61
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.230.000,00	200.000,00	6.430.000,00	0,00	2.257.943,77	%.35,12
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	%0,00
Toplam		8.500.000,00	1.456.000,00	9.956.000,00	0,00	4.309.856,70	%43,29

**Şekil 5. Sermayenin Dağılımı (%)**

Tablo 7. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Ekonomik Kod					Açıklama	Tutarı	Proje Numarası
830	6				Sermaye Giderleri	4.309.856,70	
830	6	1			Mamul Mal Alımları	2.051.912,93	
830	6	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	694.949,02	
830	6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	342381,94	2009H031570
830	6	1	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	352.567,08	2009H031570
830	6	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	980.722,14	
830	6	1	2	1	Büro Makineleri Alımları	29.913,00	2009H031570
830	6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	499.903,68	2009H031570
830	6	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	369.437,78	2009H031570
830	6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	81.467,68	2009H031570
830	6	1	4		Taşıt Alımları	359.892,19	
830	6	1	4	1	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	359.892,19	2009H031570
830	6	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	16.349,58	
830	6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	11.145,88	2009H031570
830	6	1	6	4	Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları	5.203,70	2009H031570
830	6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.257.943,77	
830	6	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	41.654,00	
830	6	5	1	1	Proje Giderleri	41.654,00	2009H031560
830	6	5	7		Müteahhitlik Giderleri	2.216.289,77	
830	6	5	7	1	Hizmet Binası	738.809,02	2009H031590
830	6	5	7	4	Sosyal Tesisler	425.881,67	2009H031590
830	6	5	7	9	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	116.081,91	2009H031580
830	6	5	7	90	Diğerleri	935.517,17	2009H031580

Üniversitemiz 2009 yılı yatırım projeleri stokunda yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. Revizyon (2009H31570 Muhtelif İşler)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031570
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2009
Proje Tutarı	2.270.000,00 TL
2009 Yılı Kümülatif Harcama	2.051.912,93 TL
2009 Yılı Yatırımı	2.270.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	1.256.000,00 TL
2009 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	3.526.000,00 TL
2009 Yılı Yatırımı Revizyonu	1.256.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 9. Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2010
Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
2009 Yılı Kümülatif Harcama	1.051.599,08 TL
2009 Yılı Yatırımı	1.000.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	200.000,00 TL
2009 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	10.000.000,00 TL
2009 Yılı Yatırımı Revizyonu	200.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması.
- ✓ Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması.
- ✓ Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olmaması.
- ✓ Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
- ✓ Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması.

3. Proje Uygulamaları**3.1. 2009H031560 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi**


Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2009 bütçemizde 400.000,00 TL ödeneği olup, proje kapsamında Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri olarak 41.654,00 TL Müşavir Firma ve Kişilere Ödemelerine harcama yapılmıştır. Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibarıyla harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. 2009H031560 Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje Verileri

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklene Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2009
Proje Tutarı	400.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	400.000,00 TL
Eklenen	-
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	400.000,00 TL
Serbest	400.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	400.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	400.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	400.000,00 TL
Harcama	41.654,00 TL
Kalan Ödenek	358.346.00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	10.41

Tablo 11. 2009H031560 Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yurt Binası Statik Proje ve Tesisat Projesi Yapımı	1	4.602,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	MYO Elektrik-Sıhhi Tesisat Projesi Yapımı	1	5.900,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	MYO Atölye Binaları Elektrik-Sıhhi Tesisat Projesi Yapımı	1	3.310,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	MYO Atölye Binaları Uygulama Projesi Detayları ve Statik Projesi Yapımı	1	10.030,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yerleşke Alanında Yapılacak olan Kanalizasyon Alt Yapı Proje Yapımı	1	5.310,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yeraltı Kablosu	1	10.502,00

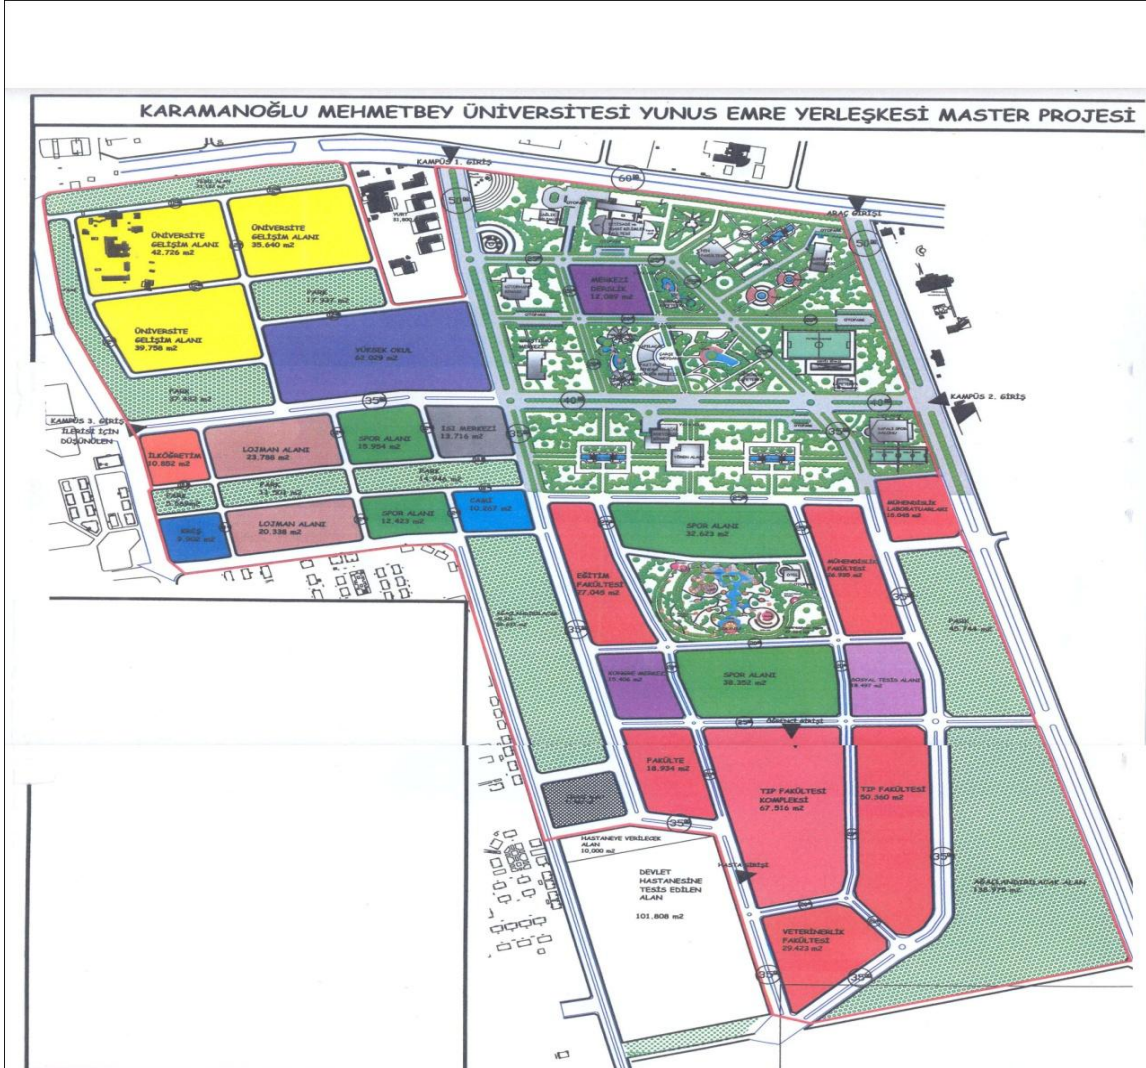

Üniversitemiz Master Planı

3.2. 1991H031260 Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (16000 m²)

Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (16000 m²) Projesine 1991 yılında başlanmıştır. Toplam Proje Tutarı 9.920.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Proje bitiş yılı olan 2009 yılı sonu itibarıyla proje yatırım programından çıkarılmıştır.

2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrasındaki, "2008 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden DPT Müsteşarlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Bu kapsamda yürütülecek projelerin etüt, keşif ve kontrol hizmetleri ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün il teşkilatlarınca yapılır. Bu projelerin ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi ise valinin onayı ile il özel idarelerince gerçekleştirilir. Bu projelerden mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkra da belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir" hükmü gereğince, üniversitemizin yeni kurulmuş ve teşkilatlanmasını tamamlayamamış olması nedeniyle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile projeye ilişkin 3.000.000 TL ödenek 30/12/2008 tarihinde Karaman İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

Ancak, 2009 yılı sonuna kadar Karaman İl Özel İdaresince söz konusu projeye ilişkin ihale iş ve işlemleri tamamlanamamıştır. Üniversitemizde 2009 yılı içerisinde anılan ihale iş ve işlemlerini yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel olması nedeniyle aktarılan tutarın üniversitemiz hesabına aktarılması talep edilmiş ve 2009 yılı sonunda 3.000.000 TL hesaplarımıza aktarılmıştır.

Hesaplara alınan tutar ise, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükümlerine göre likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle, 2010 Yılı Yatırım Programımızda yer alan **2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi** ile ilişkilendirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin eksik kalan iş ve işlemlerinin bu projeden tamamlanması sağlanacaktır.

Yatırım revize işlemleri 2010 Yılı Programının uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 7'inci maddesinin 2'nci fıkrasındaki "... Ancak, döner sermaye gelirleri ve özel bütçeli kuruluşların Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutarı üzerinde gerçekleşen finansman fazlaları ve bir önceki yıldan devreden öz gelirleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir" hükmüne göre gerçekleştirilecektir.

**Tablo 12. 1991H031260 Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(16000 m²)**

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	İnşaat Donanım
Proje Başlama Yılı	1991
Proje Bitiş Yılı	2009
Proje Tutarı	9.920.000,00 TL
2008 Yılı Sonuna Kadar Tahmini Harcama	9.820.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	100.000,00 TL
Eklenen	-
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Serbest	100.000.00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Harcama	0,00 TL
Kalan Ödenek	100.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	98.99



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının Görünümü



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının Tamamlanamayan Kısımından Görünüm

3.3. 2009H031570 Muhtelif İşler

Muhtelif İşler Projesi için 2009 yılı Bütçemize ayrılan ödenek 2.270.000,00 TL olup, 5828 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/5 uyarınca likit karşılığı 1.256.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 3.526.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 2.051.912,93 TL' dir. 2009 Yılı Programının uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13. 2009H031570 Muhtelif İşler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	B.On-Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On. İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2009
Proje Tutarı	2.270.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.270.000,00 TL
Eklenen **	1.256.000,00 TL
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	3.526.000,00 TL
Serbest	3.526.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	3.526.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	3.526.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.526.000,00 TL
Harcama	2.051.912,93 TL
Kalan Ödenek	1.474.087,07 TL
Gerçekleşme Oranı %	58.19

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 14. 2009H031570 Muhtelif İşler Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar	412	499.903,68
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mobilyaları Alımı	751	175.892,60
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sınıf Donanımı	1765	463.947,76
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşıt Alımı (1Adet T02-1 Adet T07)	2	73.626,60
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı (Kalem)	44	369.437,78
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kütüphane Donanım Alımı	376	166.489,34
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Veri Tabanı Alımı (Ebrary)	1	5.203,70
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Yabancı Kitap Alımı	94	11.145,88
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Otobüs Alımı	1	286.265,59



Bilgisayar Laboratuvarı



Sınıf Donanımı



Kütüphane Donanımı



Laboratuvar Donanımı



Binek Otomobil T02



Pick-Up T07



Otobüs T11b

3.4. 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Kampüs Altyapısı Projesi için 2009 yılı bütçemize ayrılan ödenek 1.000.000,00 TL olup, 5828 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/5 uyarınca likit karşılığı 200.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 1.200.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 1.051.599,08 TL'dir. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15. 2009H031580 Kampüs Altyapısı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Kln.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.Isı Mrk.Art.Trf.Tlf.
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2010
Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	1.000.000,00 TL
Eklenen **	200.000,00 TL
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	1.200.000,00 TL
Serbest	1.200.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	1.200.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	1.200.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.200.000,00 TL
Harcama	1.051.599,08 TL
Kalan Ödenek	148.400,92 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	10.52

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 16. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Harcamaları Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kanalizasyon Yapım İşİ	1	116.081,91
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Edebiyat ve Kamil Özdağ Fen Fakültesi Çevre Düzenleme İşİ	1	216.828,36
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Trafo Yapım İşİ	1	570.844,82
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22 Dış Hat,236 İç Hat IPLDK-300, IP Telefon Santrali	1	30.020,75
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	34 Dış Hat,464 İç Hat IPLDK-300, IP Telefon Santrali	2	117.823,24

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize ilişkin yatırımların detayları ve gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir.

Kanalizasyon Yapım İşİ

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, spor salonu, kütüphane, yapımına devam edilen Meslek Yüksekokulu, rektörlük binası inşaatlarının ve proje aşamasındaki yerlerin kanalizasyon yapım işi tamamlanmıştır. Toplam 2098 m kanalizasyon hattı yapılmış olup, bunun 1.590 m'sinde HDPE esaslı Q200 m boru, 508 m'sinde HDPE esaslı Q300 m boru kullanılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Gültekin Akyol / İvme İnşaat
Sözleşmenin Konusu	Kanalizasyon Yapım işi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	98.374,50
İhale Tarihi	08.06.2009
Mukavele Tarihi	30.06.2009
Yer Teslim Tarihi	02.07.2009
Filen İşe Başlama Tarihi	02.07.2009
İşin Bitim Tarihi	30.08.2009
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı



Kanalizasyon yapım işi ile ilgili değişik görüntüler

Trafo Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, spor salonu, kütüphane, yapımına devam edilen Meslek Yüksekokulu, rektörlük binası inşaatlarının ve proje aşamasındaki yerlere ait 2950 m orta gerilim ve alçak gerilim kablo hattı kazısı yapılmış olup, hat üzerine dört adet trafo yerleştirilmiştir. Bunların üç adedi 400 KVA'lık, bir adedi 1.250 KVA'lık trafodan oluşmaka olup, bir adet 'QG Kök Merkezi' bulunmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Emta Adana Enerji San.Tic.A.Ş.
Sözleşmenin Konusu	Trafo Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	439.788,00
İhale Tarihi	21.04.2009
Mukavele Tarihi	24.07.2009
Yer Teslim Tarihi	24.07.2009
Fiilen İşe Başlama Tarihi	24.07.2009
İşin Bitim Tarihi	06.10.2009
Günlük Gecikme Cezası	-
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	26.10.2009
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı



Trafo yapım işi ile ilgili değişik görüntüler

Kamil Özdağ Fen Fakültesi-Edebiyat Fakültesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Kamil Özdağ Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Çevre Düzenlemesi yapımında 32.000 m²'lik alana bordür ve parke taşı döşemesi yapılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Furkan İnşaat-Mustafa Çolakoğlu
Sözleşmenin Konusu	Edebiyat ve Kamil Özdağ Fen Fakültesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	167.200,00 TL
İhale Tarihi	24.08.2009
Mukavele Tarihi	24.09.2009
Yer Teslim Tarihi	24.09.2009
Fiilen İşe Başlama Tarihi	24.09.2009
İşin Bitim Tarihi	23.10.2009
Günlük Gecikme Cezası	275,63 TL
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	18.11.2009
Keşif Artışı (%)	9,9
Toplam Keşif	183.752,80 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaataın Durumu	Tamamlandı



Kamil Özdağ Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Çevre Düzenlemesi Çalışması

Santral Alımı

Üniversitemiz Fakülteleri arasında güçlü bir iletişim sağlama açısından tüm Üniversite birimlerine 22 Dış Hat, 236 İç Hat IPLDK-300, IP Telefon Santrali 34 Dış Hat, 464 İç Hat IPLDK-300, IP Telefon Santrali kurulmuştur.

Tablo 17. Kampüs Alt Yapısı İçin Alınan Malzeme

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22 Dış Hat,236 İç Hat IPLDK-300, IP Telefon Santrali	1	30.020,75
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	34 Dış Hat,464 İç Hat IPLDK-300, IP Telefon Santrali	2	117.823,24



Santral Sistemi

3.5. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2009 yılı bütçemize ayrılan ödenek 4.730.000,00 TL olup, toplam harcama 1.164.690,69 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	4.730.000,00 TL
Eklenen	-
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	4.730.000,00 TL
Serbest	4.730.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	4.730.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	4.730.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	4.730.000,00 TL
Harcama	1.164.690,69 TL
Kalan Ödenek	3.565.309,31 TL.
Gerçekleşme Oranı (%)	35.65

Tablo 19. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Harcamaları Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası İnşaatı	1	425.881,67
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	MYO Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi	1	738.809,02

Ermenek 300 Yataklı Yurt Yapımı

Üniversitemizin Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 300 Yataklı Yurt Yapım işine başlanmıştır. Yapılmakta olan yurt, 1.100 m² yerleşim alanı üzerine, 5.500 m² kapalı alan olacak şekilde inşa edilmektedir.

Projemizin % 15'i tamamlanmış bulunmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Onur Yapı Hasan SARİMEHMETOĞLU
Sözleşmenin Konusu	Ermenek 300 Yataklı Yurdu Yapımı
İhale Bedeli	2.320.288,21 TL
İhale Tarihi	30.07.2009
Mukavele Tarihi	23.09.2009
Yer Teslim Tarihi	24.09.2009
Fiilen İşe Başlama Tarihi	24.09.2009
İşin Bitim Tarihi	20.05.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	15
İnşaataın Durumu	Devam Ediyor



Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası İnşaatı Görünümü

Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun hizmet vermiş olduğu binaların eski ve prafabrik yapı olması nedeniyle eğitim kalitesinin artırılması için Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 7.500 m²'lik yerleşim alanı üzerine, 20.000 m² kapalı oturma alanı olacak şekilde ve üç bloktan oluşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapım işine başlanmış olup, % 10'u tamamlanmış bulunmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Alser İnşaat Ticaret ve Sanayi LTD.ŞTİ.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Meslek Yüksek Okulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İhale Bedeli	7.545.976,67 TL
İhale Tarihi	22.07.2009
Mukavele Tarihi	14.09.2009
Yer Teslim Tarihi	18.09.2009
Fiiilen İşe Başlama Tarihi	18.09.2009
İşin Bitim Tarihi	11.05.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	10
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor



Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı Görünümü

4. Öneriler

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitilmiş, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,
5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir.

6. 2009 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*)**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		33,846			9,820			8,500			1,456			4,310
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		33,846			9,820			8,500			1,456			4,310

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

7. 2009 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu

2009 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

DÖNEM=4

Kuruluş Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sektör Adı : Eğitim

2009 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış. (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2008 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
5703	490	2009H031560	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2009	Karaman	0	400	0	0	0	400					42
5704	490	1991H031260	Karaman İkt. ve İd. Bil.Fak. (16.000m ²)	Özel Bütçe	2009	Karaman	0	9.920	9.820	0	0	100					
5705	490	2009H031570	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2009	Karaman	0	3.526	0	0	0	3.526					2.052
5706	490	2009H031580	Kampüs Alt Yapısı	Özel Bütçe	2010	Karaman	0	10.000	0	0	0	1.200					1.051
5707		2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2011	Karaman	0	10.000	0	0	0	4.730					1.165
TOPLAM							0	33.846	9.820	0	0	9.956					4.310
