



T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti.....	1
2. Genel Değerlendirme	2
2.1. Kuruluşun Uzgörüşü.....	2
2.2. Kuruluşun Özgörevi	2
2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	2
2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	6
2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	7
2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	10
2.6.1. Hedeflenen.....	10
2.6.2. Gerçekleşen	10
2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	11
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	11
2.1.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	16
3. Proje Uygulamaları.....	17
3.1. 2012H032240 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ.....	17
3.2. 2012H032250 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	18
3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	23
3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	30
3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ	36
3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	41
4. Öneriler.....	46
5. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*).....	47
6. 2012 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu.....	48

1. Yönetici Özeti

Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetleriyle toplum bilinçlenmesi ve aydınlanması ile beşeri ve sosyal sermayenin artırılmasını sağlamak üzere kurulmuş anayasal kuruluşlardır. Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72’nci maddesiyle kurulmuştur.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun onikinci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunulması modern ve kullanışlı mekânlar ile teknolojik, kaliteli ve ihtiyaçları karşılayan araç-gereçlerle mümkündür.

2012 yılı yatırım programımızda öncelikli hedefimiz yapılan yatırımların tamamlanma sürelerini kısaltarak, hızla kapasite artırımı sağlamak olmuştur. Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesiyle mümkündür.

2012 yılı yatırım ödeneklerimizle Merkezi Yemekhane, Çarşı, Kafeterya İnşaatı, 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı, Yunus Emre Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı, Asfalt Yol ve Çevre Düzenleme Yapım İşleri, Meslek Yüksekokulu Binası Tadilatı ve Sistem Odası Güvenlik ve Yangın Tesisatı Yapım İşleri ile Rektörlük Birimleri Büyük Bakım Onarım Yapım İşleri tamamlanmıştır. Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İnşaatı, Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Binası, Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatları ile Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı İkmalî yapım işleri 2012 yılında ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere makine-teçhizat alımı yapılmış ve hizmetin yürütülmesinde acil ihtiyaç duyulan üniversitemiz ihtiyacı taşıt ile kütüphanemize basılı yayınlar ve elektronik veri tabanı alımları gerçekleştirilmiştir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir. Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60’uncü maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Kuruluşun Uzgörüşü

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyler yetiştiren ve gıda sektörünün iyileştirilmesi ile Türk dilinin araştırılması, yaygınlaştırılması, Türkçe bilincinin yerleştirilmesi konularında öncü çalışmalar yapan “sıradan değil, aranan” bir üniversite olmaktır.

2.2. Kuruluşun Özgörevi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamayı özgörev edinmiştir.

2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

KURUMSALLAŞMA EKSENİ

Stratejik Amaç 1: Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan personeli tamamlamak için serbest kadroların doluluk oranını her yıl %8 artırmak
2. İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak
3. Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak
4. Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek için personele yönelik sosyal veya kültürel organizasyon sayısını her yıl %20 arttırmak
5. Üniversite adayları nezdinde tanınırlığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının artırılması için her yıl 20.000 adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller (kitapçık, CD vb.) dağıtmak
6. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak
7. Plan dönemi sonunda idari personelin %5'inin en az bir yabancı dil yeterliliğinin olmasını sağlamak
8. 2017 yılı sonuna kadar Üniversite stadyumunu inşa ederek hizmete açmak
9. 2017 yılı sonuna kadar yüksek lisans ve doktora yapan idari personelin toplam idari personele oranını %10'a çıkarmak

10. İş ve işlemlerin daha hızlı yapılması, maliyetlerin düşürülüp verimliliğin artırılması ve güvenilir bir elektronik ortamda işlemlerin yapılabilmesi için e-imza uygulamalı e-arşiv, e-evrak sistemini 2014 yılında faaliyete geçirmek
11. 2013 yılından itibaren, her eğitim öğretim yarıyılı başında öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlemek
12. 2014 yılından itibaren, personelimize her son sınıf öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olmasını sağlamak ve 2017 yılına kadar toplam 15.500 ağaç dikimi gerçekleştirmek
13. En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek
14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak bir kimlik ortaya koymak amacıyla 2014 yılına kadar, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) için başvuru yapmak
15. Diğer üniversitelerle işbirliği yaparak idari ve akademik personelin ortak çalışmalar yapmasını sağlamak
16. 2013 yılında öz değerlendirme kurulu oluşturarak kuruma bağlılık ve isteklendirmeyi geliştirmek
17. Mezunların Üniversite'ye, birimlerine ve birbirlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılmasını sağlamak
18. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek

EĞİTİM EKSENİ

Stratejik Amaç 2: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. 2017 yılı sonunda 12.500 öğrenci sayısına ulaşmak
2. 2017 yılı sonunda öğretim üyelerinin öğretim elemanları içindeki payını %42'ye çıkarmak
3. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak
4. 2017 sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekanların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak
5. Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini %100 oranında tamamlamak
6. Öğrencilerin yönetime aktif olarak katılımını sağlamak
7. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak

8. Plan dönemi sonunda uzaktan eğitim programlarını hizmete açmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak
9. Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için sertifikalı yeni kurslar açarak plan dönemi sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını 3 katına çıkarmak
10. 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm eğitim-öğretim programlarını geliştirmek
11. Plan dönemi sonuna kadar Diploma Supplement Label ve ECTS Label uygulamasına geçmek
12. 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak “Kalite Sertifikası” almak
13. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ile personelin ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak için uluslararası değişim programlarına katılan personel ve öğrenci sayısını her yıl %15 arttırmak
14. Her yıl Karaman’da faaliyet gösteren en az 5 şirketle staj anlaşması yapmak
15. Yüksek lisans ve doktora programı açmak ve eğitimin kalitesini artırmak amacıyla plan dönemi sonuna kadar eğitim verilen her bölümde en az iki profesör veya doçentin hizmet vermesini sağlamak
16. Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanı başına öğrenci sayısını 25’te tutmak
17. 2017 yılına kadar yabancı ülkelerdeki en az 500 uluslararası öğrencinin Üniversitemizde öğrenim görmelerini sağlamak
18. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak
19. Eğitim öğretim kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ

Stratejik Amaç 3: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Tüm paydaşların yararlanabileceği uluslararası kuruluşlarca denkliği kabul edilmiş merkezi araştırma laboratuvarını 2017 yılında hizmete sunmak
2. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimini güçlendirmek
3. Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan yayın sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayı ve çeşitliliği her yıl %10 arttırmak
4. Bilimsel araştırma ve yayın sayısını her yıl %10 arttırmak

5. Bilimsel proje sayısını her yıl %10 artırmak
6. Tüm proje çıktıları ile ilgili olarak paydaşları bilgilendirmek
7. Tüm araştırma ve projelerin %5'ini disiplinler arası çalışma ile yürütmek
8. Plan dönemi sonuna kadar en az bir patent almış olmak
9. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı seminer, konferans ve toplantı vb. etkinliklere katılım sayısını her yıl %10 arttırmak
10. 2013 yılından itibaren lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların en az % 10'unun bölge ve ülke sorunları ile ilgili olmasını sağlamak

Stratejik Amaç 4: Karaman'ın ve Türkiye'nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Plan dönemi sonuna kadar Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanı sayısını 6'dan 14'e çıkarmak
2. Plan dönemi sonuna kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde tahıl, meyve-sebze, et-süt mikrobiyoloji-biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılacak Ar-Ge pilot tesisleri ve laboratuvarları kurmak
3. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlamak ve tamamlamak
4. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde toplam en az 50 makale yayınlamak
5. Plan dönemi sonuna kadar bölge gıda sanayi profiline (bisküvi-kraker-gofret, bulgur, elma vb.) uygun en az beş kongre/sempozyum/çalıştay ve konferans/panel düzenlemek
6. Gıda Mühendisliği Bölümünde üretilen bilgi ve teknolojinin bölge gıda sanayine aktarılmasını sağlamak için plan dönemi sonuna kadar "Gıda Ürünleri Geliştirme ve Teknoloji Transfer Merkezi" kurmak
7. Bölge gıda sanayinde çalışan teknik elemanların (Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Gıda Teknisyeni vb.) bilgi ve teknolojik düzeylerini hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek amacıyla her yıl eğitim seminerleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenlemek

Stratejik Amaç 5: Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresini geleneksel hale getirip iki yıl arayla düzenlemek
2. Türk Dilinin güncel sorunları üzerine yapılan çalışmalarını desteklemek ve plan dönemi sonuna kadar konuyla ilgili en az bir bilgi şöleni/çalıştay düzenlemek


3. Karamanlı Türkçesi (Karamanlca) üzerine düzenlenen çalışmalarda öncü olmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi içinde konuyla ilgili en az 5 tane konferans, panel vb. etkinlikler gerçekleştirmek
4. Plan dönemi sonuna kadar Türkçe Müzesi kurmak
5. 2017 yılından itibaren her yıl Türkçe Yetkinlik Sınavı düzenleyip başarılı olanlara “Türkçe Yetkinlik Belgesi” vermek ve belgenin ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak
6. Plan döneminde Türkçe üzerine hazırlanan çalışmaları yayınlamak, araştırmacılara destek olmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak
7. Türkçenin doğru etkili kullanılması ve tüm dünyada yaygınlaştırılması için 2017 yılı sonuna kadar en az beş tane ulusal/uluslararası organizasyon (kongre, bilgi şöleni ve yarışma) düzenlemek
8. Türkçenin kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel kullanılmasını desteklemek amacıyla yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında Türkçeyi en iyi kullanan radyo ve televizyon sunucuları ile şair ve yazarlardan plan dönemi sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak olan oylama sonucunda belirlenenlere geleneksel olarak ödül, onurluk vb. vermek
9. Karaman ve Türkiye’de iş yerlerine Türkçe isim verilmesi konusunda karar alınması için Belediyelerle ve Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yürütmek
10. Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde plan dönemi sonuna kadar bir Çeviri Merkezi kurmak

2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2012 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 21.048.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 18.627.371,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 39.675.371,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2012 Yılı Program Ödeneği	2012 Yılı Revizeli Ödenek	2012 Yılı Harcama
Eğitim	Özel Bütçe	99.239.000,00	18.700.000,00	37.327.371,00	20.266.000,00
DKH	Özel Bütçe	5.378.000,00	2.348.000,00	2.348.000,00	2.348.000,00
TOPLAM	Özel Bütçe	104.617.000,00	21.048.000,00	39.675.371,00	22.614.000,00

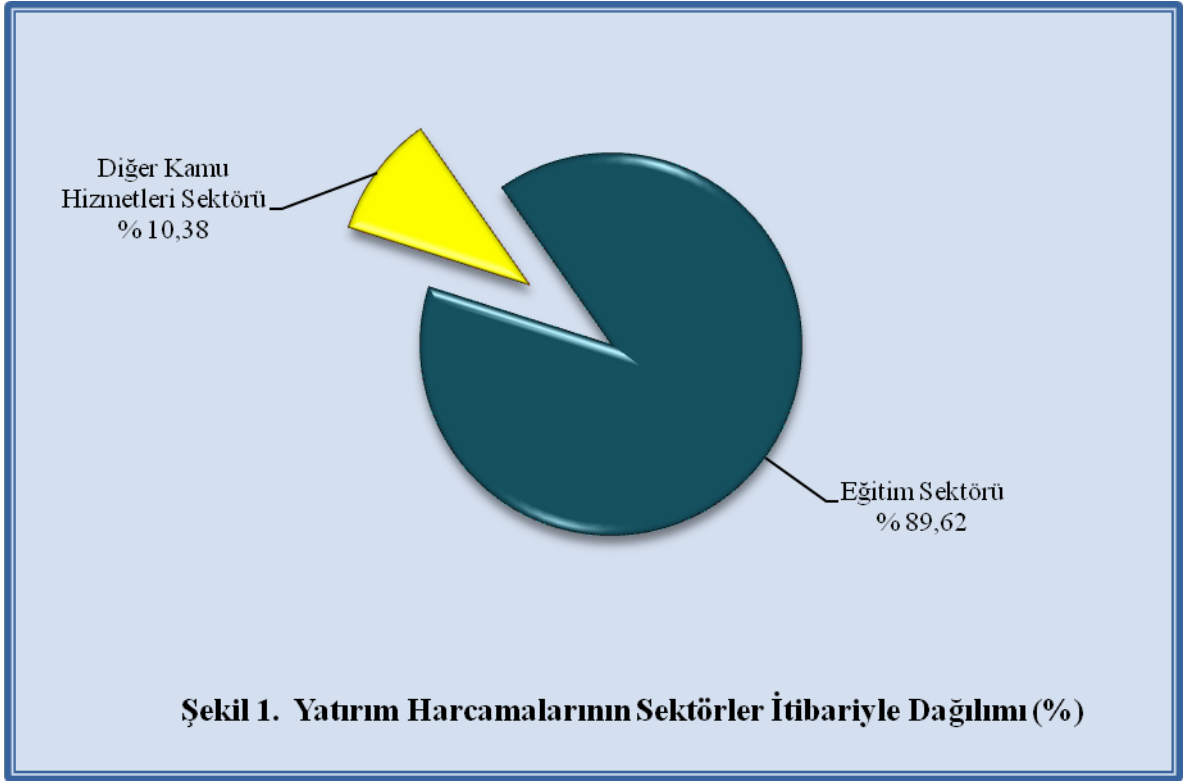

2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı:

Tablo 2. Taşınmazların Dağılımı (m²)

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	3.721.201,15	-	3.730.268,15
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazım karabekir Yerleşkesi	-	63.188,00	-	63.188,00
Genel Toplam	63.854,11	3.784.389,15	-	3.848.240,26

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	10.746	140	627	11.513
Eğitim	26.280	276	1.795	28.351
Sosyal	12.080	182	325	12.587
Spor	3.695	-	-	3.695
Diğer	38.535	398	1.578	40.511
Genel Toplam	91.336	996	4.325	96.657

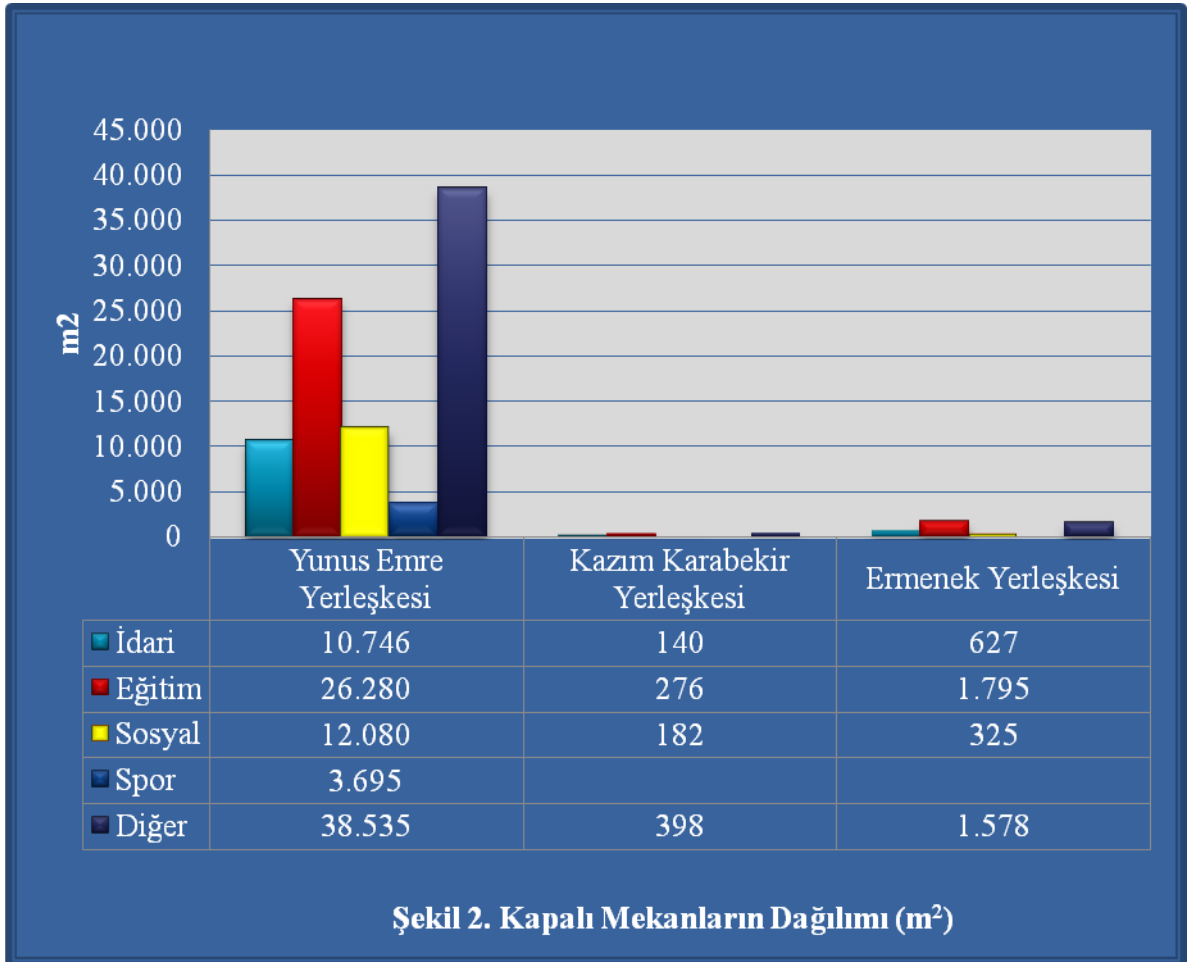

Üniversitemiz kapalı mekânların hizmet alanlarına göre dağılımı:

Tablo 4. Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)						
Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Diğer	Toplam
Rektörlük Hizmet Binası	5.000					5.000
Kamil Özdağ Fen Fakültesi	200	2.890	-	55	1.490	4.635
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.056	5.859	-	57	6.028	13.000
Edebiyat Fakültesi	379	3.121	-	110	3.030	6.640
Mühendislik Fakültesi	526	6.643	-	226	13.040	20.435
Sağlık Yüksekokulu	508	1.914	-	60	1.118	3.600
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	21	1.695	-	177	1.474	3.367
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	163	1.182	-	-	1.753	3.798
Ermenek Meslek Yüksekokulu	627	1.795	-	325	1.578	4.325
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	140	276	-	182	398	996
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	140	514	-	-	1.246	1.900
BESYO Spor Salonu			1.146			1.146
Kütüphane Hizmet Binası	270	1.165	-	-	1.740	3.175
Kreş	66	536	-	-	653	1.255
Konukevi	85			541	504	1.130
Çarşı, Yemekhane ve Kafeterya	534	-	-	10.451	2.015	13.000
1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu	43	61	2.549	403	4.444	7.500
Isı Merkezi	1.755					1.755
TOPLAM	11.513	28.351	3.695	12.587	40.511	96.657
TOPLAM KAPALI ALAN	96.657 m²					

*6.400 m²'lik Ermenek Meslek Yüksekokulu yurt binası Kredi ve Yurtlar Kurumunun kullanımına verilmiştir.

2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.6.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2012 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe (DKH) bir adet olmak üzere toplam altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin taşıt, makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile fiziki mekân inşaatlarının yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüd projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2012 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2012 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri, hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;


- ✓ Kütüphanemizin elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımları hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu aşamada 546 adet yerli kitap, 85 adet yabancı yayın ve 2 adet elektronik veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro ve bina mefruşat alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürmüştür. Bütçemiz T cetvelinde alımı öngörülen bir adet kamyonun alımı yapılmıştır.
- ✓ 2010 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Yemekhane Kafeterya ve Çarşı İnşaatı (13.000 m²), 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi (7.500 m²), Yunus Emre Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı, Asfalt Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (3200 m, 1800 m²), Meslek Yüksekokulu Binası Tadilatı ve Sistem Odası Güvenlik ve Yangın Tesisatı Yapım İşİ ile Rektörlük Birimleri Büyük Bakım Onarım Yapım İşİ tamamlanmıştır.
- ✓ Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İnşaatı, Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Binası, Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatları ile Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı İkmal yapım işlerinin yapımına devam edilmektedir.

2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları**2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 21.048.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde gerek finansman fazlası kayıtlarla gerek yatırımları hızlandırma ödeneğinden yapılan aktarmalarla yıl sonu ödenek toplamı 39.675.371,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 22.728.050,58 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 57,29'dür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Ve Dağılımı

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	4.048.000,00	1.427.200,00	5.475.200,00	5.403.338,46	98,69
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	0,00	100.000,00	20.085,96	20,09
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	15.900.000,00	15.951.761,00	31.851.761,00	16.262.772,07	51,06
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000,00	1.248.410,00	2.248.410,00	1.041.854,09	46,34
7.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		21.048.000,00	18.627.371,00	39.675.371,00	22.728.050,58	57,29

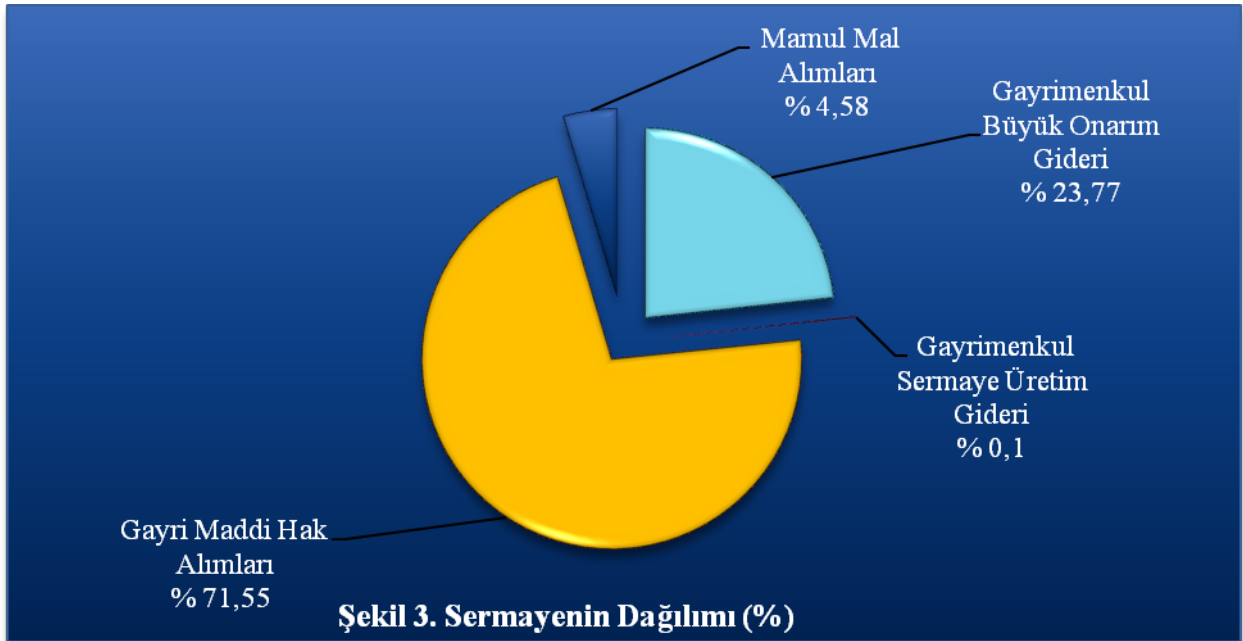

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Ekonomik Kod					Açıklama	Tutarı	Proje Numarası
830	6				Sermaye Giderleri	22.728.050,58	
830	6	1			Mamul Mal Alımları	5.403.338,46	
830	6	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.215.465,09	
830	6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	420.111,46	2012H032250
830	6	1	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	439.273,88	2012H032250
830	6	1	1	5	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	354.663,75	2012H032250
830	6	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	1.416,00	2012H032250
830	6	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	4.052.852,65	
830	6	1	2	1	Büro Makineleri Alımları	184.418,24	2012H032250
830	6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	165.673,18	2012H032250
830	6	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	2.653.849,79	2012H032250 2010K121090
830	6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	61.701,50	2012H032250
830	6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	872.962,53	2012H032250
830	6	1	4	1	Kara Taşıtı Alımları	114.247,41	2012H032250
830	6	1	3		Avadanlık Alımları	94.040,10	
830	6	1	3	3	Tıbbi Gereçler Alımları	94.040,10	2012H032250
830	6	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	40.980,62	
830	6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	26.654,68	2012H032250
830	6	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	14.325,94	2012H032250
830	6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	20.085,96	
830	6	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	20.085,96	
830	6	3	1	1	Bilgisayar Yazılı Alımları	20.085,96	2012H032250
830	6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.262.772,07	
830	6	5	7		Müteahhitlik Giderleri	16.262.772,07	
830	6	5	7	1	Hizmet Binası	2.303.963,68	2009H031590
830	6	5	7	4	Sosyal Tesisler	5.975.564,44	2009H031590 2010H050170
830	6	5	7	7	Yol Yapım Giderleri	3.907.814,95	2009H031580
830	6	5	7	90	Diğerleri	4.075.429,00	2009H031580 2010K121090
830	6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.041.854,09	
830	6	7	7		Müteahhitlik Giderleri	1.041.854,09	
830	6	7	7	1	Hizmet Binası	1.041.854,09	2012H032250

Üniversitemiz 2012 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2012H032240
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2012-2012
Proje Tutarı	100.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2012 Yılı Yatırımı	100.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan	0,00 TL
2012 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2012 Yılı Yatırımı Revizyonu	100.000,00 TL

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2014
Proje Tutarı	16.050.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	6.783.243,95 TL
2012 Yılı Yatırımı	2.500.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	8.856.070,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	11.356.070,00 TL
2012 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2012 Yılı Yatırımı Revizyonu	11.356.070,00 TL

** 1.300.000,00 TL'lik tutar Maliye Bakanlığınca yatırımı hızlandırma ödeneğinden, geri kalan 7.556.070,00 TL'lik tutar likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 9. Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2014
Proje Tutarı	61.114.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	5.817.526,49 TL
2012 Yılı Yatırımı	10.900.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	3.655.705,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	14.555.705,00 TL
2012 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2012 Yılı Yatırımı Revizyonu	14.555.705,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 10. Revizyon (2012H032250 Muhtelif İşler)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2012H032250
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2012-2012
Proje Tutarı	6.675.610,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	5.317.278,51 TL
2012 Yılı Yatırımı	4.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	2.675.610,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	6.127.200,00 TL
2012 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	2.675.610,00 TL
2012 Yılı Yatırımı Revizyonu	6.675.610,00 TL

** 700.000 TL'lik tutar Maliye Bakanlığınca yatırımı hızlandırma ödeneğinden, geri kalan 1.975.610,00 TL'lik tutar likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 11. Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2015
Proje Tutarı	16.000.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	2.462.001,63 TL
2012 Yılı Yatırımı	1.200.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	3.440.000,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	4.639.986,00 TL
2012 Yılı Proje Tutarı Revizyonu*	3.000.000,00 TL
2012 Yılı Yatırımı Revizyonu	4.640.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

* 2011/2303 sayılı Program uyarınca proje tutarı 3.000.000,00 TL ikmal edilmiştir.

Tablo 12. Revizyon (2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı)	
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010K121090
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2013
Proje Tutarı	5.378.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	2.348.000,00 TL
2012 Yılı Yatırımı	2.348.000,00 TL
Eklenen Aktarma	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	2.348.000,00 TL
2012 Yılı Proje Tutarı Revizyonu*	0,00 TL
2012 Yılı Yatırımı Revizyonu	2.348.000,00 TL

*Merkezi araştırma laboratuvarı projesi kapsamında 300 m²'lik iklim kontrollü araştırma serasının projeye ilave edilmesiyle projenin karakteristiği revize edilmiştir.

2.1.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Çalışanların özlük hakları yetersizdir.
- ✓ Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yoktur.
- ✓ Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve mevzuata uygunluğu talep edenlerce göz ardı edilmektedir.

- ✓ Çok yıllı projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
- ✓ Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısı yetersizdir.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2012H032240 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2012 yılı bütçemize ayrılan 100.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği ayrılmıştır.

Tablo 13. 2012H032240 Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje Verileri	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2012
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	100.000,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Toplam Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Harcama	0,00 TL
Kalan Ödenek	100.000,00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	0,00

3.2. 2012H032250 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Muhtelif İşler Projesi için 2012 yılı Bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup, likit karşılığı 2.675.610,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 6.675.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 5.317.278,51 TL' dir. 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Üniversitemiz 2012 yılı Bütçesinin T Cetvelinde yer alan bir adet kamyon alımı gerçekleştirilmiştir.

Tablo 14. 2012H032250 Muhtelif İşler	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	B.On- Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On. İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt
Proje Başlama Yılı	2012
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	6.675.610,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	4.000.000,00 TL
Eklenen **	2.675.610,00 TL
Toplam Ödenek	6.675.000,00 TL
Harcama	5.317.278,51 TL
Kalan Ödenek	1.358.331,49 TL
Gerçekleşme Oranı %	79,66

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır. 700.000,00 TL yatırımı hızlandırma ödeneğinden eklenmiştir.

Tablo 15. 2012H032250 Muhtelif İşler Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	1227	316.144,14
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	145	259.385,10
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşat Alımı	684	439.273,88
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	246	184.418,24
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımı	1	114.247,41
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı (Kalem)	139	1.505.849,79
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımı	133	20.085,96
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	102	165.673,18
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Gereçler Alımı	11	94.040,10
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımı	631	26.654,68
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Veri Tabanı Alımı	2	14.325,94
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bina Bakım – Onarımı Yapım İşİ	2	1.041.854,09
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımı	1989	354.663,75
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	10	45.240,50
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	445	103.967,32
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	3304	631.454,43
Toplam		9071	5.317.278,51



Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı



Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı



Yemekhane Mefruşat Alımları



Güvenlik Kamera Sistemleri Alımı



Büro Mefruşatı Alımı



Bir Adet Kamyon Alımı



Basılı Yayın Alımı

3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

Kampüs Altyapısı Projesi için 2012 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 6.648.000,00 TL ödenek eklenmiştir. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 7/3 maddesi uyarınca 1.300.000,00 TL tutarındaki ödenek Maliye Bakanlığınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılmıştır. Toplam ödenek 11.356.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 6.783.243,95 TL'dir. 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Harcamaları Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	1.226.852,28
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşİ	2	1.648.576,72
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	3.907.814,95

Tablo 17. 2009H031580 Kampüs Altyapısı	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	KnI. El. Su Çev. D., D. Gaz. Yol Isı Mrk. Art. Trf. Tlf.
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2014
Proje Tutarı	16.050.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.500.000,00 TL
Eklenen **	8.856.070,00 TL
Toplam Ödenek	11.356.070,00 TL
Harcama	6.783.243,95 TL
Kalan Ödenek	4.572.826,05 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	59,73

** 1.300.000,00 TL 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 7/3 maddesi uyarınca yatırımı hızlandırma ödeneğinden, geri kalan 7.556.070,00 TL'lik tutar likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize ilişkin yatırımların detayları ve gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir.

Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesiyle yerleşke alanı içerisinde rektörlük binası, kütüphane binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çevresinde gezi ve dolaşma alanları, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için sosyal aktivite yapabilecekleri alanlar oluşturulmuştur. İşin ihalesi 2012 yılında yapılarak yer teslimi yapılmış ve inşaat başlanmıştır. İşin yapımına 2012 yılında devam edilmiştir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Alp Yapı İnşaat Mimarlık Öztekin Çökelez
Sözleşmenin Konusu	Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.282.000,00
İhale Tarihi	14.02.2012
Sözleşme Tarihi	15.03.2013
Yer Teslim Tarihi	05.11.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	20.03.2012
İşin Bitim Tarihi	01.04.2013
Toplam Gecikme Cezası	26.922,70
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	30.09.2012
Harcama Tutarı	1.226.852,28
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	95,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.



Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımıyla yerleşke alanındaki bütün tesislerin tek noktadan çevre dostu doğalgazla ısıtılması sağlanacak ve yakıt israfı ile çevre kirliliğini engellenecektir. İşin ihalesi 2010 yılında yapılarak yer teslimi yapılmış ve inşaat başlamıştır. 2011 yılında yapımına devam edilmiştir. 28.05.2012 tarihinde yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşme fesh edilmiştir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	T.E.Z Mimarlık İnş. Turz. San.Tic.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	5.350.000,00
İhale Tarihi	27.09.2010
Sözleşme Tarihi	02.11.2010
Yer Teslim Tarihi	05.11.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.11.2010
İşin Bitim Tarihi	18.03.2012
Toplam Gecikme Cezası	48.150,00 TL
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	16.04.2012
Harcama Tutarı	1.193.837,61
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	66,00
İnşaatın Durumu	Sözleşme fesh edildi.

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşine ilişkin ikinci ihale 2012 yılı Eylül ayında yapılmış ve Kasım ayında yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaatla başlamıştır. 2012 yılında yapımına devam edilmiştir. İşin 16/04/2012 tarihinde tamamlanması ve tesisin hizmete alınması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Klitem Müh. Ltd. Şti./Zilan Peyzaj İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	2.590.000,00
İhale Tarihi	27.09.2012
Sözleşme Tarihi	02.11.2012
Yer Teslim Tarihi	07.11.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	07.11.2010
İşin Bitim Tarihi	04.07.2013
Harcama Tutarı	454.739,11
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	17,56
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.



1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi

Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesine Ana Giriş Kapısı, Kampüs İçi Asfalt Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılmış ve 05/09/2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	3.988.400,00 TL
İhale Tarihi	03.08.2011
Sözleşme Tarihi	24.08.2011
Yer Teslim Tarihi	05.09.2011
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.09.2011
İşin Bitim Tarihi	12.11.2012
Toplam Gecikme Cezası	31.409,59
Harcama Tutarı	3.907.814,95
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	99,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.



Proje tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve giriş kapısı hariç hizmete alınmıştır. 2013 yılında yüklenici firma tarafından geçici kabuldeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından giriş kapısının da hizmete alınması sağlanacaktır.

Binalar arası yolların asfaltlanması ile peyzaj ve çevre aydınlatmaları yapılması sonucunda Üniversitemizin yaşanabilirliği artmış, daha güzel ve estetik bir yapıya kavuşmuştur.



Giriş kapısı 3D görünümü

3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2012 yılı bütçemize ayrılan ödenek 10.900.000,00 TL olup, 3.656.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, toplam ödenek 14.556.000,00 TL olmuştur. 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca toplam harcama 5.817.526,49 TL'dir. Detay projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 19. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Harcamaları Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası Yapım İşİ	1	169.375,12
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO Binası İnşaatı Yapım İşİ	1	2.134.588,56
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşİ	1	3.513.562,81

Tablo 18. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2014
Proje Tutarı	61.114.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	10.900.000,00 TL
Eklenen	3.655.705,00 TL
Toplam Ödenek	14.555.705,00 TL
Harcama	5.817.526,49 TL
Kalan Ödenek	8.738.178,51 TL

Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası Yapım İşi

Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası yapım işinin ihale süreci uzadığından 2012 yılında planlanan %35'lik fiziki tamamlama hedefine ulaşılamamıştır. Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Prosan Müh. Proje ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası Yapımı
İhale Bedeli	14.694.000,00
İhale Tarihi	27.07.2012
Sözleşme Tarihi	28.09.2012
Yer Teslim Tarihi	02.10.2012
Fiilen İşe Başlama Tarihi	02.10.2012
İşin Bitim Tarihi	20.11.2014
Toplam Gecikme Cezası	0,00
Harcama	169.375,12
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	1,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunacaktır.

Fiziki Mekân	Adet	M ²
1000 Kişilik Konferans Salonu	1	1.230
Öğretim Üyesi Odası	20	444
Toplantı Salonu	4	120
Büro	49	874
Derslik	38	3.818
İdari Personel Odası	15	333
Seminer Odası	1	139
Diğer	-	7.042
Toplam	-	14.000

Kazım Karabekir MYO Binası İnşaatı Yapım İşi

Eğitim verilen mevcut binanın yetersiz ve uygun koşullarda eğitim-öğretim yapmaya müsait olmamasından dolayı, yeni bir eğitim ve tesis binası yapılarak öğrencilerin daha verimli alanlarda eğitim-öğretim görmeleri hedeflenmiştir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Hasan SARİMEHMETOĞLU-Onur Yapı/Sisan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Kazım Karabekir MYO Binası İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	5.242.630,00
İhale Tarihi	14.02.2012
Sözleşme Tarihi	18.04.2012
Yer Teslim Tarihi	20.04.2012
Fiilen İşe Başlama Tarihi	20.04.2012
İşin Bitim Tarihi	18.07.2013
Toplam Gecikme Cezası	0,00
Harcama	2.134.588,56
Fiziki Gerçekleşme Oranı	35
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Kazım Karabekir MYO binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunacaktır.

Fiziki Mekân	Adet	M ²
Akademik Personel Odası	50	750
İdari Personel Odası	9	300
Konferans Salonu	1	130
Bilgisayar Laboratuvarı	4	190
Derslik	21	1.700
Kafeterya	1	135
Mutfak/Yemekhane	1	360
Diğer	-	3.435
Toplam	-	7.000

KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre yerleşkesinde personel ve öğrencilerimiz için Merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı inşaatı yaptırılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	9.131.353,02 TL
İhale Tarihi	21.05.2010
Sözleşme Tarihi	07.09.2010
Yer Teslim Tarihi	14.09.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	14.09.2010
İşin Bitim Tarihi	10.07.2012
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.535.721,00
Harcama	3.513.562,81
Fiziki Gerçekleşme Oranı	100,00
İnşaatın Durumu	Bitti

A, B, C blokları bodrum, zemin ve 1 kattan oluşmaktadır. Ayrıca çevresinde tek kattan ibaret; büfe, market, seyahat acentesi, kafe, butik, eczane, özel lokanta, fast-food alanı, kuaför ve banka gibi bölümlerin oluşturduğu çarşı mevcuttur.



Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı binası 7489 m² kapalı alana sahiptir ve ayrıntılarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Fiziki Mekân	Adet	M ²
Çok Amaçlı Salon	2	1.120
Seminer Salonu	1	311
Konferans Salonu	1	391
Alakart Salonu	1	504
V.İ.P. Yemek Salonu	1	180
Yemek Salonu	2	2.142
Kafeterya	1	678
Muayene Odası	8	145
Öğrenci Çalışma Odası	12	250
Ofis	12	534
Laboratuvar	1	10
Mutfak	4	665
Banka	1	68
Kuaför	1	70
Fast Food	1	68
Lokanta	1	68
Eczane	1	68
Butik	1	68
Kafe	1	68
Seyahat Acentesi	1	57
Market	1	135
Büfe	1	30
Diğer	-	5.370
Toplam	-	13.000



Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı Binası



3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2012 yılı bütçemize ayrılan ödenek 1.200.000,00 TL olup, eklemeler sonucuna 2012 yılı ödeneği 4.640.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama 2.462.001,62 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 20. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	16.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	1.200.000,00 TL
Eklenen	3.439.986,00 TL
Toplam Ödenek	4.639.986,00 TL
Harcama	2.462.001,63 TL
Kalan Ödenek	2.177.984,37 TL
Gerçekleşme Oranı	53,06

Tablo 21. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Harcamaları Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	2.462.001,63
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşİ	1	0,00

KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde sportif faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 7.500 m² kapalı alan 1500 kişilik kapalı spor salonu ve çevre düzenlenmesi işi yaptırılmaktadır. K.M.Ü. 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ tamamlandığında 7.500 m² kapalı alana sahiptir.

Projede kapalı spor salonunun yanı sıra tenis kort, basketbol – voleybol sahaları, sentetik futbol sahası ve koşu parkuru mevcuttur. Üniversitemiz öğrencileri ve çalışanlarının spor tesisi ihtiyacı karşılanmış, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun teorik ve uygulama derslerinin modern bir ortamda yapılması sağlanmıştır.

Kapalı spor salonunun sportif faaliyetlerin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerde de kullanılması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	K.M.Ü. 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
İhale Bedeli	7.143.605,98 TL
İhale Tarihi	22.06.2010
Sözleşme Tarihi	10.08.2010
Yer Teslim Tarihi	13.08.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	13.08.2010
İşin Bitim Tarihi	15.12.2012
Harcama	2.462.001,63
Fiziki Gerçekleşme Oranı	100,00
İnşaatın Durumu	Bitti.

1500 Kişilik Kapalı Spor Salonunun yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunmuştur.

Fiziki Mekân	Adet	M ²
Voleybol Sahası	1	370
Squash Alanı	1	95
Basketbol/Hentbol Sahası	1	1.350
Antrenman Odası	2	420
Fitness	1	110
Öğrenci Kulübü	1	93
Derslik	1	61
Sağlık Odası	1	17
Hakem Odası	1	25
Antrenör Odası	1	25
Hazırlık Odası	2	50
İdari Ofis	1	43
VİP	1	87
Kafeterya	1	310
Diğer	-	4.444
Toplam	-	7.500



1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu



Sentetik Futbol Sahası

Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi

Bulunduğu kentin sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimine katkı sağlamayı kendine görev edinen Üniversitemiz, kalkınmada öncelikli küçük bir anadolu kenti olan Karaman'ın sosyal, kültürel ve sportif yönden eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilerimizin sportif faaliyetlerden azami ölçüde faydalanması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimizin uygulamalı derslerini yapmaları ile ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenecek müsabaka ve faaliyetlerde Üniversitemizi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi amacıyla Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılmasına karar vermiştir. 2012 yılında ihalesine çıkılan projenin ihale süreci uzadığından hedeflenen fiziki gerçekleşme hedefi olan %25 seviyesine ulaşamamıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	ARC İnş. Proje Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi
İhale Bedeli	5.234.000,00 TL
İhale Tarihi	28.09.2012
Sözleşme Tarihi	28.12.2012
Yer Teslim Tarihi	02.01.2012
Fiilen İşe Başlama Tarihi	02.01.2012
İşin Bitim Tarihi	16.05.2014
Fiziki Gerçekleşme Oranı	0,00
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.

Projenin gerçekleştirilmesiyle;

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin alanlarında yetkin birer spor insanı olarak mezun olmaları,
 2. Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası düzenlenen su sporlarında derece alınması,
 3. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sportif ve sağlıklı bireyler olmaları,
 4. Karaman'ın sosyal, kültürel ve sportif imkânlarının artırılarak Karaman halkının bu imkânlardan faydalanması ve halkın daha sosyal ve sportif olması,
 5. Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası düzenlenen su sporlarında takımlarımızın mücadelesi sonucunda Üniversitemizin ve Karaman'ın tanıtılması,
 6. Ülkemiz milli takımına sporcular yetiştirerek Ülkemizin sportif başarılarına katkıda bulunulması,
 7. Yüzme bilincinin artırılması,
- hedeflenmektedir.



Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası 3D Proje Resmi

Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunacaktır.

Fiziki Mekân	Adet	M ²
25x16 Yüzme Havuzu	1	400
16x6,50 Antreman Havuzu	1	104
Soyunma Odası	2	140
Jimnastik Salonu	1	95
Antronör Odası	2	40
Doktor Odası	1	25
Ofis	6	90
288 Kişilik Tribün	1	-
Dinlenme Salonu	10	296

3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 2012 yılı bütçemize ayrılan ödenek 2.348.000,00 TL'dir. Toplam harcama 2.348.000,00 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 22. 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	5.378.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.348.000,00 TL
Toplam Ödenek	5.378.000,00 TL
Ödenek Gönderme	2.348.000,00 TL
Toplam Ödenek Gönderme	2.348.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.348.000,00 TL
Kalan Ödenek	0 TL.
Gerçekleşme Oranı (%)	100

Merkezi araştırma laboratuvarı projesi kapsamında 300 m²'lik iklim kontrolü araştırma serasının projeye ilave edilmesiyle projenin karakteristiği revize edilmiştir.

Tablo 23. 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Harcamaları Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı (2012)	1	1.218.928,20 TL
KMÜ Rektörlüğü (Özel Kalem)	Laboratuvar Makina – Teçhizat Alımı (2012)	32	164.377,55 TL

KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde 2010 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının birinci bölümü 2011 yılında tamamlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının ikinci kısmı olan ikinci kat ve çatısının yapımına 2012 yılında başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Mustafa ÇOLAKOĞLU Furkan İnş. Müh. Plan ve Proje Taahhüt İşleri
Sözleşmenin Konusu	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İkmal İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	1.032.990,00 TL
İhale Tarihi	13.03.2012
Sözleşme Tarihi	26.04.2012
Yer Teslim Tarihi	30.04.2012
Fiilen İşe Başlama Tarihi	30.04.2012
İşin Bitim Tarihi	16.04.2013
Fiziki Gerçekleşme Oranı	70,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.




Merkezi Araştırma Laboratuvarının Görünümü

KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makina – Teçhizat Alımı

Projenin 2012 yılı ödeneğiyle Laboratuvarda ihtiyaç duyulan makina – teçhizat alımı yapılmıştır.

Proje kapsamında alınan makine – teçhizat ve satınalma maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Makine - Teçhizatın Adı	Adedi	Tutarı
(Dewar) Sıvı Azot Taşıma Kabı	1	1.534,00
Dikey Elektroforez Sistemi	1	5.310,00
Maxi Yatay Elektroforez Sistemi	1	3.528,20
Mikroprosesör Kontrollü 600 volt Elektroforez Güç Kaynağı	1	2.454,40
Mikroprosesör Kontrollü 1200 volt Elektroforez Güç Kaynağı	1	3.068,00
Portatif PH Konduktometre	2	1.888,00
Sıvı Azot Saklama Kabı	1	2.242,00
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	4	2.926,40
Şişe Üstü Dispenser	2	1.888,00
Şarjlı Pipetör	1	1.003,00
Tek Başak Harman Makinası	1	2.360,00
Terazi	1	531,00
İnkibatör	2	3.186,00
Masaüstü Mikrorantrifüj	1	1.534,00
Su Banyosu	1	1.073,80
Etüv	1	1.298,00
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	2	908,60
Soksalet Ekstraksiyon	1	1.516,30
Masa Üstü Ph ve İletkenlik Ölçüm Cihazı	1	2.320,80
Hassas Terazi	1	2.145,32
Vorteks Karıştırıcı	2	652,73
Jel Dökümantasyon Sistemi	1	85.550,00
Yüksek Sıcaklık Fırını	1	19.234,00
Döner Buharlaştırıcı	1	16.225,00
Toplam	32	164.377,55

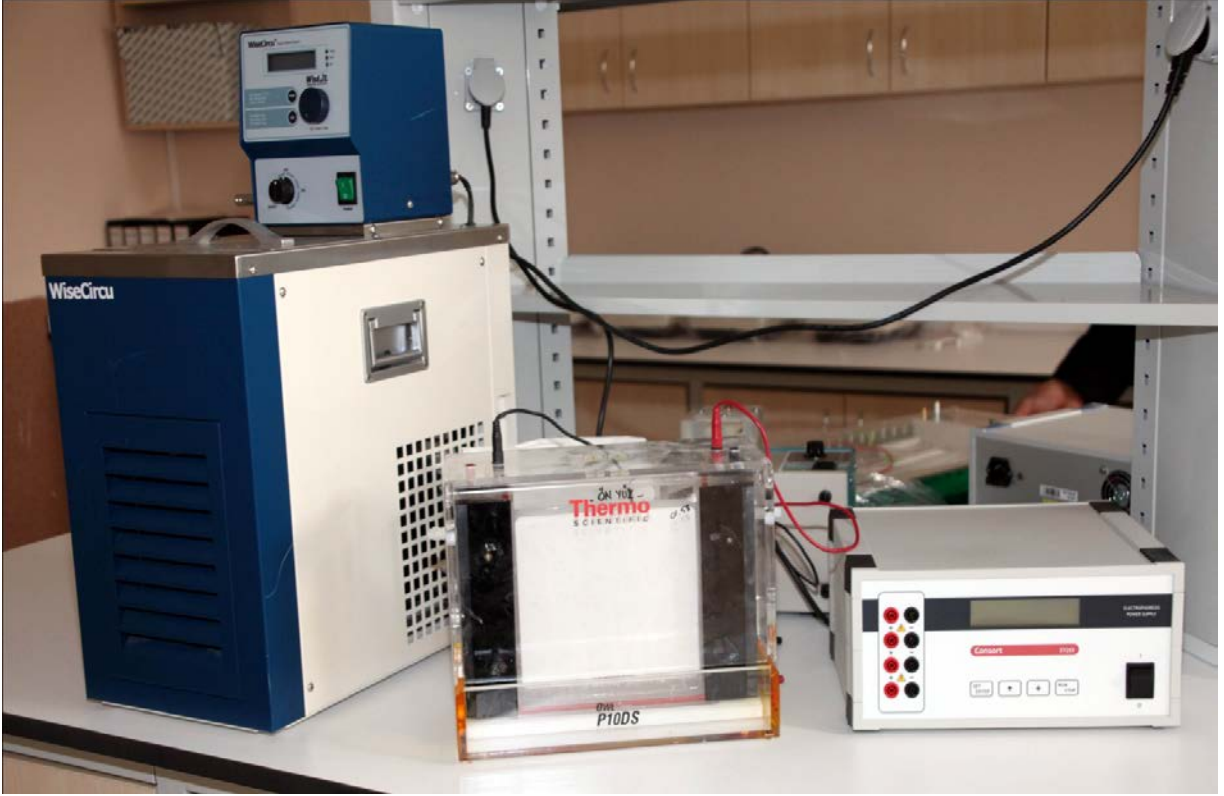

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımı





Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımı



4. Öneriler

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,
5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması, hususlarının yatırım çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

5. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*)**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2012 Yılı Fiyatlarıyla (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		99.239			43.674			18.700			18.627			20.380
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		5.378			3.020			2.348						2.348
TOPLAM	6		104.617			46.694			21.048			18.627			22.728

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

6. 2012 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu**2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)****Kuruluş Adı** : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Eğitim

2012 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2012H032240	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2012	Karaman	0	100	0	0	0	100					0
	490	2009H031580	Kampüs Altyapısı	Özel	2014	Karaman	0	16.050	5.417	0	0	11.356					6.783
	490	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2014	Karaman	0	61.114	30.257	0	0	14.556					5.818
	490	2012H032250	Muhtelif İşler	Özel	2012	Karaman	0	5.975	0	0	0	6.675					5.317
	490	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2015	Karaman	0	16.000	8.000	0	0	4.640					2.462
TOPLAM							0	99.239	43.674	0	0	37.327					20.380

Kuruluş Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)

2012 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2010K121090	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2013	Karaman	0	5.378	3.020	0	0	2.348					2.348
TOPLAM							0	5.378	3.020	0	0	2.348					2.348

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

