



2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti.....	3
2. Genel Değerlendirme	5
2.1. Uzgörüşümüz.....	5
2.2. Özgörevimiz	5
2.3. Temel Amaç ve Hedefler	5
2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları.....	9
2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi.....	10
2.6. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	13
2.6.1. Hedeflenen.....	13
2.6.2. Gerçekleşen	13
2.7. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları	14
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	14
2.1.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	20
3. Proje Uygulamaları.....	21
3.1. 2013H030210 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ.....	21
3.2. 2013H030220 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	22
3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	27
3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	35
3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	42
3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ	45
4. Öneriler.....	51
5. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*).....	52
6. 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu	53

1. Yönetici Özeti



Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetleriyle toplum bilinçlenmesi ve aydınlanması ile beşeri ve sosyal sermayenin artırılmasını sağlamak üzere kurulmuş anayasal kuruluşlardır. Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72’nci maddeyle kurulmuştur.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun onikinci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunulması modern ve kullanışlı mekânlar ile teknolojik, kaliteli ve ihtiyaçları karşılayan araç-gereçlerle mümkündür.

2013 yılı yatırım programımızda öncelikli hedefimiz önceki yıllarda olduğu gibi yapılan yatırımların tamamlanma sürelerini kısaltarak, hızla kapasite artırımı sağlamak olmuştur. Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesiyle mümkündür.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir. Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Üniversitemizin yatırımlarla ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinde ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen personele teşekkür eder, raporun ilgili taraflara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Uzgörüşümüz

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyler yetiştiren ve gıda sektörünün iyileştirilmesi ile Türk dilinin araştırılması, yaygınlaştırılması, Türkçe bilincinin yerleştirilmesi konularında öncü çalışmalar yapan “sıradan değil, aranan” bir üniversite olmaktır.

2.2. Özgörevimiz

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamayı özgörev edinmiştir.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

KURUMSALLAŞMA EKSENİ

Stratejik Amaç 1: Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan personeli tamamlamak için serbest kadroların doluluk oranını her yıl %8 artırmak
2. İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak
3. Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak
4. Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek için personele yönelik sosyal veya kültürel organizasyon sayısını her yıl %20 arttırmak
5. Üniversite adayları nezdinde tanınırlılığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının artırılması için her yıl 20.000 adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller (kitapçık, CD vb.) dağıtmak
6. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak
7. Plan dönemi sonunda idari personelin %5'inin en az bir yabancı dil yeterliliğinin olmasını sağlamak
8. 2017 yılı sonuna kadar Üniversite stadyumunu inşa ederek hizmete açmak
9. 2017 yılı sonuna kadar yüksek lisans ve doktora yapan idari personelin toplam idari personele oranını %10'a çıkarmak

10. İş ve işlemlerin daha hızlı yapılması, maliyetlerin düşürülüp verimliliğin artırılması ve güvenilir bir elektronik ortamda işlemlerin yapılabilmesi için e-imza uygulamalı e-arşiv, e-evrak sistemini 2014 yılında faaliyete geçirmek
11. 2013 yılından itibaren, her eğitim öğretim yarıyılı başında öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlemek
12. 2014 yılından itibaren, personelimize her son sınıf öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olmasını sağlamak ve 2017 yılına kadar toplam 15.500 ağaç dikimi gerçekleştirmek
13. En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek
14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak bir kimlik ortaya koymak amacıyla 2014 yılına kadar, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) için başvuru yapmak
15. Diğer üniversitelerle işbirliği yaparak idari ve akademik personelin ortak çalışmalar yapmasını sağlamak
16. 2013 yılında öz değerlendirme kurulu oluşturarak kuruma bağlılık ve isteklendirmeyi geliştirmek
17. Mezunların Üniversite'ye, birimlerine ve birbirlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılmasını sağlamak
18. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek

EĞİTİM EKSENİ

Stratejik Amaç 2: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. 2017 yılı sonunda 12.500 öğrenci sayısına ulaşmak
2. 2017 yılı sonunda öğretim üyelerinin öğretim elemanları içindeki payını %42'ye çıkarmak
3. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak
4. 2017 sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekanların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak
5. Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini %100 oranında tamamlamak
6. Öğrencilerin yönetime aktif olarak katılımını sağlamak
7. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak

8. Plan dönemi sonunda uzaktan eğitim programlarını hizmete açmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak
9. Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için sertifikalı yeni kurslar açarak plan dönemi sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını 3 katına çıkarmak
10. 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm eğitim-öğretim programlarını geliştirmek
11. Plan dönemi sonuna kadar Diploma Supplement Label ve ECTS Label uygulamasına geçmek
12. 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak “Kalite Sertifikası” almak
13. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ile personelin ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak için uluslararası değişim programlarına katılan personel ve öğrenci sayısını her yıl %15 arttırmak
14. Her yıl Karaman’da faaliyet gösteren en az 5 şirketle staj anlaşması yapmak
15. Yüksek lisans ve doktora programı açmak ve eğitimin kalitesini artırmak amacıyla plan dönemi sonuna kadar eğitim verilen her bölümde en az iki profesör veya doçentin hizmet vermesini sağlamak
16. Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanı başına öğrenci sayısını 25’te tutmak
17. 2017 yılına kadar yabancı ülkelerdeki en az 500 uluslararası öğrencinin Üniversitemizde öğrenim görmelerini sağlamak
18. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak
19. Eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ

Stratejik Amaç 3: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Tüm paydaşların yararlanabileceği uluslararası kuruluşlarca denkliği kabul edilmiş merkezi araştırma laboratuvarını 2017 yılında hizmete sunmak
2. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimini güçlendirmek
3. Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan yayın sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayı ve çeşitliliği her yıl %10 arttırmak
4. Bilimsel araştırma ve yayın sayısını her yıl %10 arttırmak

5. Bilimsel proje sayısını her yıl %10 artırmak
6. Tüm proje çıktıları ile ilgili olarak paydaşları bilgilendirmek
7. Tüm araştırma ve projelerin %5'ini disiplinler arası çalışma ile yürütmek
8. Plan dönemi sonuna kadar en az bir patent almış olmak
9. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı seminer, konferans ve toplantı vb. etkinliklere katılım sayısını her yıl %10 arttırmak
10. 2013 yılından itibaren lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların en az % 10'unun bölge ve ülke sorunları ile ilgili olmasını sağlamak

Stratejik Amaç 4: Karaman'ın ve Türkiye'nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Plan dönemi sonuna kadar Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanı sayısını 6'dan 14'e çıkarmak
2. Plan dönemi sonuna kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde tahıl, meyve-sebze, et-süt mikrobiyoloji-biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılacak Ar-Ge pilot tesisleri ve laboratuvarları kurmak
3. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlamak ve tamamlamak
4. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde toplam en az 50 makale yayınlamak
5. Plan dönemi sonuna kadar bölge gıda sanayi profiline (bisküvi-kraker-gofret, bulgur, elma vb.) uygun en az beş kongre/sempozyum/çalıştay ve konferans/panel düzenlemek
6. Gıda Mühendisliği Bölümünde üretilen bilgi ve teknolojinin bölge gıda sanayine aktarılmasını sağlamak için plan dönemi sonuna kadar "Gıda Ürünleri Geliştirme ve Teknoloji Transfer Merkezi" kurmak
7. Bölge gıda sanayinde çalışan teknik elemanların (Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Gıda Teknisyeni vb.) bilgi ve teknolojik düzeylerini hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek amacıyla her yıl eğitim seminerleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenlemek

Stratejik Amaç 5: Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresini geleneksel hale getirip iki yıl arayla düzenlemek
2. Türk Dilinin güncel sorunları üzerine yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi sonuna kadar konuyla ilgili en az bir bilgi şöleni/çalıştay düzenlemek

3. Karamanlı Türkçesi (Karamanlîca) üzerine düzenlenen çalışmalarda öncü olmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi içinde konuyla ilgili en az 5 tane konferans, panel vb. etkinlikler gerçekleştirmek
4. Plan dönemi sonuna kadar Türkçe Müzesi kurmak
5. 2017 yılından itibaren her yıl Türkçe Yetkinlik Sınavı düzenleyip başarılı olanlara “Türkçe Yetkinlik Belgesi” vermek ve belgenin ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak
6. Plan döneminde Türkçe üzerine hazırlanan çalışmaları yayınlamak, araştırmacılara destek olmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak
7. Türkçenin doğru etkili kullanılması ve tüm dünyada yaygınlaştırılması için 2017 yılı sonuna kadar en az beş tane ulusal/uluslararası organizasyon (kongre, bilgi şöleni ve yarışma) düzenlemek
8. Türkçenin kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel kullanılmasını desteklemek amacıyla yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında Türkçeyi en iyi kullanan radyo ve televizyon sunucuları ile şair ve yazarlardan plan dönemi sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak olan oylama sonucunda belirlenenlere geleneksel olarak ödül, onurluk vb. vermek
9. Karaman ve Türkiye’de iş yerlerine Türkçe isim verilmesi konusunda karar alınması için Belediyelerle ve Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yürütmek
10. Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde plan dönemi sonuna kadar bir Çeviri Merkezi kurmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2013 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 22.500.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 17.776.392,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 40.276.392,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları (TL)

Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2013 Yılı Program Ödeneği	2013 Yılı Revizeli Ödenek	2013 Yılı Harcama
Eğitim	Özel Bütçe	94.460.000,00	22.000.000,00	39.776.392,00	24.151.348,92
DKH	Özel Bütçe	6.152.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOPLAM	Özel Bütçe	100.612.000,00	22.500.000,00	40.276.392,00	24.651.348,92


2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı:

Tablo 2. Taşınmazların Dağılımı (m ²)				
Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	3.721.201,15	-	3.730.268,15
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazım karabekir Yerleşkesi	-	63.188,00	-	63.188,00
Genel Toplam	63.854,11	3.784.389,15	-	3.848.240,26

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Tablo 3. Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)				
Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	10.746	300	627	11.673
Eğitim	26.280	2.270	3.300	31.150
Sosyal	12.080	495	325	12.900
Spor	3.695	-	-	3.695
Diğer	38.535	3435	1.578	43.548
Genel Toplam	91.336	7.000	5.830	104.166

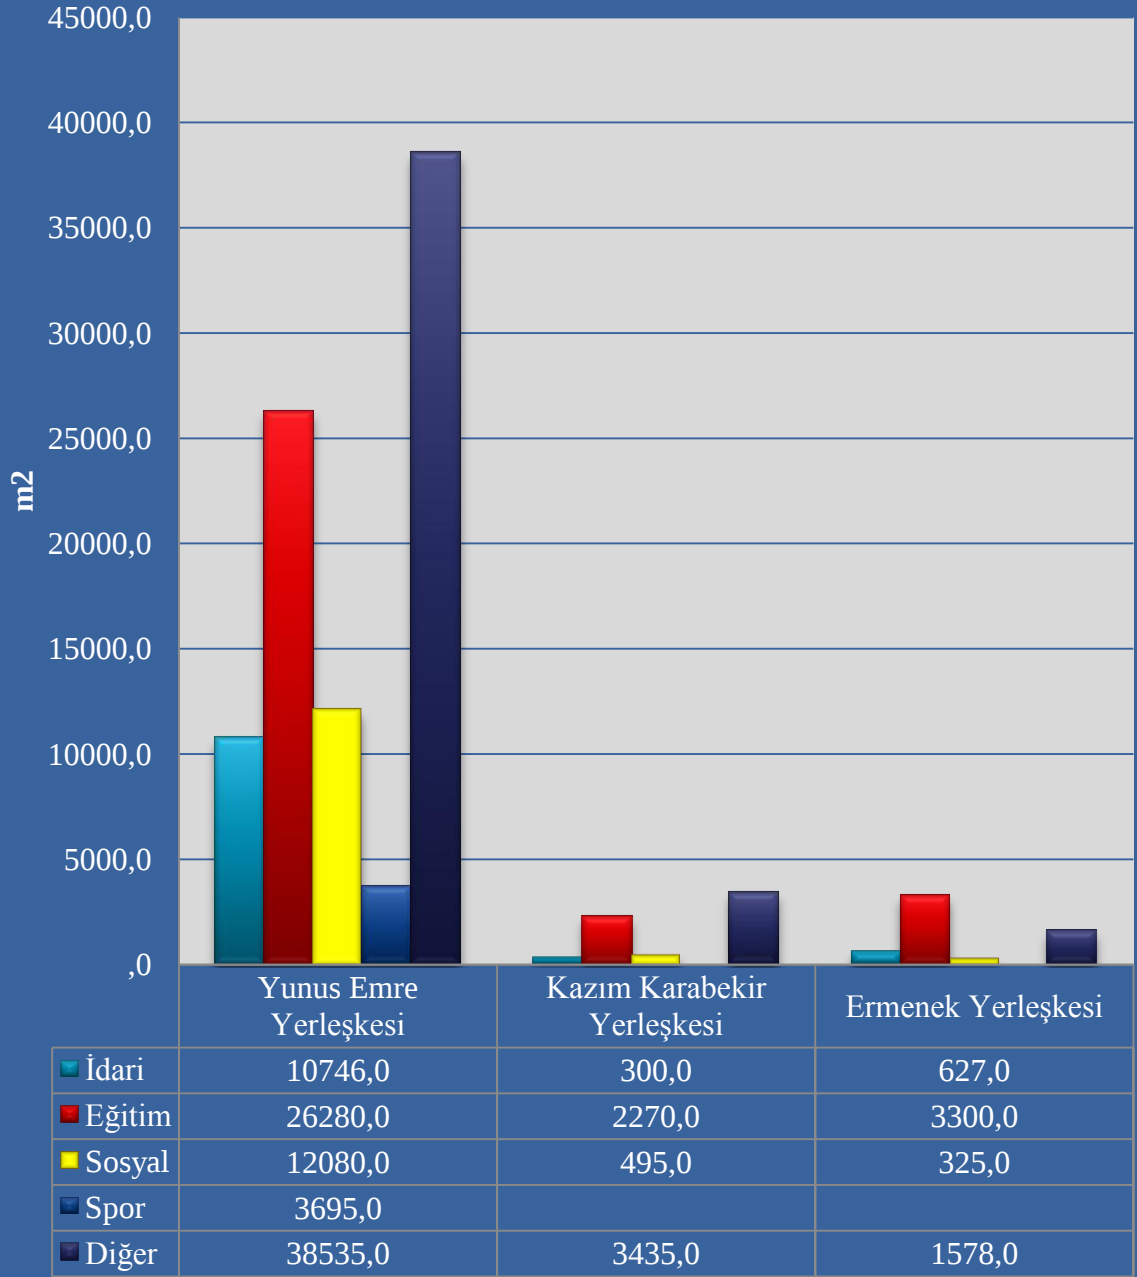

Şekil 1. Kapalı Mekanların Dağılımı (m²)

Üniversitemiz kapalı mekânların hizmet alanlarına göre dağılımı:

Tablo 4. Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Diğer	Toplam
Rektörlük Hizmet Binası	5.000					5.000
Kamil Özdağ Fen Fakültesi	200	2.890	-	55	1.490	4.635
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.056	5.859	-	57	6.028	13.000
Edebiyat Fakültesi	379	3.121	-	110	3.030	6.640
Mühendislik Fakültesi	526	6.643	-	226	13.040	20.435
Sağlık Yüksekokulu	508	1.914	-	60	1.118	3.600
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	21	1.695	-	177	1.474	3.367
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	163	1.182	-	-	1.753	3.798
Ermenek Meslek Yüksekokulu	627	3.300	-	325	1.578	5.830
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu	300	2.270	-	495	3.435	7.000
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	140	514	-	-	1.246	1.900
BESYO Spor Salonu			1.146			1.146
Kütüphane Hizmet Binası	270	1.165	-	-	1.740	3.175
Kreş	66	536	-	-	653	1.255
Konukeyi	85			541	504	1.130
Çarşı, Yemekhane ve Kafeterya	534	-	-	10.451	2.015	13.000
1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu	43	61	2.549	403	4.444	7.500
Isı Merkezi	1.755					1.755
TOPLAM	11.673	31.150	3.695	12.900	43.548	104.166
TOPLAM KAPALI ALAN	104.166 m²					

*6.400 m²'lik Ermenek Meslek Yüksekokulu yurt binası Kredi ve Yurtlar Kurumunun kullanımına verilmiştir.

2.6. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**2.6.1. Hedeflenen**

Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe (DKH) bir adet olmak üzere toplam altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin taşıt, makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile fiziki mekân inşaatlarının yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüd projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2013 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2013 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri, hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;

- ✓ Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası, Sağlık Yüksekokulu Ek Binası, Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatları ile Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro, Ermenek Meslek Yüksekokulu İhata Duvarı ve Çevre Düzenlemesi işlerinin yapımına devam edilmektedir.
- ✓ Yunus Emre Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı, Asfalt Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşİ, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Yapımı İşİ, Rektörlük Konutu Yapım İşİ tamamlanmıştır.
- ✓ Merkezi Araştırma Laboratuvarı binası birinci katı ile İklim Kontrollü Araştırma Serası yapımı tamamlanmış, proje kapsamında laboratuvar makine-teçhizatı alınarak Merkezi Araştırma Laboratuvarımız faaliyete başlanmıştır.

- ✓ Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin kullanmış oldukları binaların büyük bakım – onarımı için iki ayrı ihale yapılmış ve tüm bakım – onarım işleri yıl içerisinde tamamlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro ve bina mefruşat alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürmüştür. Bütçemiz T cetvelinde alımı öngörülen bir adet minibüs alımı yapılmıştır.
- ✓ Kütüphanemizin elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımları hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu aşamada 767 adet yerli kitap, 21 adet yabancı yayın ve 3 adet elektronik veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir.


2.7. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 22.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde finansman fazlasından ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 40.276.392,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 24.651.348,92 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 61,20'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	3.750.000,00	995.000,00	4.745.000,00	4.519.841,72	95,25
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	0,00	100.000,00	65.096,42	65,10
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	17.600.000,00	14.894.562,00	32.494.562,00	17.129.581,69	52,72
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.050.000,00	1.886.830,00	2.936.830,00	2.936.829,09	100
Toplam		22.500.000,00	17.776.392,00	40.276.392,00	24.651.348,92	61,20

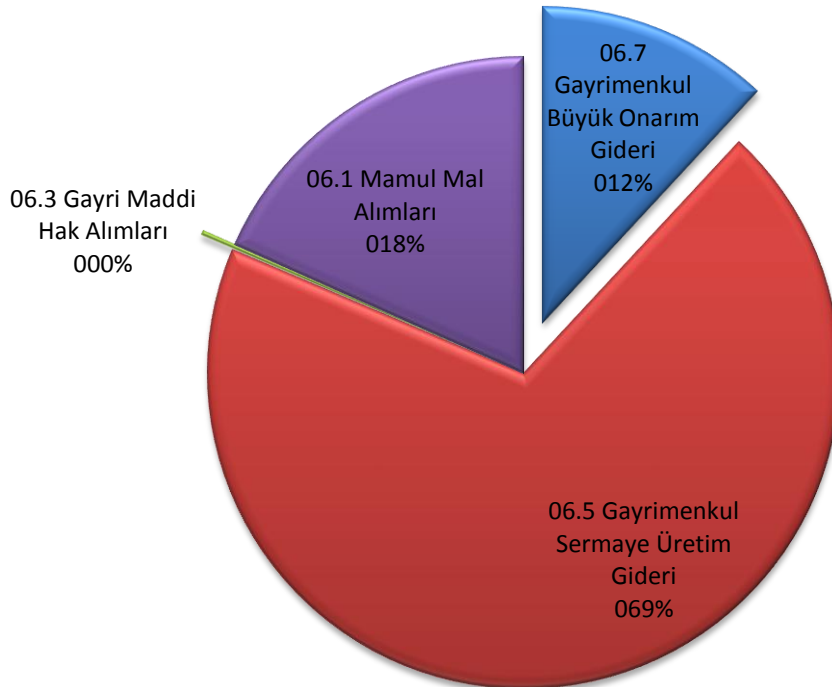

Şekil 2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Ekonomik Kod					Açıklama	Tutarı	Proje Numarası
830	6				Sermaye Giderleri	24.651.348,92	
830	6	1			Mamul Mal Alımları	4.519.841,72	
830	6	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.583.514,07	
830	6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	213.525,91	2013H030220
830	6	1	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	862.105,64	2013H030220
830	6	1	1	5	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	277.553,36	2013H030220
830	6	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	230.329,16	2013H030220
830	6	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.816.327,91	
830	6	1	2	1	Büro Makineleri Alımları	21.790,23	2013H030220
830	6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	136.798,82	2013H030220
830	6	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	2.328.811,36	2010K121090 2013H030220
830	6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	152.810,00	2013H030220
830	6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	176.117,50	2013H030220
830	6	1	4		Taşıt Alımları	82.133,78	
830	6	1	4	1	Kara Taşıtı Alımları	82.133,78	2013H030220
830	6	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	37.865,96	
830	6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	15.652,28	2013H030220
830	6	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	22.213,68	2013H030220
830	6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	65.096,42	
830	6	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	65.096,42	
830	6	3	1	1	Bilgisayar Yazılı Alımları	65.096,42	2013H030220
830	6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.129.581,69	
830	6	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	35.636,00	
830	6	5	1	1	Proje Giderleri	35.636,00	2013H030210
830	6	5	7		Müteahhitlik Giderleri	17.093.945,69	
830	6	5	7	1	Hizmet Binası	12.040.037,63	2009H031590
830	6	5	7	3	Lojmanlar	748.491,33	2009H031590
830	6	5	7	4	Sosyal Tesisler	2.065.151,21	2010H050170
830	6	5	7	7	Yol Yapım Giderleri	116.899,67	2009H031580
830	6	5	7	90	Diğerleri	2.123.365,85	2009H031580
830	6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.936.829,09	
830	6	7	7		Müteahhitlik Giderleri	2.936.829,09	
830	6	7	7	1	Hizmet Binası	2.936.829,09	2013H030220

Üniversitemiz 2013 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. Revizyon (2013H030210 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2013H030210
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2013-2013
Proje Tutarı	100.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2013 Yılı Yatırımı	100.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan	0,00 TL
2013 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2013 Yılı Yatırımı Revizyonu	0,00 TL

Tablo 8. Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2015
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	12.944.000,00 TL
2013 Yılı Yatırımı	4.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan**	2.214.291,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	6.214.291,00 TL
2013 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	22.500.000,00 TL
2013 Yılı Yatırımı Revizyonu	6.214.291,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 9. Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2015
Proje Tutarı	61.114.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	43.215.000,00 TL
2013 Yılı Yatırımı	11.500.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	9.070.440,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	20.570.440,00 TL
2013 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2013 Yılı Yatırımı Revizyonu	20.570.440,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 10. Revizyon (2013H030220 Muhtelif İşler)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2013H030220
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2013-2013
Proje Tutarı	4.400.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2013 Yılı Yatırımı	4.400.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	2.881.830,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	7.281.830,00 TL
2013 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	7.281.830,00 TL
2013 Yılı Yatırımı Revizyonu	7.281.830,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 11. Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)


Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2015
Proje Tutarı	16.960.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	9.750.000,00 TL
2013 Yılı Yatırımı	2.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	3.609.831,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	5.609.831,00 TL
2013 Yılı Proje Tutarı Revizyonu*	0,00 TL
2013 Yılı Yatırımı Revizyonu	5.609.831,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 12. Revizyon (2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı)

Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010K121090
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2013
Proje Tutarı	6.152.000,00 TL
2012 Yılı Kümülatif Harcama	5.652.000,00 TL
2013 Yılı Yatırımı	500.000,00 TL
Eklenen Aktarma	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	500.000,00 TL
2013 Yılı Proje Tutarı Revizyonu*	0,00 TL
2013 Yılı Yatırımı Revizyonu	0,00 TL

Şekil 3. Yatırım Harcamalarının Projeler İtibariyle Dağılımı

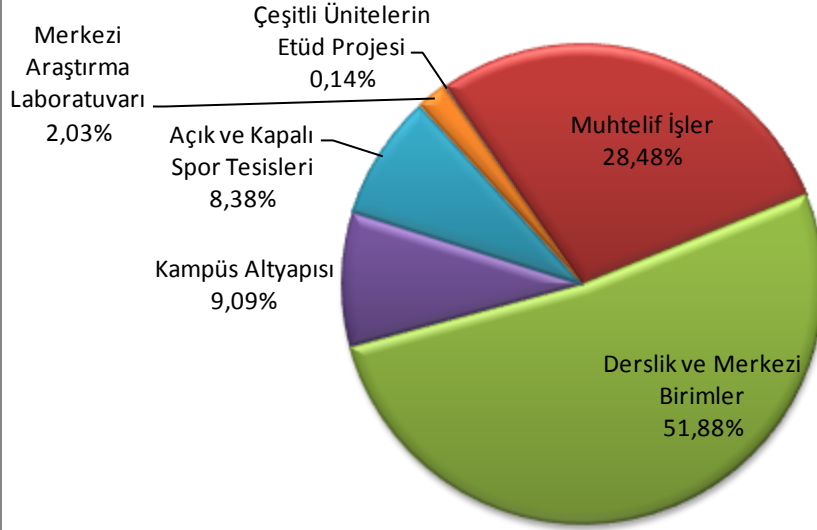

2.1.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Çalışanların özlük hakları yetersizdir.
- ✓ Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yoktur.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesini geciktirmektedir.
- ✓ Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personel nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalmaktadır.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2013H030210 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2013 yılı bütçemize 100.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği ayrılmış olup, herhangi bir ekleme yapılmamıştır.

Tablo 13. 2013H030210 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2013
Proje Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	100.000,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Toplam Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Harcama	35.636,00 TL
Kalan Ödenek	64.364,00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	35,64

Tablo 14. 2013H030210 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	BESYO ve Kütüphane Binası Zemin Etüdü	1	4.720,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Eski BESYO Binası Çevre Düz. Projesi Alımı	1	11.800,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Amfi Tiyatro Statik Projesi Alımı	1	4.661,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Rektörlük Konutu ve Sağlık YO Ek Binası Zemin Etüdü	1	3.540,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Rektörlük Konutu ve Sağlık YO Ek Binası Statik-Elektrik Projesi Alımı	1	10.915,00

3.2. 2013H030220 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Muhtelif İşler Projesi için 2013 yılı Bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.400.000,00 TL olup, likit karşılığı 2.881.830,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 7.281.830,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 7.021.767,23 TL' dir. 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15. 2013H030220 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	B.On-Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yz.Alt.Bak.On. İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt
Proje Başlama Yılı	2013
Proje Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	7.281.830,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	4.400.000,00 TL
Eklenen **	2.881.830,00 TL
Toplam Ödenek	7.281.830,00 TL
Harcama	7.021.767,23 TL
Kalan Ödenek	260.062,77 TL
Gerçekleşme Oranı %	96,43

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 16. 2013H030220 Nolu Muhtelif İşler Projesi Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Mefruşat Alımları	2502	1.136.893,59
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Makine-Teçhizat Alımları	68	316.384,88
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımı	4	65.096,42
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	80	124.644,82
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımı	1	82.133,78
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuar Cihazları Alımı	89	1.828.811,36
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımı	788	15.652,28
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Veri Tabanı Alımı	3	22.213,68
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Mefruşat Alımları	1452	448.628,41
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	14	32.324,92
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	13	12.154,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bina Bakım – Onarımı Yapım İşİ	2	2.936.829,09
TOPLAM		5016	7.021.767,23



Laboratuvar Makine-Tec̢izat Alımı



Spor Malzemesi Alımları



Laboratuvar Mefruşatı Alımı



Büro-Okul Mefruşatı Alımı



Bir Adet Taşıt Alımı



Basılı Yayın Alımı

3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

Kampüs Altyapısı Projesi için 2013 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 2.214.291,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 6.214.291,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 2.240.265,52 TL'dir. 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	KnI. El. Su Çev. D., D. Gaz. Yol Isı Mrk. Art. Trf. Tlf.
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	22.500.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	4.000.000,00 TL
Eklenen **	2.214.291,00 TL
Toplam Ödenek	6.214.291,00 TL
Harcama	2.240.265,52 TL
Kalan Ödenek	3.974.025,48 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	36,05

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 18. 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	168.236,73
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşİ	1	1.653.245,61
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	116.899,67
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek MYO İhata Duvarı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	301.883,51
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşİ	1	0,00

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize ilişkin yatırımların detayları ve gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir.

Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesiyle yerleşke alanı içerisinde rektörlük binası, kütüphane binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çevresinde gezi ve dolaşma alanları, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için sosyal aktivite yapabilecekleri alanlar oluşturulmuştur. İşin ihalesi 2012 yılında yapılarak yer teslimi yapılmış ve inşaat başlanmıştır. İşin yapımı 2013 yılında tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Alp Yapı İnşaat Mimarlık Öztekin Çökelez
Sözleşmenin Konusu	Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.282.000,00 TL
İhale Tarihi	14.02.2012
Sözleşme Tarihi	15.03.2013
Yer Teslim Tarihi	05.11.2010
Filen İşe Başlama Tarihi	20.03.2012
İşin Bitim Tarihi	01.04.2013
Harcama Tutarı	1.226.852,28 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	95,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı



Yunus Emre Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi

Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımıyla yerleşke alanındaki bütün tesislerin tek noktadan çevre dostu doğalgazla ısıtılması sağlanacak ve yakıt israfı ile çevre kirliliğini engellenecektir. İşin ihalesi 2010 yılında yapılarak yer teslimi yapılmış ve inşaat başlamıştır. 2011 yılında yapımına devam edilmiştir. 28.05.2012 tarihinde yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşme fesh edilmiştir.

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşine ilişkin ikinci ihale 2012 yılı Eylül ayında yapılmış ve Kasım ayında yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaatla başlanmıştır. 2012 yılında yapımına devam edilmiştir. 04/09/2013 tarihinde tamamlanarak, tesis hizmete alınmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Klitem Müh. Ltd. Şti./Zilan Peyzaj İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İş
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	2.590.000,00 TL
İhale Tarihi	27.09.2012
Sözleşme Tarihi	02.11.2012
Yer Teslim Tarihi	07.11.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	07.11.2010
İşin Bitim Tarihi	04/09/2013
Harcama Tutarı	948.215,39 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.



1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İş

Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesine Ana Giriş Kapısı, Kampüs İçi Asfalt Yol Yapımı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılmış ve 05/09/2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İş projesine uygun olarak 24/02/2013 tarihinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Üniversitemiz ana giriş kapısına kavuşmuş ve mimarisiyle bir kimlik kazanmıştır. Binalar arası yolların asfaltlanması ile peyzaj ve çevre aydınlatmaları yapılması sonucunda Üniversitemizin yaşanabilirliği artmış, daha güzel, konforlu ve estetik bir yapıya kavuşmuştur.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	3.988.400,00 TL
İhale Tarihi	03.08.2011
Sözleşme Tarihi	24.08.2011
Yer Teslim Tarihi	05.09.2011
Filen İşe Başlama Tarihi	05.09.2011
İşin Bitim Tarihi	24/02/2013
Harcama Tutarı	116.899,67
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.



Yunus Emre Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı



Yunus Emre Yerleşkesi Asfalt Yol ve Çevre Düzenlemesi

Ermenek Meslek Yüksekokulu İhata Duvarı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Ermenek Meslek Yüksekokulunun çevresinin ihata duvarı ile çevrilmesiyle güvenlik altına alınmasının sağlanması ve yerleşke alanın çevre düzenlenmesi yapılarak yaşanılabilir bir alan oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla 06/06/2013 tarihinde ihalesi yapılan işin 15/07/2013 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2014 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kayaoğulları Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Ermenek Meslek Yüksekokulu İhata Duvarı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	397.000,00 TL
İhale Tarihi	06/06/2013
Sözleşme Tarihi	11/07/2013
Yer Teslim Tarihi	15/07/2013
Fİilen İşe Başlama Tarihi	15/07/2013
İşin Bitim Tarihi	11/02/2014
Harcama Tutarı	301.883,51 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	65,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.



Ermenek MYO İhata Duvarı ve Çevre Düzenlemesi

Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde öğrencilerimizin sosyal ve kültürel aktivitelerinin artırılması amacıyla amfi tiyatro yapılması planlanmış, 28/08/2013 tarihinde ihalesi yapılmış, 18/11/2013 tarihinde işe başlanmıştır. İhale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama gecikmiş bu nedenle 2013 yılında bu iş için herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Emrah Konukseven – Konukseven Mühendislik
Sözleşmenin Konusu	Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	2.170.000,00 TL
İhale Tarihi	28/08/2013
Sözleşme Tarihi	14/11/2013
Yer Teslim Tarihi	18/11/2013
Filen İşe Başlama Tarihi	18/11/2013
İşin Bitim Tarihi	13/09/2014
Harcama Tutarı	0,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	0,00
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.

3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 yılı bütçemize ayrılan ödenek 11.500.000,00 TL olup, 9.070.440,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, toplam ödenek 20.570.440,00 TL olmuştur. 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca detay programı yapılmış olan proje kapsamında, toplam harcama 12.788.528,96 TL'dir. Detay projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 19. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	61.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	11.500.000,00 TL
Eklenen	9.070.440,00 TL
Toplam Ödenek	20.570.440,00 TL
Harcama	12.788.528,96 TL
Kalan Ödenek	7.781.911,04 TL

Tablo 20. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası Yapım İşİ	1	7.628.372,20
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO Binası İnşaatı Yapım İşİ	1	4.003.112,07
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Rektörlük Konutu Yapım İşİ	1	748.491,33
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşİ	1	408.553,36

Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası Yapım İşi

Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası yapım işinin 27/07/2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 02/10/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2013 yılında yapımı devam eden proje 2014 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Prosan Müh. Proje ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu Binası Yapımı
İhale Bedeli	14.694.000,00 TL
İhale Tarihi	27.07.2012
Sözleşme Tarihi	28.09.2012
Yer Teslim Tarihi	02.10.2012
Fiilen İşe Başlama Tarihi	02.10.2012
İşin Bitim Tarihi	20.11.2014
Toplam Gecikme Cezası	0,00
Harcama	7.628.372,20 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	45,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunacaktır.

FİZİKİ MEKAN	Adet	M²
1000 Kişilik Konferans Salonu	1	1.230
Öğretim Üyesi Odası	20	444
Toplantı Salonu	4	120
Büro	49	874
Derslik	38	3.818
İdari Personel Odası	15	333
Seminer Odası	1	139
Diğer	-	7.042
Toplam	-	14.000



Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu



Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu

Kazım Karabekir MYO Binası İnşaatı Yapım İşi

Eğitim verilen mevcut binanın yetersiz ve uygun koşullarda eğitim-öğretim yapmaya müsait olmamasından dolayı, yeni bir eğitim ve tesis binası yapılarak öğrencilerin daha verimli alanlarda eğitim-öğretim görmeleri hedeflenmiştir. 14/02/2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 20/04/2012 tarihinde yapımına başlanmış olup, 23/07/2013 tarihinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Hasan SARİMEHMETOĞLU-Onur Yapı/Sisan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Kazım Karabekir MYO Binası İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	5.242.630,00 TL
İhale Tarihi	14.02.2012
Sözleşme Tarihi	18.04.2012
Yer Teslim Tarihi	20.04.2012
Filen İşe Başlama Tarihi	20.04.2012
İşin Bitim Tarihi	23.07.2013
Harcama	4.003.112,07 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Kazım Karabekir MYO binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunmuştur.

FİZİKİ MEKAN	Adet	M²
Akademik Personel Odası	50	750
İdari Personel Odası	9	300
Konferans Salonu	1	130
Bilgisayar Laboratuvarı	4	190
Derslik	21	1.700
Kafeterya	1	135
Mutfak/Yemekhane	1	360
Diğer	-	3.435
Toplam	-	7.000



Kazım Karabekir MYO



Kazım Karabekir MYO

KMÜ Rektörlük Konutu Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde Üniversitemiz Rektörü tarafından kullanılmak üzere Rektörlük Konutunun yapımı planlanmış, 09/04/2013 tarihinde ihalesi yapılmış, 01/07/2013 tarihinde yapımına başlanmıştır. % 99 oranında tamamlanan proje geçici kabul aşamasındadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Karman İnş.San. ve Özel Öğrenci Yurdu Tic.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Rektörlük Konutu Binası Yapım İşi
İhale Bedeli	593.432,00 TL
İhale Tarihi	09/04/2013
Sözleşme Tarihi	16/05/2013
Yer Teslim Tarihi	20/05/2013
Fiilen İşe Başlama Tarihi	20/05/2013
İşin Bitim Tarihi	20/01/2014
Harcama	748.491,33 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	99,00
İnşaatın Durumu	Geçici Kabul Aşamasında



Rektörlük Konutu

KMÜ Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Sağlık Yüksekokulu binasının projesine göre ½ oranında yapılması nedeniyle, kalan ½ oranındaki ek binanın yapılması planlanmış, 29/03/2013 tarihinde ihalesi yapılmış, 01/07/2013 tarihinde yapımına başlanmıştır. 2014 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kalo İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşi
İhale Bedeli	1.849.000,00 TL
İhale Tarihi	29/03/2013
Sözleşme Tarihi	27/06/2013
Yer Teslim Tarihi	01/07/2013
Fiilen İşe Başlama Tarihi	01/07/2013
İşin Bitim Tarihi	25/06/2014
Harcama	408.553,36 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	18,73
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.



Sağlık Yüksekokulu Ek Bina

3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2013 yılı bütçemize ayrılan ödenek 2.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde 3.609.831,00 TL tutarında ödenek eklemesi yapılmış, eklemeler sonucunda 2013 yılı toplam ödeneği 5.609.831,00 TL olmuştur. Toplam harcama 2.065.151,21 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 21. 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	16.960.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.000.000,00 TL
Eklenen	3.609.831,00 TL
Toplam Ödenek	5.609.831,00 TL
Harcama	2.065.151,21 TL
Kalan Ödenek	3.544.679,79 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	36,81

Tablo 22. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşİ	1	2.065.151,21

Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi

Bulunduğu kentin sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimine katkı sağlamayı kendine görev edinen Üniversitemiz, kalkınmada öncelikli küçük bir anadolu kenti olan Karaman'ın sosyal, kültürel ve sportif yönden eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilerimizin sportif faaliyetlerden azami ölçüde faydalanması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimizin uygulamalı derslerini yapmaları ile ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenecek müsabaka ve faaliyetlerde Üniversitemizi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeleri amacıyla Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılmasına karar vermiştir. 28/09/2012 yılında ihalesi yapılan proje ihale süreci uzadığından 02/01/2013 tarihinde yapımına başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	ARC İnş. Proje Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi
İhale Bedeli	5.234.000,00 TL
İhale Tarihi	28/09/2012
Sözleşme Tarihi	28/12/2012
Yer Teslim Tarihi	02/01/2013
Fiilen İşe Başlama Tarihi	02/01/2013
İşin Bitim Tarihi	16/05/2014
Harcama	2.065.151,21 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	33,44
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.

Projenin gerçekleştirilmesiyle;

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin alanlarında yetkin birer spor insanı olarak mezun olmaları,
 2. Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası düzenlenen su sporlarında derece alınması,
 3. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sportif ve sağlıklı bireyler olmaları,
 4. Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası düzenlenen su sporlarında takımlarımızın mücadelesi sonucunda Üniversitemizin ve Karaman'ın tanıtılması,
 5. Ülkemiz milli takımına sporcular yetiştirerek Ülkemizin sportif başarılarına katkıda bulunulması,
 6. Yüzme bilincinin artırılması,
- hedeflenmektedir.



Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatı

Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunacaktır.

Fiziki Mekân	Adet	M ²
25x16 Yüzme Havuzu	1	400
16x6,50 Antreman Havuzu	1	104
Soyunma Odası	2	140
Jimnastik Salonu	1	95
Antronör Odası	2	40
Doktor Odası	1	25
Ofis	6	90
288 Kişilik Tribün	1	-
Dinlenme Salonu	10	296

3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 2013 yılı bütçemize ayrılan ödenek 500.000,00 TL'dir. Toplam harcama 500.000,00 TL'dir. Projeden yapılan harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 23. 2010K121090 Nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2013
Proje Tutarı	6.152.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	500.000,00 TL
Toplam Ödenek	500.000,00 TL
Ödenek Gönderme	500.000,00 TL
Toplam Ödenek Gönderme	500.000,00 TL
Kalan Ödenek	0 TL.
Gerçekleşme Oranı (%)	100

Merkezi araştırma laboratuvarı projesi kapsamında 300 m²'lik iklim kontrolü araştırma serasının projeye ilave edilmesiyle projenin karakteristiği revize edilmiştir. Projesi hazırlanan iklim kontrollü araştırma serası ile 2012 yılında ihale edilen laboratuvar binasının birinci katının yapımı tamamlanmıştır.

Tablo 24. 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Harcamaları Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı	1	1.232.883,09
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İklim Kontrollü Araştırma Serası Yapımı	32	243.552,00
KMÜ Rektörlüğü (Özel Kalem)	Laboratuvar Makina – Teçhizat Alımı	32	1.621.040,39

KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde 2010 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının birinci bölümü 2011 yılında tamamlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının ikinci kısmı olan birinci kat ve çatısının yapımına 2012 yılında başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Mustafa ÇOLAKOĞLU Furkan İnş. Müh. Plan ve Proje Taahhüt İşleri
Sözleşmenin Konusu	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İkmal İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	1.032.990,00 TL
İhale Tarihi	13/03/2012
Sözleşme Tarihi	26/04/2012
Yer Teslim Tarihi	30/04/2012
Fiilen İşe Başlama Tarihi	30/04/2012
İşin Bitim Tarihi	29/03/2013
Harcama	1.232.883,09 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.



Merkezi Araştırma Laboratuvarının Görünümü

KMÜ İklim Kontrollü Araştırma Serası Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarıyla bir bütün halinde çalışacak iklim kontrollü araştırma serası yapımı planlanmış, 25/02/2013 tarihinde ihalesi yapılmış, 04/04/2013 tarihinde yapımına başlanmış ve 29/08/2013 tarihinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Emin Cesur – Mevlüt Soyer Adi Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	İklim Kontrollü Araştırma Serası Yapım İşi
İhale Bedeli	206.400,00 TL
İhale Tarihi	25/02/2013
Sözleşme Tarihi	01/04/2013
Yer Teslim Tarihi	04/04/2013
Fiilen İşe Başlama Tarihi	04/04/2013
İşin Bitim Tarihi	29/08/2013
Harcama	243.552,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.



Merkezi Araştırma Laboratuvarı İklim Kontrollü Araştırma Serası


KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makina – Teçhizat Alımı

Projenin 2013 yılı ödeneğiyle Laboratuvarı ihtiyacı duyulan makina – teçhizat alımı yapılmıştır.

Proje kapsamında alınan makine – teçhizat ve satınalma maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Makine - Teçhizatın Adı	Adedi	Tutarı
Otomatik Işınlama Sistemi ve Radyasyon Kaynağı	1	143.960,00
Yeni Nesil DNA Dizileme Cihazı	1	349.920,00
RT-PCR Cihazı Rotorgene-Q 2 Plex+HRM	1	46.460,00
Q-PCR 36-72 Rotor	1	3.759,48
Isıtıcı Blok	1	2.100,00
Quick Spin Cihazı	2	708,00
Masaüstü İnkibatörlü Şaker	1	13.924,00
Vorteks	2	1.026,02
Mekanik Karıştırıcı	1	2.000,00
Pipet Seti	1	1.729,99
Fluorometer Quantification System	1	7.003,80
Midi Yatay Elektroforez Cihazı	1	2.301,00
Midi Dikey Elektroforez Cihazı	1	4.425,00
Thorlabs LSB04-Alens D=25.4 mm 35pe NBK7 planoCX, PlanoCC,BİCX, BİCC A Coat	1	4.997,30
APS-3030DD AA Tech Regulated DC Power	1	167,56
Fluke 179 Dijital Multimetre	1	1.070,26
Dikey Elektroforez Penguin Dual Gel System	1	4.130,00
Elektroforez için Güç Kaynağı	1	4.867,50
Hassas Terazisi Kapasite 3200 g. Hassasiyet 0,01 g.	1	1.150,50
Pipet Seti 05-10 UL - 20-200 UL - 100-1000 UL	1	1.681,50
Vortex, MX-S- Ayarlanabilir hızlı	1	324,50
Su Banyosu 22 Litre, ortam sıcaklığı +5-100 derece, LCD Ekran, zaman ayarlı	1	1.888,00

Glove Box'a (Eldivenli Kabin) Entegreli İnce Film Kaplama ve Ölçüm Sistemi	1	328.040,00
X-Işını Difraksiyon Cihazı	1	684.990,00
Otomatik Pipet 0,2,5 µl Aralığında	1	603,99
Otomatik Pipet 500-5000 µl Aralığında	1	604,00
Tek Bitki Harman Makinesi	1	7.207,99
TOPLAM	29	1.621.040,39

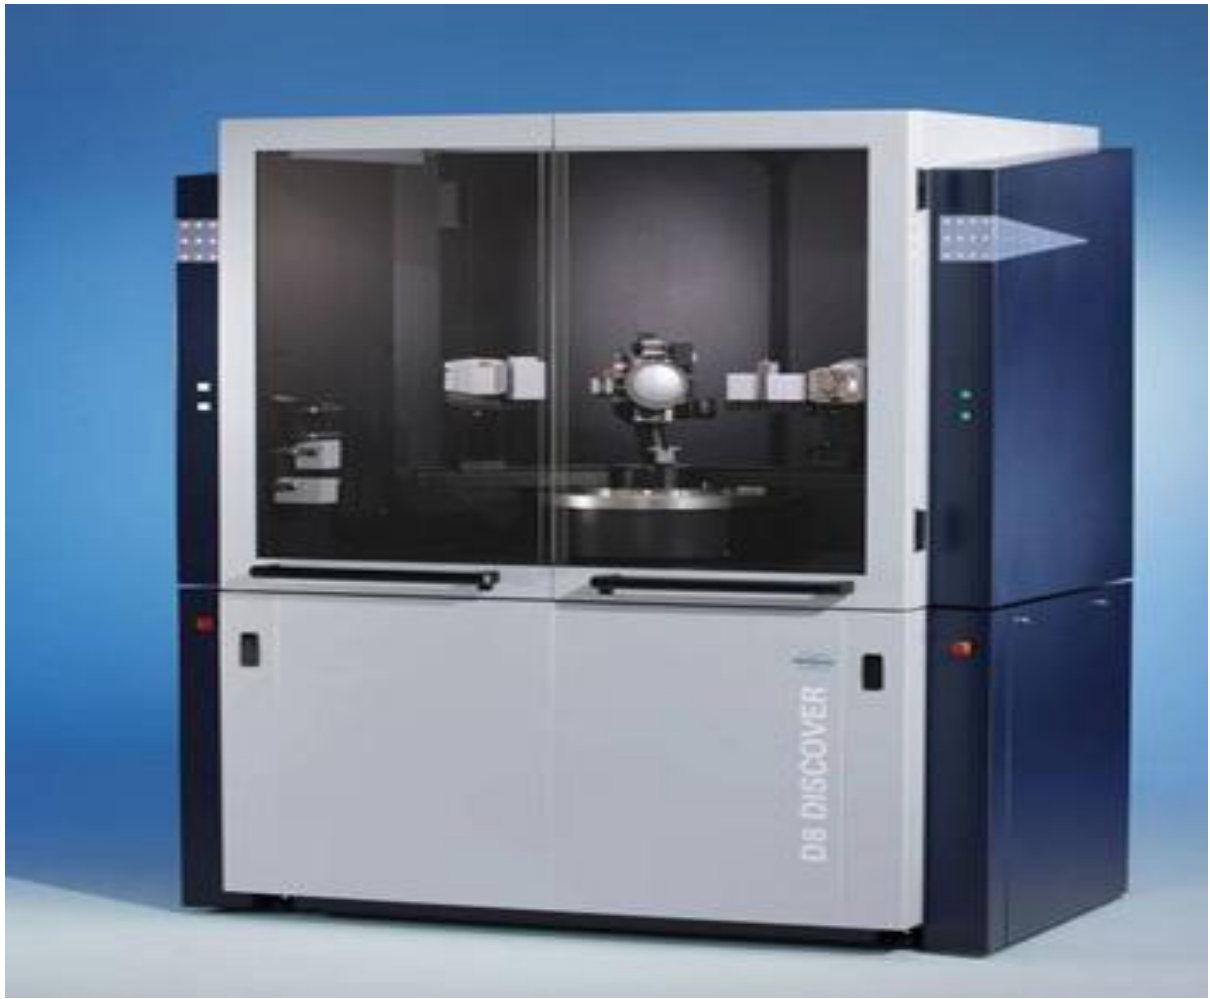


Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımı



Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımı



Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımı

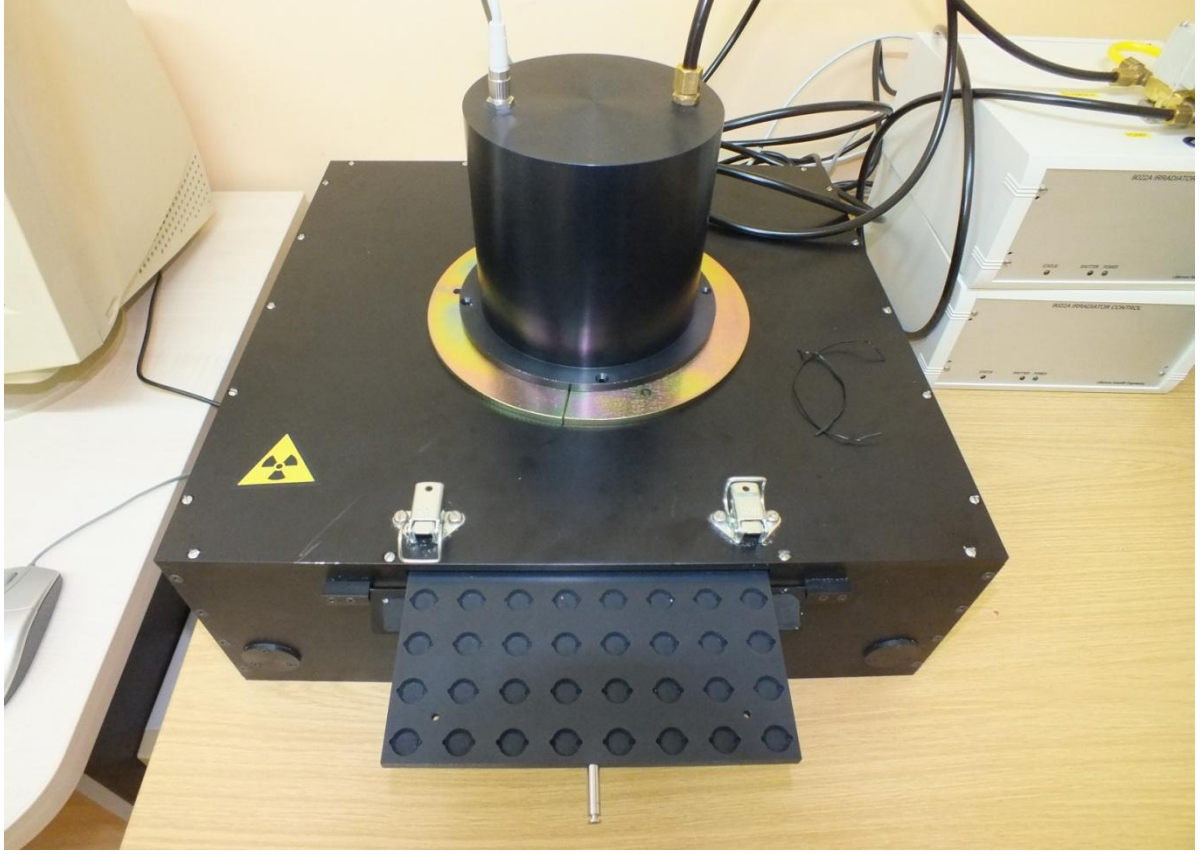

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımı

4. Öneriler

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,
5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması, hususlarının yatırım çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

5. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*)**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2013 Yılı Fiyatlarıyla (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		107.841		65.909	65.909		22.000	22.000		17.775	17.775		24.152	24.152
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		6.152		5.652	5.652		500	500		0	0		500	500
TOPLAM	6		113.993		71.561	71.561		22.500	22.500		17.775	17.775		24.652	24.652

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

6. 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu**2013 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)****Kuruluş Adı** : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Eğitim

2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2013H030210	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2013	Karaman	0	100	0	0	0	100					36
	490	2009H031580	Kampüs Altyapısı	Özel	2015	Karaman	0	22.500	12.944	0	0	6.214					2.240
	490	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2015	Karaman	0	61.000	43.215	0	0	20.570					12.789
	490	2013H030220	Muhtelif İşler	Özel	2013	Karaman	0	7.281	0	0	0	7.281					7.022
	490	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2015	Karaman	0	16.960	9.750	0	0	5.610					2.065
TOPLAM							0	107.841	65.909	0	0	39.775					24.152

Kuruluş Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)

2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2010K121090	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2013	Karaman	0	6.152	5.652	0	0	500					500
TOPLAM							0	6.152	5.652	0	0	500					500

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

