

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2015 Yılı

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2016 – KARAMAN

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti.....	6
2. Genel Değerlendirme	8
2.1. Uz görüşümüz	8
2.2. Özgörevimiz	8
2.3. Temel Amaç ve Hedefler	8
2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları	12
2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi.....	13
2.6. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	16
2.6.1. Hedeflenen	16
2.6.2. Gerçekleşen.....	16
2.7. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları	17
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	17
2.1.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	23
3. Proje Uygulamaları	24
3.1. 2015H032860 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	24
3.2. 2015H032870 MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	25
3.3. 2015H032880 YAYIN ALIM PROJESİ	29
3.4. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	30
3.5. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	41
3.6. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ	48
4. Öneriler.....	53
5. 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti.....	54
6. 2015 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu	55

ŞEKİLLER TABLOSU

Şekil 1: Kapalı Mekanların Dağılımı (m2)	14
Şekil 2: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı	18
Şekil 3: Yatırım Harcamalarının Projeler İtibariyle Dağılımı.....	23
Şekil 4: Büro Mefruşatı Alımı.....	27
Şekil 5: Laboratuvar Cihazları Alımı	27
Şekil 6: Büro Makinaları Alımı.....	28
Şekil 7: Okul Mefruşatı Alımı.....	28
Şekil 8: Isı Merkezi Dış Görünüm	33
Şekil 9: Isı Merkezi İç Görünüm.....	33
Şekil 10: Amfi Tiyatro	35
Şekil 11: Amfi Tiyatro	35
Şekil 12: Eski BESYO Binası Çevre Düzenlemesi.....	36
Şekil 13: Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Projesi	38
Şekil 14: Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi	39
Şekil 15: Sağlık Yüksekokulu Ek Bina	42
Şekil 16: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.....	43
Şekil 17: Kütüphane Binası.....	45
Şekil 18: İslami İlimler Fakültesi Projesi	47
Şekil 19: İslami İlimler Fakültesi	47
Şekil 20: Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	50
Şekil 21: Stadyum Projesi	52
Şekil 22: Stadyum Projesi	52

ÇİZELGELER TABLOSU

Çizelge 1: Yatırım Finansman Kaynakları.....	12
Çizelge 2: Taşınmazların Dağılımı (m2).....	13
Çizelge 3: Kapalı Mekânların Dağılımı (m2)	13
Çizelge 4: Üniversitemiz Kapalı Mekanların Dağılımı (m ²).....	15
Çizelge 5: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı	17
Çizelge 6: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması	19
Çizelge 7: Revizyon (2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)	20
Çizelge 8: Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı).....	20
Çizelge 9: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)	21
Çizelge 10: Revizyon (2015H032870 Muhtelif İşler).....	21
Çizelge 11: Revizyon (2015H032880 Yayın Alımı).....	22
Çizelge 12: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	22
Çizelge 13: 2015H032860 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	24
Çizelge 14: 2015H032860 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı.....	24
Çizelge 15: 2015H032870 Nolu Muhtelif İşler Projesi	25
Çizelge 16: 2015H031510 Nolu Muhtelif İşler Projesi Harcamalarının Detayı	26
Çizelge 17: 2015H032880 Nolu Yayın Alımı Projesi	29
Çizelge 18: 2015H032880 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı.....	29
Çizelge 19: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	30
Çizelge 20: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı	31
Çizelge 21: Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İşİ.....	32
Çizelge 22: Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşİ	34
Çizelge 23: Eski Besyo Binası Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ.....	36
Çizelge 24: KMÜ Kampüs İçi Asfalt Yol Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ.....	37
Çizelge 25: KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	38
Çizelge 26: KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ	40

Çizelge 27: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler	41
Çizelge 28: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı	41
Çizelge 29: KMÜ Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşİ	42
Çizelge 30: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İşİ	43
Çizelge 31: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fiziki mekan artışı.....	44
Çizelge 32: Kütüphane Binası Yapım İşİ	45
Çizelge 33: KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşİ	46
Çizelge 34: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	48
Çizelge 35: 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı	48
Çizelge 36: Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşİ	49
Çizelge 37: Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu binası kapalı mekanları	50
Çizelge 38: 5000 Kişilik Olimpik Stadyum Yapım İşİ	51
Çizelge 39: 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	54
Çizelge 40: 2015 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu	55

KISALTMALAR

BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu,

KMÜ: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

1. Yönetici Özeti



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 12'nci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleriyle rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunulması, modern ve kullanışlı mekânlar ile teknolojik, kaliteli ve ihtiyaçları karşılayan araç ve gereçlerle mümkündür.

Geride bıraktığımız yılda estetik yönden güzel bir yaşama alanı sağlamak amacıyla yerleşkeler içinde çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Karaman'ın sosyal, kültürel ve sportif yönden eksiklerinin giderilmesi, öğrencilerimizin sportif faaliyetlerden faydalanabilmeleri ve ulusal ve uluslararası faaliyetlerde Üniversitemizi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeleri amacıyla güneş enerjili yarı olimpik yüzme havuzu yapılarak 2015 yılında hizmete alınmıştır. Ayrıca yüzme havuzu ve kapalı spor salonumuzla entegre edilmiş Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası yapılmıştır.

Üniversitemizin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması amacıyla ihaleye çıkmış ve yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. Akademik ve idari personelin ihtiyaç duydukları kaynakları temin edebilmesi için kütüphane binası ve öğrencilerimize daha verimli eğitim alanları sağlanabilmesi için İslami İlimler Fakültesi binası inşaatına ise başlanmış olup 2016 yılı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü öğrencilerine daha iyi eğitim verebilmek ve üniversitemizin spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla 5000 kişilik sentetik yüzeyli atletizm pisti ve futbol sahası yapılması için 2015 yılı aralık ayında sözleşme imzalanmıştır.

Birimlerin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları ile yayın ihtiyaçları 2015 yılı bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmıştır. 2015 yılı yatırım programında yer alan projelere ait bilgiler, yapılan harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içeriğinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Uzgörüşümüz

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyler yetiştiren ve gıda sektörünün iyileştirilmesi ile Türk dilinin araştırılması, yaygınlaştırılması, Türkçe bilincinin yerleştirilmesi konularında öncü çalışmalar yapan “sıradan değil, aranan” bir üniversite olmaktır.

2.2. Özgörevimiz

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamayı özgörev edinmiştir.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

KURUMSALLAŞMA EKSENİ

Stratejik Amaç 1: Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan personeli tamamlamak için serbest kadroların doluluk oranını her yıl %8 artırmak
2. İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak
3. Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak
4. Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek için personele yönelik sosyal veya kültürel organizasyon sayısını her yıl %20 arttırmak
5. Üniversite adayları nezdinde tanınırlılığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının artırılması için her yıl 20.000 adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller (kitapçık, CD vb.) dağıtmak
6. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak
7. Plan dönemi sonunda idari personelin %5'inin en az bir yabancı dil yeterliliğinin olmasını sağlamak
8. 2017 yılı sonuna kadar Üniversite stadyumunu inşa ederek hizmete açmak
9. 2017 yılı sonuna kadar yüksek lisans ve doktora yapan idari personelin toplam idari personele oranını %10'a çıkarmak

10. İş ve işlemlerin daha hızlı yapılması, maliyetlerin düşürülüp verimliliğin artırılması ve güvenilir bir elektronik ortamda işlemlerin yapılabilmesi için e-imza uygulamalı e-arşiv, e-evrak sistemini 2014 yılında faaliyete geçirmek
11. 2013 yılından itibaren, her eğitim öğretim yarıyılı başında öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlemek
12. 2014 yılından itibaren, personelimizle her son sınıf öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olmasını sağlamak ve 2017 yılına kadar toplam 15.500 ağaç dikimi gerçekleştirmek
13. En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek
14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak bir kimlik ortaya koymak amacıyla 2014 yılına kadar, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) için başvuru yapmak
15. Diğer üniversitelerle işbirliği yaparak idari ve akademik personelin ortak çalışmalar yapmasını sağlamak
16. 2013 yılında öz değerlendirme kurulu oluşturarak kuruma bağlılık ve isteklendirmeyi geliştirmek
17. Mezunların Üniversite'ye, birimlerine ve birbirlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılmasını sağlamak
18. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek

EĞİTİM EKSENİ

Stratejik Amaç 2: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. 2017 yılı sonunda 12.500 öğrenci sayısına ulaşmak
2. 2017 yılı sonunda öğretim üyelerinin öğretim elemanları içindeki payını %42'ye çıkarmak
3. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak
4. 2017 sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekanların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak
5. Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini %100 oranında tamamlamak
6. Öğrencilerin yönetime aktif olarak katılımını sağlamak
7. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak

8. Plan dönemi sonunda uzaktan eğitim programlarını hizmete açmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak
9. Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için sertifikalı yeni kurslar açarak plan dönemi sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını 3 katına çıkarmak
10. 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm eğitim-öğretim programlarını geliştirmek
11. Plan dönemi sonuna kadar Diploma Supplement Label ve ECTS Label uygulamasına geçmek
12. 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak “Kalite Sertifikası” almak
13. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ile personelin ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak için uluslararası değişim programlarına katılan personel ve öğrenci sayısını her yıl %15 arttırmak
14. Her yıl Karaman’da faaliyet gösteren en az 5 şirketle staj anlaşması yapmak
15. Yüksek lisans ve doktora programı açmak ve eğitimin kalitesini artırmak amacıyla plan dönemi sonuna kadar eğitim verilen her bölümde en az iki profesör veya doçentin hizmet vermesini sağlamak
16. Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanı başına öğrenci sayısını 25’te tutmak
17. 2017 yılına kadar yabancı ülkelerdeki en az 500 uluslararası öğrencinin Üniversitemizde öğrenim görmelerini sağlamak
18. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak
19. Eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ

Stratejik Amaç 3: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Tüm paydaşların yararlanabileceği uluslararası kuruluşlarca denkliği kabul edilmiş merkezi araştırma laboratuvarını 2017 yılında hizmete sunmak
2. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimini güçlendirmek
3. Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan yayın sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayı ve çeşitliliği her yıl %10 arttırmak
4. Bilimsel araştırma ve yayın sayısını her yıl %10 arttırmak

5. Bilimsel proje sayısını her yıl %10 artırmak
6. Tüm proje çıktıları ile ilgili olarak paydaşları bilgilendirmek
7. Tüm araştırma ve projelerin %5'ini disiplinler arası çalışma ile yürütmek
8. Plan dönemi sonuna kadar en az bir patent almış olmak
9. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı seminer, konferans ve toplantı vb. etkinliklere katılım sayısını her yıl %10 arttırmak
10. 2013 yılından itibaren lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların en az % 10'unun bölge ve ülke sorunları ile ilgili olmasını sağlamak

Stratejik Amaç 4: Karaman'ın ve Türkiye'nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Plan dönemi sonuna kadar Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanı sayısını 6'dan 14'e çıkarmak
2. Plan dönemi sonuna kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde tahıl, meyve-sebze, et-süt mikrobiyoloji-biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılacak Ar-Ge pilot tesisleri ve laboratuvarları kurmak
3. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlamak ve tamamlamak
4. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde toplam en az 50 makale yayınlamak
5. Plan dönemi sonuna kadar bölge gıda sanayi profiline (bisküvi-kraker-gofret, bulgur, elma vb.) uygun en az beş kongre/sempozyum/çalıştay ve konferans/panel düzenlemek
6. Gıda Mühendisliği Bölümünde üretilen bilgi ve teknolojinin bölge gıda sanayine aktarılmasını sağlamak için plan dönemi sonuna kadar "Gıda Ürünleri Geliştirme ve Teknoloji Transfer Merkezi" kurmak
7. Bölge gıda sanayinde çalışan teknik elemanların (Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Gıda Teknisyeni vb.) bilgi ve teknolojik düzeylerini hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek amacıyla her yıl eğitim seminerleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenlemek

Stratejik Amaç 5: Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresini geleneksel hale getirip iki yıl arayla düzenlemek
2. Türk Dilinin güncel sorunları üzerine yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi sonuna kadar konuyla ilgili en az bir bilgi şöleni/çalıştay düzenlemek

3. Karamanlı Türkçesi (Karamanlîca) üzerine düzenlenen çalışmalarda öncü olmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi içinde konuyla ilgili en az 5 tane konferans, panel vb. etkinlikler gerçekleştirmek
4. Plan dönemi sonuna kadar Türkçe Müzesi kurmak
5. 2017 yılından itibaren her yıl Türkçe Yetkinlik Sınavı düzenleyip başarılı olanlara “Türkçe Yetkinlik Belgesi” vermek ve belgenin ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak
6. Plan döneminde Türkçe üzerine hazırlanan çalışmaları yayınlamak, araştırmacılara destek olmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak
7. Türkçenin doğru etkili kullanılması ve tüm dünyada yaygınlaştırılması için 2017 yılı sonuna kadar en az beş tane ulusal/uluslararası organizasyon (kongre, bilgi şöleni ve yarışma) düzenlemek
8. Türkçenin kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel kullanılmasını desteklemek amacıyla yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında Türkçeyi en iyi kullanan radyo ve televizyon sunucuları ile şair ve yazarlardan plan dönemi sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak olan oylama sonucunda belirlenenlere geleneksel olarak ödül, onurluk vb. vermek
9. Karaman ve Türkiye’de iş yerlerine Türkçe isim verilmesi konusunda karar alınması için Belediyelerle ve Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yürütmek
10. Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde plan dönemi sonuna kadar bir Çeviri Merkezi kurmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 27.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 19.764.039,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 46.764.039,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynaklarıyla karşılanmıştır.

Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2015 Yılı Program Ödeneği	2015 Yılı Revizeli Ödenek	2015 Yılı Harcama
Eğitim	Özel Bütçe	164.131.304,00	27.000.000,00	46.764.039,00	32.568.322,37
TOPLAM	Özel Bütçe	164.131.304,00	27.000.000,00	46.764.039,00	32.568.322,37

Çizelge 1: Yatırım Finansman Kaynakları

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı:


Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	1.734.717,67	-	1.743.784,67
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazım karabekir Yerleşkesi	36.322,00	24.102,00	-	60.424,00
Genel Toplam	100.176,11	1.758.819,67	-	1.858.995,78

Çizelge 2: Taşınmazların Dağılımı (m2)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	6.755	-	-	6.755
Eğitim	92.125	7.000	5.830	104.955
Sosyal	13.728	-	-	13.728
Spor	13.533	-	-	13.533
Diğer	1.130	-	-	1.130
Genel Toplam	127.271	7.000	5.830	140.101

Çizelge 3: Kapalı Mekânların Dağılımı (m2)

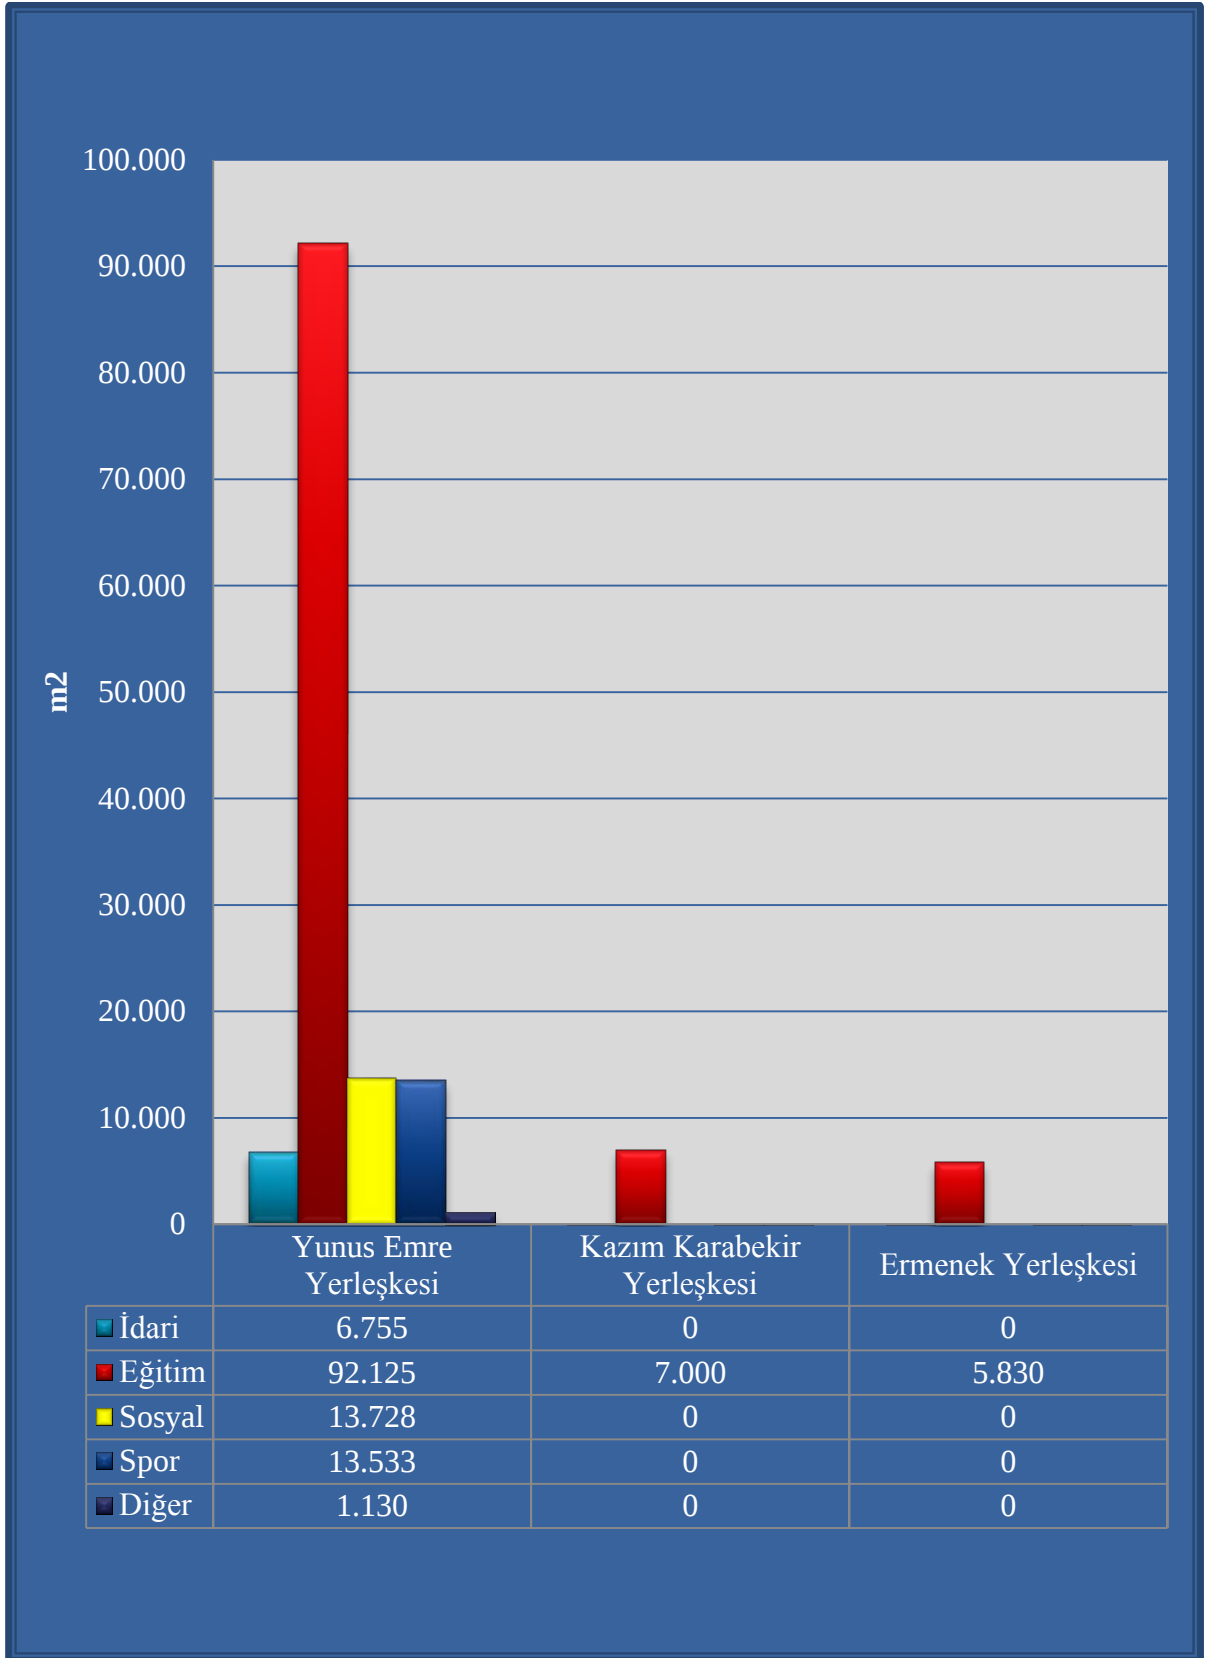

Şekil 1: Kapalı Mekanların Dağılımı (m2)

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Barınma
Rektörlük Hizmet Binası	5.000				
Isı Merkezi	1.755				
Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu		17.420			
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		13.000			
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635			
Mühendislik Fakültesi		20.435			
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		9.270			
Sağlık Yüksekokulu		3.600			
Ermenek Meslek Yüksekokulu		4.325			
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu		7.000			
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		3.615			
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		6.640			
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		3.170			
Halıcılık-Seramik Atölyesi		3.798			
Makine-Otomotiv Atölyesi		3.367			
Ermenek Meslek Yüksekokulu Atölye Binası		1.505			
Kütüphane Hizmet Binası		3.175			
BESYO Spor Salonu			1.146		
1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu			7.500		
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu			5.082		
Amfi Tiyatro				533	
Yemekhane Kafeterya Çarşı Binası				13.000	
Misafirhane					1.130
TOPLAM	6.755	104.955	13.728	13.533	1.130

Çizelge 4: Üniversitemiz Kapalı Mekanların Dağılımı (m²)

2.6. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**2.6.1. Hedeflenen**

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile fiziki mekân inşaatlarının yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüd projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2015 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2015 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri, hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;

- ✓ Sağlık Yüksekokulu Ek Binası, Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro, Eski Besyo Binası Çevresi Çevre Düzenlemesi işi, KMÜ Kampüs İçi Asfalt, Yol ve Çevre Düzenlemesi işi ve Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanmıştır.
- ✓ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası, Kütüphane Binası, İslami İlimler Fakültesi, Uygulama Oteli Çevre Düzenlemesi yapım işi, 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal yapım işi, 5000 Kişilik Olimpik Stadyum işlerinin yapımına devam edilmektedir.
- ✓ Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin kullanmış oldukları binaların büyük bakım – onarımı için ihale yapılmış ve tüm bakım – onarım işleri yıl içerisinde tamamlanmıştır.
- ✓ Üniversitemizde yapımına başlanan İslami İlimler Fakültesi için proje hizmet alımı gerçekleştirilmiş ve stadyum için zemin etüdü yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro ve bina mefruşat alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürmüştü ve gerekli alımlar yapılmıştır.

- ✓ Kütüphanemizin elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımları hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu aşamada 864 adet yerli kitap, 318 adet yabancı yayın, 472 e-kitap ve 4 adet elektronik veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir.


2.7. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 27.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde finansman fazlasından ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 46.764.039,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 32.189.133,03 TL'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 68,83'tür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	2.940.000,00	240.000,00	3.180.000,00	3.017.613,01	82,97
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	60.000,00	0,00	60.000,00	4.200,00	7,00
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	22.000.000,00	18.275.735,00	40.275.735,00	26.557.159,94	65,94
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	1.248.304,00	3.248.304,00	2.989.349,42	92,03
Toplam		27.000.000,00	19.764.039,00	46.764.039,00	32.568.322,37	69,64

Çizelge 5: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı

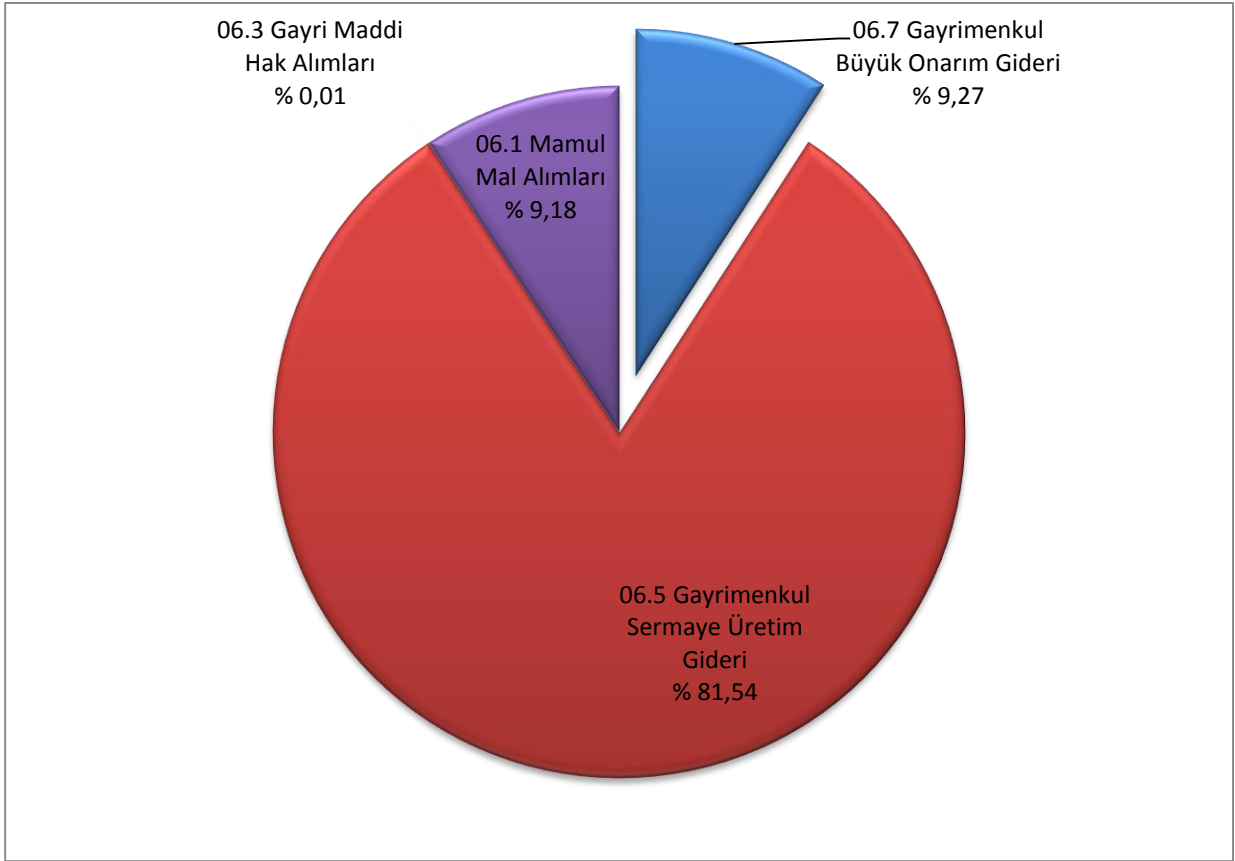

Şekil 2: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı

Ekonomik Kod					Açıklama	Tutarı	Proje Numarası
830	6				Sermaye Giderleri	32.568.322,37	
830	6	1			Mamul Mal Alımları	3.017.613,01	
830	6	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	528.402,90	
830	6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	57.424,70	2015H032870
830	6	1	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	267.193,97	2015H032870
830	6	1	1	5	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	137.423,39	2015H032870
830	6	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	66.360,84	2015H032870
830	6	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.050.641,55	
830	6	1	2	1	Büro Makineleri Alımları	47.411,84	2015H032870
830	6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	425.307,37	2015H032870
830	6	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	873.592,94	2015H032870
830	6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	17.346,00	2015H032870
830	6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	686.983,40	2015H032870
830	6	1	5		İş Makinası Alımları	195.317,30	
830	6	1	5	30	Hareketli İş Makinası Alımları	195.317,30	2015H032870
830	6	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	243.251,26	
830	6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	31.703,59	2015H032880
830	6	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	211.547,67	2015H032880
830	6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	4.200,00	
830	6	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	4.200,00	
830	6	3	1	1	Bilgisayar Yazılı Alımları	4.200,00	2015H032870
830	6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	26.557.159,94	
830	6	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	24.190,00	
830	6	5	1	1	Proje Giderleri	24.190,00	2015H032860
830	6	5	7		Müteahhitlik Giderleri	26.532.969,94	
830	6	5	7	1	Hizmet Binası	20.058.550,08	2009H031590
830	6	5	7	4	Sosyal Tesisler	626.800,53	2009H031580 2010H050170
830	6	5	7	7	Yol Yapım Giderleri	3.658.238,37	2009H031580
830	6	5	7	90	Diğerleri	2.189.380,96	2009H031580
830	6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.989.349,42	
830	6	7	7		Müteahhitlik Giderleri	2.989.349,42	
830	6	7	7	1	Hizmet Binası	1.679.140,00	2015H032870
830	6	7	7	90	Diğerleri	1.310.209,42	2015H032870

Çizelge 6: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2015H032860
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2015-2015
Proje Tutarı	100.000,00 TL
2014 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2015 Yılı Yatırımı	100.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan	0,00 TL
2015 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	100.000,00 TL
2015 Yılı Yatırımı Revizyonu	100.000,00 TL

Çizelge 7: Revizyon (2015H032860 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2016
Proje Tutarı	34.500.000,00 TL
2014 Yılı Kümülatif Harcama	24.645.000,00 TL
2015 Yılı Yatırımı	5.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan**	4.324.020,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	9. 324.020,00 TL
2015 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2015 Yılı Yatırımı Revizyonu	9. 324.020,00 TL

Çizelge 8: Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı)

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yükleyen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2016
Proje Tutarı	100.000.000,00 TL
2014 Yılı Kümülatif Harcama	74.551.000,00 TL
2015 Yılı Yatırımı	13.900.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	13.380.732,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	27.280.732,00 TL
2015 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	110.000.000,00 TL
2015 Yılı Yatırımı Revizyonu	27.280.732,00 TL

Çizelge 9: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yükleyen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2015H032870
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2015-2015
Proje Tutarı*	4.643.000,00 TL
2014 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2015 Yılı Yatırımı	4.600.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	1.488.304,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	6.088.304,00 TL
2015 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	6.088.304,00 TL
2015 Yılı Yatırımı Revizyonu	6.088.304,00 TL

Çizelge 10: Revizyon (2015H032870 Muhtelif İşler)

* 43.000,00 TL taşıt hibesi dâhildir.

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.


Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2015H032880
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2015-2015
Proje Tutarı	400.000,00 TL
2014 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2015 Yılı Yatırımı	400.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan	0,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	400.000,00 TL
2015 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	400.000,00 TL
2015 Yılı Yatırımı Revizyonu	400.000,00 TL

Çizelge 11: Revizyon (2015H032880 Yayın Alımı)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2015
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
2014 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2015 Yılı Yatırımı	3.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	570.983,00 TL
Düşülen	0,00 TL
Serbest	3.570.983,00 TL
2015 Yılı Proje Tutarı Revizyonu*	13.000.000,00 TL
2015 Yılı Yatırımı Revizyonu	3.570.983,00 TL

Çizelge 12: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

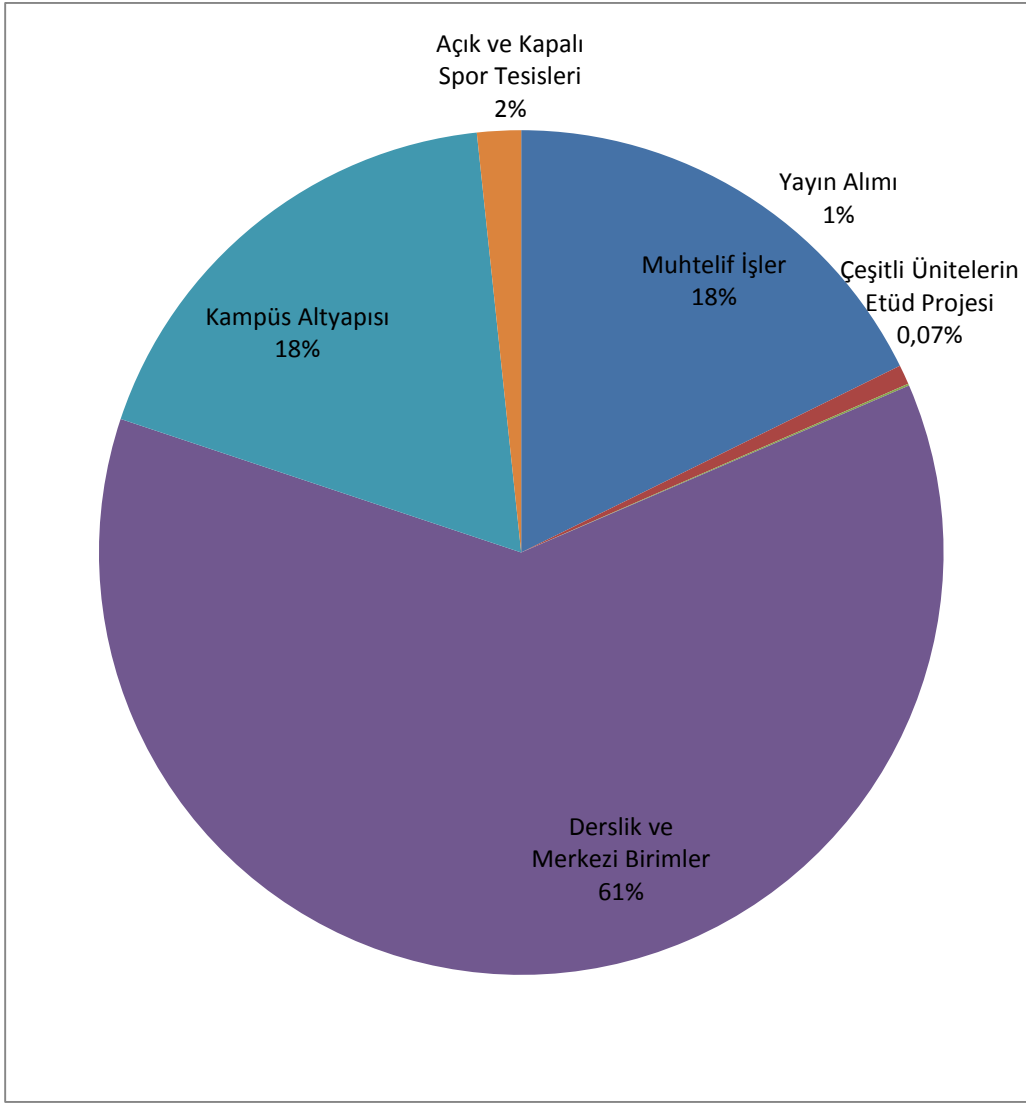

Şekil 3: Yatırım Harcamalarının Projeler İtibariyle Dağılımı

2.1.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesini geciktirmektedir.

✓ Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personel nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalmaktadır.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2015H032860 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2015 yılı bütçemize 100.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği ayrılmış olup, yılı içinde herhangi bir ekleme ve düşme işlemi yapılmamıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	100.000,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Toplam Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Harcama	24.190,00 TL
Kalan Ödenek	75.810,00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	24,19

Çizelge 13: 2015H032860 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Tablo 14. 2015H032860 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Stadyum için Zemin Etüdü	1	13.570,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İslami İlimler Fakültesi için Proje Hizmet Alımı	1	10.620,00

Çizelge 14: 2015H032860 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı

3.2. 2015H032870 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Muhelif işler projesi için 2015 yılı Bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.600.000,00 TL olup, likit karşılığı 1.488.304,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 6.088.304,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 5.767.911,17 TL' dir. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	B.On-Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yz.Alt.Bak.On. İd.Yen., Taşıt
Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı*	4.643.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	4.600.000,00 TL
Eklenen **	1.488.304,00 TL
Toplam Ödenek	6.088.304,00 TL
Harcama***	5.767.911,17
Kalan Ödenek	699.582,17 TL
Gerçekleşme Oranı %	94,74

Çizelge 15: 2015H032870 Nolu Muhelif İşler Projesi

* 43.000,00 TL taşıt hibesi dâhildir.

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

*** Muhelif işler projesi kapsamında büro ve okul mefruşatı ile bilgisayar alımlarına ilişkin 379.189,34 TL'lik ödeme mahsup döneminde yapılmıştır.

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	208	57.424,70
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	18	47.411,84
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	688	267.193,97
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımı	1	4.200,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	126	417.615,95
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımı	123	659.618,54
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hareketli İş Makinası Alımları	3	195.317,30
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımı	3	17.346,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazları Alımı	15	873.592,94
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	24	66.360,84
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşat Alımı	322	137.423,39
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	3	7.691,52
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	13	27.364,86
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Büyük Bakım-Onarım	3	2.989.349,42
TOPLAM		888	5.767.911,17

Çizelge 16: 2015H031510 Nolu Muhtelif İşler Projesi Harcamalarının Detayı



Şekil 4: Büro Mefruşatı Alımı



Şekil 5: Laboratuar Cihazları Alımı



Şekil 6: Büro Makinaları Alımı



Şekil 7: Okul Mefruşatı Alımı

3.3. 2015H032880 YAYIN ALIM PROJESİ

Yayın Alımı Projesi için 2015 yılı Bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 400.000,00 TL olup, yılı içinde herhangi bir ekleme ve düşme işlemi yapılmamıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Küt.Yay.Al.
Proje Başlama Yılı	2015
Proje Bitiş Yılı	2015
Proje Tutarı*	400.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	400.000,00 TL
Eklenen **	0,00 TL
Toplam Ödenek	400.000,00 TL
Harcama	243.251,26 TL
Kalan Ödenek	156.748,74 TL
Gerçekleşme Oranı %	60,81

Çizelge 17: 2015H032880 Nolu Yayın Alımı Projesi

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	1.182	31.703,59
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	476	211.547,67

Çizelge 18: 2015H032880 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

3.4. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

Kampüs Altyapısı Projesi için 2015 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup, 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/8 maddesi uyarınca likit karşılığı 4.324.020,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 9.324.020,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 5.927.634,13 TL'dir. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Kn1. El. Su Çev. D., D. Gaz. Yol Isı Mrk. Art. Trf. Tlf, Gnş Enj. Sis.
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	34.500.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	5.000.000,00 TL
Eklenen **	4.324.020,00 TL
Toplam Ödenek	9.324.020,00 TL
Harcama	5.927.634,13 TL
Kalan Ödenek	3.396.385,87 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	63,57

Çizelge 19: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İşİ	1	883.164,11
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşİ	1	80.014,80
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Eski Besyo Binası Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	514.552,91
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Kampüs İçi Asfalt Yol Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	3.658.238,37
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	791.663,94
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ	1	0,00

Çizelge 20: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize ilişkin yatırımların detayları ve gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir.

Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İşİ

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımıyla yerleşke alanındaki bütün tesislerin tek noktadan çevre dostu doğalgazla ısıtılması sağlanacak ve yakıt israfı ile çevre kirliliğini engellenecektir. İşin ihalesi 2010 yılında yapılarak yer teslimi yapılmış ve inşaat başlamıştır. 2011 yılında yapımına devam edilmiştir. 28.05.2012 tarihinde yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşme fesh edilmiştir.

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşine ilişkin ikinci ihale 2012 yılı Eylül ayında yapılmış ve Kasım ayında yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaatla başlanmıştır. 2012 yılında yapımına devam edilmiştir. İşin yapımı 2013 yılında tamamlanmıştır. 2015 yılında ise son hak ediş ödemesi yapılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Klitem Müh. Ltd. Şti./Zilan Peyzaj İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İş
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	2.590.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	27.09.2012
Sözleşme Tarihi	02.11.2012
Yer Teslim Tarihi	07.11.2012
Fiilen İşe Başlama Tarihi	07.11.2012
İşin Bitim Tarihi	04.07.2013
2015 Yılı Harcama Tutarı	883.164,11 TL
Toplam Harcama Tutarı	2.991.148,83
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 21: Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İkmal İnşaatı Yapımı İş



Şekil 8: Isı Merkezi Dış Görünüm



Şekil 9: Isı Merkezi İç Görünüm

Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşi

Üniversite personel ve öğrencilerimize sosyal etkinlik bakımından daha iyi koşullarda hizmet verebilmek, konser, özel gösteri ve çeşitli organizasyonların düzenlenebileceği mekan eksikliğini gidermek amacıyla amfi tiyatro yapılması planlanmış, 28/08/2013 tarihinde ihalesi yapılmış, 18/11/2013 tarihinde işe başlanmıştır. İşin yapımı 2014 yılında yapımı tamamlanmıştır. 2015 yılında ise son hak ediş ödemesi yapılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Emrah Konukseven – Konukseven Mühendislik
Sözleşmenin Konusu	Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	2.170.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	28/08/2013
Sözleşme Tarihi	14/11/2013
Yer Teslim Tarihi	18/11/2013
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18/11/2013
İşin Bitim Tarihi	17/10/2014
2015 Yılı Harcama Tutarı	80.014,80 TL
Toplam Harcama Tutarı	2.475.567,96
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 22: Yunus Emre Yerleşkesi Amfi Tiyatro Yapım İşi



Şekil 10: Amfi Tiyatro



Şekil 11: Amfi Tiyatro



Şekil 12: Eski BESYO Binası Çevre Düzenlemesi

Eski BESYO Binası Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul öğrencileri tarafından kullanılan eski spor salonunun çevresinin bir eğitim kurumuna yakışır şekilde düzenlenmesi, öğrencilerimiz için sosyal yaşam alanlarının oluşturulması ve kampüs içerisinde yeşil alanların oluşturulması amacıyla proje hazırlanarak 24.04.2014 tarihinde ihale edilmiş ve

yapımına başlanmış olup 2014 yılında tamamlanmıştır. 2015 yılında ise son hakediş ödemesi yapılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Askan Dekorasyon İnş. Turizm Tic.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	Eski BESYO Binası Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.830.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	24.04.2014
Sözleşme Tarihi	13.06.2014
Yer Teslim Tarihi	18.06.2014
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18.06.2014
İşin Bitim Tarihi	04.12.2014
2015 Yılı Harcama Tutarı	514.552,91 TL
Toplam Harcama Tutarı	2.122.427,38
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 23: Eski Besyo Binası Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

KMÜ Kampüs İçi Asfalt Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Kampus alanı içerisinde ikinci etap yol çalışmasına başlayarak 24.000 m² yol ve çevre düzenlemesi yapılarak estetik yönden güzel bir yaşama ortamı sağlamak amaçlanmıştır. 20.03.2015 tarihinde ihalesi yapılmış 11.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım işine başlanmış ve ekim ayı içerisinde tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Dursun ÖZSARAÇ
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Kampüs İçi Asfalt Yol ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	2.987.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	219.543,08 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	20.03.2015
Sözleşme Tarihi	06.05.2015
Yer Teslim Tarihi	11.05.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	11.05.2015
İşin Bitim Tarihi	19.10.2015
2015 Yılı Harcama Tutarı	3.658.238,37 TL
Toplam Harcama Tutarı	3.658.238,37 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 24: KMÜ Kampüs İçi Asfalt Yol Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Kampus alanı içerisinde Eski MYO, Kreş Binası ve Uygulama Oteli etrafında 18.500 m²'lik alanda çevre düzenlemesi yaparak öğrenci ve personelimize estetik yönden güzel ve işlevsel bir yaşama ortamı sağlamak amaçlanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup 10.07.2015 tarihi itibari ile ihaleye çıkmıştır. Çalışmaların 2016 nisan ayı itibari ile tamamlanması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Kuant Yapı İnaat Peyzaj Mimar. Müh. Tasarım Sanayi ve Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.524.330,25 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	10.07.2015
Sözleşme Tarihi	14.08.2015
Yer Teslim Tarihi	14.08.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	14.08.2015
İşin Bitim Tarihi	29.04.2016
2015 Yılı Harcama Tutarı	791.663,94 TL
Toplam Harcama Tutarı	791.663,94 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	50,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 25: KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi



Şekil 13: Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Projesi



Şekil 14: Uygulama Otelі Çevresi Çevre Düzenlemesi

KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi

Karaman İlinin güneş enerjisi potansiyeli ve enerji verimliliğinin yüksek olması nedeniyle Üniversitemizin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması amacıyla proje hazırlanmış 22/10/2013 tarihinde ihale edilmiş, 02/04/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 04.06.2015 tarihinde yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşme feshedilmiştir. 2015 yılında tekrar ihaleye çıkılarak Ekim ayında yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	CRC Elektronik
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.760.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	0,00 TL
İhale Tarihi	02.10.2015
Sözleşme Tarihi	27.10.2015
Yer Teslim Tarihi	27.10.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	27.10.2015
İşin Bitim Tarihi	02.06.2016
Harcama Tutarı	0,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	0,00
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 26: KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi

3.5. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2015 yılı bütçemize ayrılan ödenek 13.900.000,00 TL olup, 13.380.732,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, toplam ödenek 27.280.732,00 TL olmuştur. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca detay programı yapılmış olan proje kapsamında, toplam harcama 20.058.550,08 TL'dir. Detay projelere göre harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 21. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	110.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	13.900.000,00 TL
Eklenen	13.380.732,00 TL
Toplam Ödenek	27.280.732,00 TL
Harcama	20.058.550,08 TL
Kalan Ödenek	7.222.181,92 TL

Çizelge 27: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Tablo 22. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşİ	1	105.497,46
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İşİ	1	7.098.140,10
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kütüphane Binası Yapım İşİ	1	7.533.133,11
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İslami İlimler Fakültesi Binası Yapım İşİ	1	5.321.779,41

Çizelge 28: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı

KMÜ Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Sağlık Yüksekokulu binasının projesine göre ½ oranında yapılması nedeniyle, kalan ½ oranındaki ek binanın yapılması planlanmış, 29/03/2013 tarihinde ihalesi yapılmış ve ikinci kısmın yapımına 01/07/2013 tarihinde başlanmış ve 2014 yılında tamamlanmıştır. 2015 yılında ise son hakediş ödemesi yapılmış ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında hizmete alınmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Kalo İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031590
İhale Bedeli	1.849.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	52,567,90 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	29/03/2013
Sözleşme Tarihi	27/06/2013
Yer Teslim Tarihi	01/07/2013
Fiilen İşe Başlama Tarihi	01/07/2013
İşin Bitim Tarihi	22/12/2014
2015 Yılı Harcama Tutarı	105.497,46 TL
Toplam Harcama Tutarı	2.135.859,29 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 29: KMÜ Sağlık Yüksekokulu Ek Bina Yapım İşi



Şekil 15: Sağlık Yüksekokulu Ek Bina

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İşi

Modern teknolojinin gerektirdiği imkanlardan faydalanarak sağlıklı eğitim verebilmek ve yapımı tamamlanan 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile entegre edilmiş, eğitim-öğretimine Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda devam eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bir bina yapılmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle, proje hazırlanmış 06.06.2014 tarihinde ihale edilerek yapımına başlanmış ve 2015 yılında tamamlanmış olup 2016 yılı Mart ayında son hak ediş olarak 385.905,90 TL ödeme yapılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ayşe ALTUNÖZ – Emrah KONUKSEVEN İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İş
İhale Bedeli	7.085.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	06.06.2014
Sözleşme Tarihi	10.09.2014
Yer Teslim Tarihi	15.09.2014
Fiilen İşe Başlama Tarihi	15.09.2014
İşin Bitim Tarihi	16.11.2015
2015 Yılı Harcama Tutarı	7.098.140,10
Toplam Harcama Tutarı	7.932.169,10
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 30: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İş



Şekil 16: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunmuştur.

Fiziki Mekân Artışı	Adedi	m²
Kazan Dairesi	1	123
Güreş-Boks Salonu	1	85
Halter Salonu	1	74
Judo Salonu	1	100
Tekvando Salonu	1	133
Jimnastik Salonu	1	100
Aerobik Salonu	1	73
Sığınak	1	133
Mescit	2	62
Konferans Salonu (210 kişilik)	1	190
Derslik	10	980
Kantin	1	197
Büro	25	643
Amfi Sınıf	1	190
Bilgisayar Laboratuvarı	2	189
Laboratuvar	2	150
Kütüphane	1	147

Çizelge 31: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fiziki mekan artışı

Kütüphane Binası Yapım İşi

Üniversitemiz merkez kütüphanesinin yeterli büyüklükte ve kütüphane mimarisine uygun olmaması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Kampüs alanı içerisinde bir 10.500 m² alana sahip bir kütüphane yapılarak öğrencilerimize daha verimli bir eğitim alanı sağlanması, akademik ve idari personele ihtiyaç duyduğu kaynakları temin edebilmesi amaçlanmıştır. Kütüphane binası yapım işinin 09.09.2014 tarihinde ihalesi yapılmış ve 10.11.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup 2016 yılı nisan ayı itibari ile tamamlanması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ahmet BAZENCİR – Coşkun KARAUSTA Adi İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Kütüphane Binası Yapım İşİ
İhale Bedeli	9.123.000,00 TL
Projeyle İlgili Revizyonlar	195.145,54 TL
İhale Tarihi	09.09.2014
Sözleşme Tarihi	06.11.2014
Yer Teslim Tarihi	10.11.2014
Fiilen İşe Başlama Tarihi	10.11.2014
İşin Bitim Tarihi	05.04.2016
2015 Yılı Harcama Tutarı	7,533.133,11 TL
Toplam Harcama Tutarı	7,533.133,11 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	75,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 32: Kütüphane Binası Yapım İşİ



Şekil 17: Kütüphane Binası

KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi binasında faaliyetlerine devam etmektedir. İslami İlimler Fakültemizin kendi binasında faaliyetlerini yürütmesi amacıyla proje hazırlanarak 2014 yılında yapılabilmesi amacıyla Derslik ve Merkezi Birimler Projesine dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığından talepte bulunulmuştur. İslami İlimler Fakültesi binasının ödenek ihtiyacının tamamının Üniversitemiz finansman fazlasından ödenek eklemek suretiyle karşılanması kaydı ile söz konusu projenin 2014 yılı karakteristiğine yıl içinde dahil edilmiştir. Kalkınma Bakanlığının onayı ile birlikte ihale çalışmaları başlatılmış ve 08/01/2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yer teslimi 01.04.2015 tarihinde yapılarak inşaat yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup 2016 yılı itibari ile tamamlanması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Sisan Mühendislik
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	7.242.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	08.01.2015
Sözleşme Tarihi	25.03.2015
Yer Teslim Tarihi	01.04.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	01.04.2015
İşin Bitim Tarihi	04.05.2016
2015 Yılı Harcama Tutarı	5.321.779,41 TL
Toplam Harcama Tutarı	5.321.779,41 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	65,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 33: KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşi



Şekil 18: İslami İlimler Fakültesi Projesi



Şekil 19: İslami İlimler Fakültesi

3.6. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2015 yılı bütçemize ayrılan ödenek 3.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde 570.983,00 TL tutarında ödenek eklenmesi yapılmış, eklemeler sonucunda 2015 yılı toplam ödeneği 3.570.983,00 TL olmuştur. Toplam harcama 546.785,73 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 23. 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	3.000.000,00 TL
Eklenen	570.983,00 TL
Toplam Ödenek	3.570.983,00 TL
Harcama	546.785,73 TL
Kalan Ödenek	3.024.197,27 TL

Çizelge 34: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Tablo 24. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşİ	1	546.785,73
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Stadyum	1	0,00

Çizelge 35: 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı

Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi

Bulunduğu kentin sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimine katkı sağlamayı kendine görev edinen Üniversitemiz, kalkınmada öncelikli küçük bir anadolu kenti olan Karaman'ın sosyal, kültürel ve sportif yönden eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilerimizin sportif faaliyetlerden azami ölçüde faydalanması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimizin uygulamalı derslerini yapmaları ile ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenecek müsabaka ve faaliyetlerde Üniversitemizi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeleri amacıyla Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılmasına karar vermiştir. 28/09/2012 yılında ihalesi yapılan proje ihale süreci uzadığundan 02/01/2013 tarihinde yapımına başlanmış ve 2014 yılında yapımı tamamlanmış olup 2015 yılında son hakediş ödemesi yapılmış ve hizmete alınmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	ARC İnş. Proje Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi
İhale Bedeli	5.234.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	191.789,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	28/09/2012
Sözleşme Tarihi	28/12/2012
Yer Teslim Tarihi	02/01/2013
Fiilen İşe Başlama Tarihi	02/01/2013
İşin Bitim Tarihi	25/12/2014
2015 Yılı Harcama Tutarı	546.785,73 TL
Toplam Harcama Tutarı	6.378.234,61 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 36: Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası Yapım İşi

Projenin gerçekleştirilmesiyle;

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin alanlarında yetkin birer spor insanı olarak mezun olmaları,
2. Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası düzenlenen su sporlarında derece alınması,
3. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sportif ve sağlıklı bireyler olmaları,

4. Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası düzenlenen su sporlarında takımlarımızın mücadelesi sonucunda Üniversitemizin ve Karaman'ın tanıtılması,
 5. Ülkemiz milli takımına sporcular yetiştirerek Ülkemizin sportif başarılarına katkıda bulunulması,
 6. Yüzme bilincinin artırılması,
- hedeflenmektedir.

Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunmuştur.

Fiziki Mekân	Adet	M ²
25x16 Yüzme Havuzu	1	400
16x6,50 Antreman Havuzu	1	104
Soyunma Odası	2	140
Jimnastik Salonu	1	95
Antrenör Odası	2	40
Doktor Odası	1	25
Ofis	6	90
288 Kişilik Tribün	1	-
Dinlenme Salonu	10	296

Çizelge 37: Güneş Enerjili Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu binası kapalı mekanları



Şekil 20: Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

5000 Kişilik Olimpik Stadyum Yapım İşi

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bölümü öğrencilerine daha iyi eğitim vermek ve üniversitemizin üniversitelerarası spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla 5000 kişilik stadyum yapılacaktır. Stadyumun öncelikle açık spor alanının yapımı planlanmış ve 2015 yılı içerisinde KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapım İşi olarak ihaleye çıkmıştır. Tribün ve diğer inşaatların 2017 yılı ve sonrasına bırakılması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ketu İnşaat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı
İhale Bedeli	3.895.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	08.09.2015
Sözleşme Tarihi	28.12.2015
Yer Teslim Tarihi	04.01.2016
Fiilen İşe Başlama Tarihi	04.01.2016
İşin Bitim Tarihi	28.12.2016
2015 Yılı Harcama Tutarı	0,00 TL
Toplam Harcama Tutarı	0,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	0,00
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 38: 5000 Kişilik Olimpik Stadyum Yapım İşi



Şekil 21: Stadyum Projesi



Şekil 22: Stadyum Projesi

4. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe ve kalkınma programları arasında düzenleme yapılmalıdır.
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.
5. Tüm kamu yapılarının doğayla uyumlu, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, ekosistemlere duyarlı olmasına yönelik kriter seti ve standartlar hazırlanmalıdır.
6. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması yatırım çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacağı düşünülmektedir.
7. Yapı denetim görevlilerinin iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerine sağlamak üzere yetkilerinin (iş durdurma vb.) artırılması faydalı olacaktır.

5. 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti¹**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2015 Yılı Fiyatlarıyla (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHav.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		164.131		99.196	99.196		27.000	27.000		19.764	19.764		32.569	32.569
Sağlık															
D.KamuHizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6		164.131		99.196	99.196		27.000	27.000		19.764	19.764		32.569	32.569

Çizelge 39: 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

¹ Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

6. 2015 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu**2015 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)****Kuruluş Adı** : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Eğitim

2015 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2015H032860	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2015	Karaman	0	100	0	0	0	100					24
	490	2009H031580	Kampüs Altyapısı	Özel	2017	Karaman	0	34.500	24.645	0	0	9.324					5.928
	490	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2016	Karaman	0	110.000	74.551	0	0	27.280					20.059
	490	2015H032870	Muhtelif İşler*	Özel	2015	Karaman	0	6.131	0	0	0	6.088					5.768
	490	2015H032880	Yayın Alımı	Özel	2015	Karaman	0	400	0	0	0	400					243
	490	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2016	Karaman	0	13.000	0	0	0	3.571					547
TOPLAM							0	164.131	99.196	0	0	46.764					32.569

Çizelge 40: 2015 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu

* Muhtelif işler projesi kapsamında büro ve okul mefruşatı ile bilgisayar alımlarına ilişkin 379.189,34 TL'lik ödeme mahsup döneminde yapılmıştır.
