

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2016 YILI

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart 2017 - KARAMAN



Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti.....	v
2. Genel Değerlendirme.....	1
2.1. UZGÖRÜŞÜMÜZ.....	1
2.2. ÖZGÖREVİMİZ.....	1
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER.....	1
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	6
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	7
2.6. 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	10
2.6.1. Hedeflenen.....	10
2.6.2. Gerçekleşen.....	10
2.7. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	11
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	11
2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	21
3. Proje Uygulamaları.....	22
3.1. 2016H032970 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ.....	22
3.2. 2016H032980 MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	23
3.3. 2016H032990 YAYIN ALIMI PROJESİ.....	31
3.4. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ.....	33
3.5. 2009H031590 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ.....	42
3.6. 2010H050170 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ.....	54
4. Öneriler.....	58
5. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özeti.....	59
6. 2016 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu.....	60

ŞEKİLLER TABLOSU

Şekil 1: Kapalı Mekanların Dağılımı (m2)	8
Şekil 2: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı	11
Şekil 3: Yatırım Harcamalarının Projeler İtibariyle Dağılımı.....	21
Şekil 4: Laboratuvar Cihazları Alımı	25
Şekil 5: Laboratuvar Cihazları Alımı	26
Şekil 6: Laboratuvar Cihazları Alımı	27
Şekil 7: Okul Mefruşatı Alımları	28
Şekil 8: Okul Mefruşatı Alımları	29
Şekil 9: Hareketli İş Makinası Alımı.....	30
Şekil 10: Büro Makinası Alımı	30
Şekil 11: Yayın Alımı	32
Şekil 12: Güneş Enerji Santrali	36
Şekil 13: Uygul KMÜ İhata Duvarı Yapım İşiama Otel Çevresi Çevre Düzenlemesi.....	37
Şekil 14: Uygulama Otel Çevresi Çevre Düzenlemesi	38
Şekil 15: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi.....	39
Şekil 16: İhata Duvarı Yapım İşi.....	40
Şekil 17: İslami İlimler Fakültesi	45
Şekil 18: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.....	47
Şekil 19: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.....	47
Şekil 20: Kütüphane	51
Şekil 21: Kütüphane Binası İç Görünüm	52
Şekil 22: Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti.....	56

ÇİZELGELER TABLOSU

Çizelge 1: Sektöre Göre Projelerin Harcama Detayları	6
Çizelge 2: Taşınmazların Dağılımı (m2).....	7
Çizelge 3: Kapalı Mekânların Dağılımı (m2)	7
Çizelge 4: Üniversitemiz Kapalı Mekanların Dağılımı (m ²).....	9
Çizelge 5: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı (II. Düzey).....	11
Çizelge 6: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)	12
Çizelge 7: 06.1 Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	14
Çizelge 8: 6.3 Gayrimaddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	15
Çizelge 9: 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	16
Çizelge 10: 06.7 Geyrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....	17
Çizelge 11: Revizyon (2016H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)	17
Çizelge 12: Revizyon (2016H032980 Muhtelif İşler).....	18
Çizelge 13: Revizyon (2016H032990 Yayın Alımı).....	18
Çizelge 14: Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı).....	19
Çizelge 15: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)	19
Çizelge 16: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	20
Çizelge 17: 2016H032970 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	22
Çizelge 18: 2016H032970 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı.....	22
Çizelge 19: 2016H032980 Nolu Muhtelif İşler Projesi	23
Çizelge 20: 2016H032980 Nolu Muhtelif İşler Projesi Harcamalarının Detayı	24
Çizelge 21: 2016H032990 Nolu Yayın Alımı Projesi	31
Çizelge 22: 2016H032990 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı	31
Çizelge 23: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	33
Çizelge 24: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı	34
Çizelge 25: KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ	35
Çizelge 26: KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	37
Çizelge 27: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	42

Çizelge 28: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı	42
Çizelge 29: KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşİ	43
Çizelge 30: İslami İlimler Fakültesi fiziki mekan artışı	44
Çizelge 31: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İşİ	46
Çizelge 32: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fiziki mekan artışı	48
Çizelge 33: Kütüphane Binası Yapım İşİ	49
Çizelge 34: Kütüphane Binası fiziki mekan artışı	50
Çizelge 35: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	54
Çizelge 36: 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı	54
Çizelge 37: KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı	55
Çizelge 38: 1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	57
Çizelge 39: 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	59
Çizelge 40: 2016 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu	60

KISALTMALAR

BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

KMÜ: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

MYO: Meslek Yüksekokulu

1. Yönetici Özeti



Köklü geçmişe ve medeniyete sahip Türkçemizin başkenti Karaman'ın güzide eğitim kurumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde rektör olarak atanarak 26 Ocak 2017 tarihinde bu kutlu görevi devraldım.

Üniversitemizi şehir ve bölge boyutundan daha ileri noktalara taşımak, Ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma getirerek uluslararası bir üniversite

hüviyetine kavuşturmak, erdemli ve kalifiye insanlar yetiştirecek her türlü sosyal, bilimsel ve teknolojik alt yapıyı hazırlamak, mensuplarımızla birlikte hem milletimizin ufkuna hem de insanlığa yeni bir soluk getirmek en büyük temennimizdir.

Şehirdeki paydaşlarımızla bölgesel kalkınma özgörevini ve farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle şehir-üniversite bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atacağız.

Geride bıraktığımız yılda Üniversitemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla başlanılan güneş enerji sistemi projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje Üniversitemiz Enerji Sistemleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine bu sahada uygulamalı eğitim imkânı da sunmaktadır. Öğrencilerimiz yenilenebilir enerjinin bir kolu olan PV sistemlerin çalışması, kurulumunun nasıl gerçekleştiği ve gelişen teknoloji ile nasıl iyileştirmeler yapılabileceği konusunda bilgi birikimi sağlamış olacaktır.

Akademik ve idari personelin ihtiyaç duydukları kaynakları elde edebilmesi için kütüphane binası yapılmıştır. Bunun yanında İslami İlimler Fakültesinin ihtiyaç duyduğu binanın yapımı ile Üniversitemiz öğrencilerine daha iyi eğitim vermek ve Üniversitemizin üniversitelerarası spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla 5.000 kişilik bir stadyum yapılması planlanmış ve bunun ilk etabı olarak sentetik yüzeyli atletizm pisti işi tamamlanmıştır. Ayrıca Üniversitemizi daha güvenilir hale getirmek amacıyla ihata duvarı ve ferforje korkuluk işinin ihalesi yapılarak yıl içerisinde yapımına başlanmış olup, 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Birimlerin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları ile yayın ihtiyaçları 2016 yılı bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmıştır. 2016 yılı yatırım programında yer alan projelere ait bilgiler ve yapılan işlerin ayrıntıları raporun içeriğinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Uzgörüşümüz

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyler yetiştiren ve gıda sektörünün iyileştirilmesi ile Türk dilinin araştırılması, yaygınlaştırılması, Türkçe bilincinin yerleştirilmesi konularında öncü çalışmalar yapan “sıradan değil, aranan” bir üniversite olmaktır.

2.2. Özgörevimiz

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanımına sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamayı özgörev edinmiştir.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

KURUMSALLAŞMA EKSENİ

Stratejik Amaç 1: Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan personeli tamamlamak için serbest kadroların doluluk oranını her yıl %8 artırmak
2. İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak
3. Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak
4. Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek için personele yönelik sosyal veya kültürel organizasyon sayısını her yıl %20 arttırmak
5. Üniversite adayları nezdinde tanınırlığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının artırılması için her yıl 20.000 adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller (kitapçık, CD vb.) dağıtmak
6. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak
7. Plan dönemi sonunda idari personelin %5'inin en az bir yabancı dil yeterliliğinin olmasını sağlamak
8. 2017 yılı sonuna kadar Üniversite stadyumunu inşa ederek hizmete açmak
9. 2017 yılı sonuna kadar yüksek lisans ve doktora yapan idari personelin toplam idari personele oranını %10'a çıkarmak

10. İş ve işlemlerin daha hızlı yapılması, maliyetlerin düşürülüp verimliliğin artırılması ve güvenilir bir elektronik ortamda işlemlerin yapılabilmesi için e-imza uygulamalı e-arşiv, e-evrak sistemini 2014 yılında faaliyete geçirmek
11. 2013 yılından itibaren, her eğitim öğretim yarıyılı başında öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlemek
12. 2014 yılından itibaren, personelimizle her son sınıf öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olmasını sağlamak ve 2017 yılına kadar toplam 15.500 ağaç dikimi gerçekleştirmek
13. En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek
14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak bir kimlik ortaya koymak amacıyla 2014 yılına kadar, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) için başvuru yapmak
15. Diğer üniversitelerle işbirliği yaparak idari ve akademik personelin ortak çalışmalar yapmasını sağlamak
16. 2013 yılında öz değerlendirme kurulu oluşturarak kuruma bağlılık ve isteklendirmeyi geliştirmek
17. Mezunların Üniversite'ye, birimlerine ve birbirlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılmasını sağlamak
18. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek

EĞİTİM EKSENİ

Stratejik Amaç 2: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. 2017 yılı sonunda 12.500 öğrenci sayısına ulaşmak
2. 2017 yılı sonunda öğretim üyelerinin öğretim elemanları içindeki payını %42'ye çıkarmak
3. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak
4. 2017 sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekanların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak
5. Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini %100 oranında tamamlamak
6. Öğrencilerin yönetime aktif olarak katılımını sağlamak
7. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak
8. Plan dönemi sonunda uzaktan eğitim programlarını hizmete açmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak

9. Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için sertifikalı yeni kurslar açarak plan dönemi sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını 3 katına çıkarmak
10. 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm eğitim-öğretim programlarını geliştirmek
11. Plan dönemi sonuna kadar Diploma Supplement Label ve ECTS Label uygulamasına geçmek
12. 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak “Kalite Sertifikası” almak
13. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ile personelin ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak için uluslararası değişim programlarına katılan personel ve öğrenci sayısını her yıl %15 arttırmak
14. Her yıl Karaman’da faaliyet gösteren en az 5 şirketle staj anlaşması yapmak
15. Yüksek lisans ve doktora programı açmak ve eğitimin kalitesini artırmak amacıyla plan dönemi sonuna kadar eğitim verilen her bölümde en az iki profesör veya doçentin hizmet vermesini sağlamak
16. Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanı başına öğrenci sayısını 25’te tutmak
17. 2017 yılına kadar yabancı ülkelerdeki en az 500 uluslararası öğrencinin Üniversitemizde öğrenim görmelerini sağlamak
18. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak
19. Eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ

Stratejik Amaç 3: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Tüm paydaşların yararlanabileceği uluslararası kuruluşlarca denkliği kabul edilmiş merkezi araştırma laboratuvarını 2017 yılında hizmete sunmak
2. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimini güçlendirmek
3. Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan yayın sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayı ve çeşitliliği her yıl %10 arttırmak
4. Bilimsel araştırma ve yayın sayısını her yıl %10 arttırmak
5. Bilimsel proje sayısını her yıl %10 arttırmak
6. Tüm proje çıktıları ile ilgili olarak paydaşları bilgilendirmek
7. Tüm araştırma ve projelerin %5’ini disiplinler arası çalışma ile yürütmek

8. Plan dönemi sonuna kadar en az bir patent almış olmak
9. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı seminer, konferans ve toplantı vb. etkinliklere katılım sayısını her yıl %10 arttırmak
10. 2013 yılından itibaren lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların en az % 10'unun bölge ve ülke sorunları ile ilgili olmasını sağlamak

Stratejik Amaç 4: Karaman'ın ve Türkiye'nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Plan dönemi sonuna kadar Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanı sayısını 6'dan 14'e çıkarmak
2. Plan dönemi sonuna kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde tahıl, meyve-sebze, et-süt mikrobiyoloji-biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılacak Ar-Ge pilot tesisleri ve laboratuvarları kurmak
3. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlamak ve tamamlamak
4. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde toplam en az 50 makale yayınlamak
5. Plan dönemi sonuna kadar bölge gıda sanayi profiline (bisküvi-kraker-gofret, bulgur, elma vb.) uygun en az beş kongre/sempozyum/çalıştay ve konferans/panel düzenlemek
6. Gıda Mühendisliği Bölümünde üretilen bilgi ve teknolojinin bölge gıda sanayine aktarılmasını sağlamak için plan dönemi sonuna kadar "Gıda Ürünleri Geliştirme ve Teknoloji Transfer Merkezi" kurmak
7. Bölge gıda sanayinde çalışan teknik elemanların (Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Gıda Teknisyeni vb.) bilgi ve teknolojik düzeylerini hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek amacıyla her yıl eğitim seminerleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenlemek

Stratejik Amaç 5: Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Amaçla ilgili hedeflerimiz aşağıda sıralanmıştır:

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresini geleneksel hale getirip iki yıl arayla düzenlemek
2. Türk Dilinin güncel sorunları üzerine yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi sonuna kadar konuyla ilgili en az bir bilgi şöleni/çalıştay düzenlemek
3. Karamanlı Türkçesi (Karamanlîca) üzerine düzenlenen çalışmalarda öncü olmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi içinde konuyla ilgili en az 5 tane konferans, panel vb. etkinlikler gerçekleştirmek
4. Plan dönemi sonuna kadar Türkçe Müzesi kurmak

5. 2017 yılından itibaren her yıl Türkçe Yetkinlik Sınavı düzenleyip başarılı olanlara “Türkçe Yetkinlik Belgesi” vermek ve belgenin ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak
6. Plan döneminde Türkçe üzerine hazırlanan çalışmaları yayınlamak, araştırmacılara destek olmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak
7. Türkçenin doğru etkili kullanılması ve tüm dünyada yaygınlaştırılması için 2017 yılı sonuna kadar en az beş tane ulusal/uluslararası organizasyon (kongre, bilgi şöleni ve yarışma) düzenlemek
8. Türkçenin kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel kullanılmasını desteklemek amacıyla yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında Türkçeyi en iyi kullanan radyo ve televizyon sunucuları ile şair ve yazarlardan plan dönemi sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak olan oylama sonucunda belirlenenlere geleneksel olarak ödül, onurluk vb. vermek
9. Karaman ve Türkiye’de iş yerlerine Türkçe isim verilmesi konusunda karar alınması için Belediyelerle ve Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yürütmek
10. Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde plan dönemi sonuna kadar bir Çeviri Merkezi kurmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 24.002.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 19.973.888,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 43.975.888,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynaklarıyla karşılanmıştır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2016 Yılı Program Ödeneği	2016 Yılı Revizeli Ödenek	2016 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	125.000.000,00	101.784.000,00	12.500.000,00	19.781.405,00	7.103.126,69
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı (KOP)	45.000.000,00	33.998.000,00	5.300.000,00	10.227.306,00	4.525.486,51
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	13.000.000,00	0,00	2.000,00	5.431.677,00	5.315.956,03
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	13.216,00
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler (KOP)	7.930.000,00	0,00	5.600.000,00	7.930.000,00	7.288.121,90
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı (KOP)	505.500,00	0,00	500.000,00	505.500,00	505.429,89
TOPLAM		191.535.500,00	135.782.000,00	24.002.000,00	43.975.888,00	24.751.337,02

Çizelge 1: Sektöre Göre Projelerin Harcama Detayları

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı:


Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	1.714.717,24	-	1.723.784,24
Ermenek Yerleşkesi	54.787,00	-	-	54.787,00
Kazım karabekir Yerleşkesi	36.322,00	24.102,00	-	60.424,00
Genel Toplam	100.176,00	1.738.819,24	-	1.838.995,24

Çizelge 2: Taşınmazların Dağılımı (m2)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	6.755	-	-	6.755
Eğitim	110.975	7.000	5.680	123.655
Sosyal	13.533	-	-	13.533
Spor	12.582	-	150	12.732
Diğer	1.480	-	-	1.480
Genel Toplam	145.325	7.000	5.830	158.155

Çizelge 3: Kapalı Mekânların Dağılımı (m2)

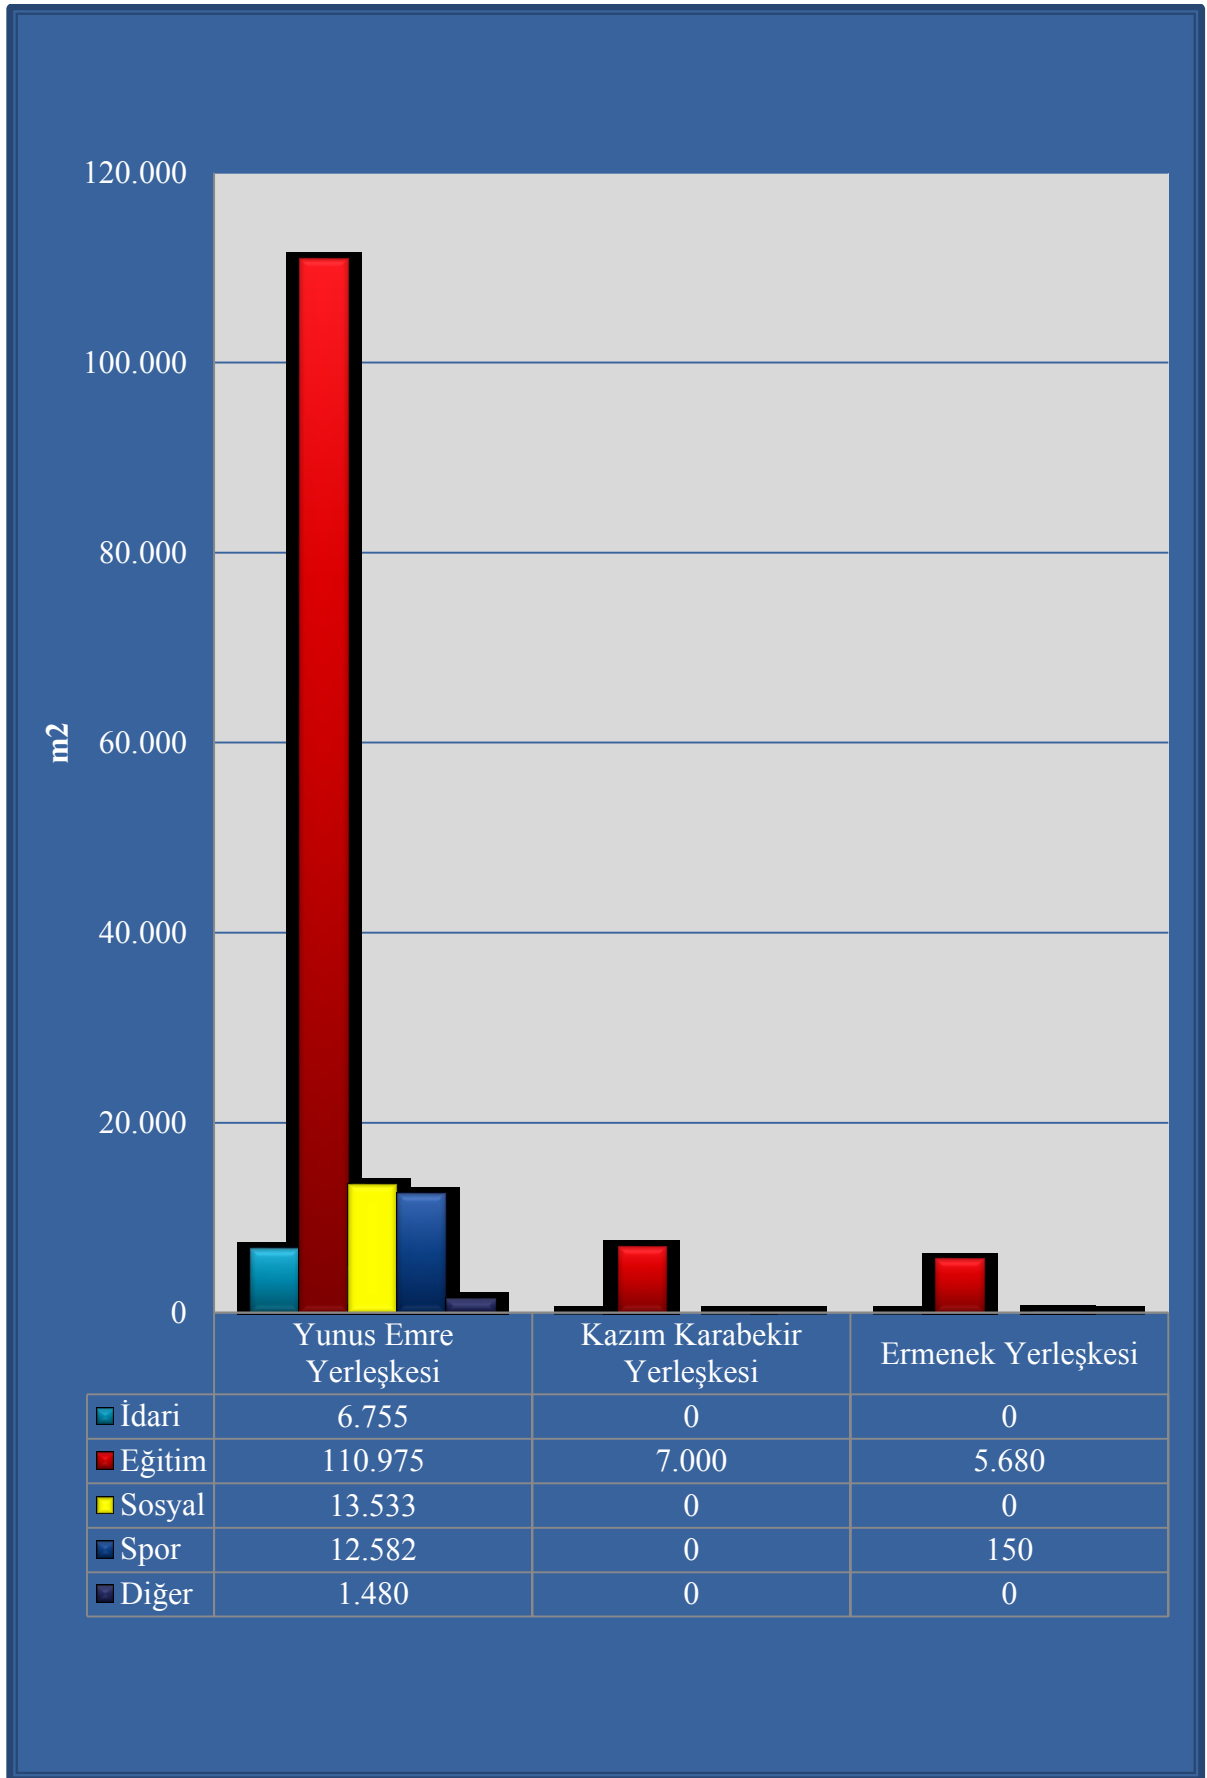

Şekil 1: Kapalı Mekanların Dağılımı (m2)

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Barınma
Rektörlük Hizmet Binası	5.000				
Isı Merkezi	1.755				
Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu		17.420			
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		13.000			
İslami İlimler Fakültesi		8.350			
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635			
Mühendislik Fakültesi		20.435			
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		9.270			
Sağlık Bilimleri Fakültesi		3.600			
Ermenek Meslek Yüksekokulu		4.175	150		
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu		7.000			
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		3.615			
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		6.640			
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		3.170			
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ¹		7.165			
Ermenek Meslek Yüksekokulu Atölyesi		1.505			
Bilgi İşlem Merkezi		3.175			
Kütüphane Binası		10.500			
1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu			7.500		
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu			5.082		
Amfi Tiyatro				533	
Öğrenci Yaşam Merkezi ²				13.000	
Uygulama Oteli					1.130
Rektörlük Konutu					350
TOPLAM	6.755	123.655	12.732	13.533	1.480
TOPLAM KAPALI ALAN	158.155 m²				

Çizelge 4: Üniversitemiz Kapalı Mekanların Dağılımı (m²)

¹ Önceki senelerde yayımlanan yatırım izleme ve değerlendirme raporlarında Halıcılık-Seramik Atölyesi ve Makine-Otomotiv Atölyesi olarak geçmektedir.

² Önceki senelerde yayımlanan yatırım izleme ve değerlendirme raporlarında Yemekhane Kafeterya Çarşı Binası olarak geçmektedir.

2.6. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**2.6.1. Hedeflenen**

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, taşıt, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüd projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2016 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen


2016 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ✓ İslami İlimler Fakültesi, Kütüphane Binası, Uygulama Oteli Çevre Düzenlemesi ile 5.000 seyircili stadyum işinin ilk etabı olan sentetik yüzeyli atletizm pisti işlerinin yapım işi tamamlanmıştır.
- ✓ Sosyal Bilimler MYO çevre düzenlemesi ve ihata duvarı yapım işinin yapımına devam edilmektedir.
- ✓ Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin kullanmış oldukları binaların büyük bakım onarımı yapılmıştır.
- ✓ Mühendislik Fakültesi Laboratuvar binası için statik proje alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) ile taşıt alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır.
- ✓ Kütüphanemizin elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır. Bu aşamada 725 adet basılı, 927 adet elektronik yayın alımı, 49 süreli yayın, 5 elektronik veri tabanı ve 1 urkund intihal programı aboneliği gerçekleştirilmiştir.

2.7. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları**2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 24.002.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde finansman fazlasından ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 43.975.888,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 24.751.337,02 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 56,28'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	3.539.500,00	1.725.500,00	5.265.000,00	4.921.570,43	93,48
6.3	Gayrimaddi Hak Alımları	60.500,00	610.000,00	670.500,00	639.962,82	95,45
6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.902.000,00	17.638.388,00	35.540.388,00	16.957.785,23	47,71
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.232.018,54	89,28
Toplam		24.002.000,00	19.973.888,00	43.975.888,00	24.751.337,02	56,28

Çizelge 5: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı (II. Düzey)**Şekil 2: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı**

2016 yılı yatırım harcamalarının ekonomik olarak detay dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	288.640,14
6	1	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	1.444.995,79
6	1	1	5	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	20.272,40
6	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	19.470,00
6	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.773.378,33
6	1	2	1	Büro Makineleri Alımları	50.022,05
6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	210.729,98
6	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.569.033,76
6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	41.384,37
6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	639.517,78
6	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.510.687,94
6	1	3	2	Atölye Gereçleri Alımları	7.080,00
6	1	3		Avadanlık Alımları	7.080,00
6	1	4	1	Kara Taşıtı Alımları	64.183,79
6	1	4		Taşıt Alımları	64.183,79
6	1	5	30	Hareketli İş Makinası Alımları	60.810,48
6	1	5		İş Makinası Alımları	60.810,48
6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	41.346,03
6	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	464.083,86
6	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	505.429,89
6	1			Mamul Mal Alımları	4.921.570,43
6	3	1	1	Bilgisayar Yazılı Alımları	639.962,82
6	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	639.962,82
6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	639.962,82
6	5	1	1	Proje Giderleri	13.216,00
6	5	1	90	Diğer Giderler	1.992.202,04
6	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.005.418,04
6	5	7	1	Hizmet Binası	7.103.126,69
6	5	7	4	Sosyal Tesisler	5.315.956,03
6	5	7	90	Diğerleri	2.533.284,47
6	5	7		Müteahhitlik Giderleri	14.952.367,19
6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.957.785,23
6	7	7	90	Diğerleri	2.232.018,54
6	7	7		Müteahhitlik Giderleri	2.232.018,54
6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.232.018,54
6				Sermaye Giderleri	24.751.337,02

Çizelge 6: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI

Başlangıç ödeneği 3.539.500,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 1.725.500,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 5.265.000,00 TL olmuştur. 2016H032980 nolu Muhtelif İşler projesi ile 2016H032990 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında 4.921.570,43 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 93,48'dir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.1.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	288.640,14	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.1.3	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	1.444.995,79	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.1.5	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşat Alımı	20.272,40	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.1.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	19.470,00	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			1.773.378,33	
06.1.2.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	50.022,05	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.2.2	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	210.729,98	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.2.4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	1.569.033,76	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.2.5	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	41.384,37	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.2.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	575.417,34	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.2.90	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	64.100,44	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları			2.510.687,94	
06.1.3.2	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Atölye Gereçleri Alımı	7.080,00	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.3	Avadanlık Alımları			7.080,00	

06.1.4.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımı	64.183,79	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.4	Taşıtı Alımları			64.183,79	
06.1.5.30	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hareketli İş Makinesi Alımı	60.810,48	2016H032980	Muhtelif İşler
06.1.5.30	İş Makinası Alımları			60.810,48	
06.1.6.1	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	41.346,03	2016H032990	Yayın Alımı
06.1.6.3	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	464.083,86	2016H032990	Yayın Alımı
06.1.6	Yayın Alımları ve Yapımları			505.429,89	
06.1	Mamul Mal Alımları			4.921.570,43	

Çizelge 7: 06.1 Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI

Başlangıç ödeneği 60.500,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 610.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 670.500,00 TL olmuştur. 2016H032980 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 639.962,82 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 95,45'dir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.3.1.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	639.962,82	2016H032980	Muhtelif İşler
06.3.1	Bilgisayar Yazılımı Alımları			639.962,82	
06.3	Bilgisayar Yazılımı Alımları			639.962,82	

Çizelge 8: 6.3 Gayrimaddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

Başlangıç ödeneği 17.902.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde finansman fazlasından 17.638.388,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 35.540.388,00 TL olmuştur. 2016H032970 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi, 2009H031580 nolu Kampüs Altyapısı projesi, 2009H031590 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesi ile 2010H050170 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında 16.957.785,23 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 47,71'dir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.5.1.1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	13.216,00	2016H032970	Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi
06.5.1.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	1.992.202,04	2009H031580	Kampüs Altyapısı
06.5.1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler			2.005.418,04	
06.5.7.1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	7.103.126,69	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler
06.5.7.4	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Tesisler	5.315.956,03	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	2.533.284,47	2009H031580	Kampüs Altyapısı
06.5.7	Müteahhitlik Giderleri			14.952.367,19	
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			16.957.785,23	

Çizelge 9: 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

Başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 2016H032980 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 2.232.018,54 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 89,28'dir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.7.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	2.232.018,54	2016H032980	Muhtelif İşler
06.7.7	Müteahhitlik Giderleri				2.232.018,54
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				2.232.018,54

Çizelge 10: 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

Üniversitemiz 2016 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2016H032970
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2016-2016
2016 Yılı Proje Tutarı	100.000,00 TL
2015 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2016 Yılı Yatırımı	100.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan	0,00 TL
2016 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	100.000,00 TL
2016 Yılı Yatırımı Revizyonu	100.000,00 TL

Çizelge 11: Revizyon (2016H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2016H032980
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2016-2016
2016 Yılı Proje Tutarı	5.600.000,00 TL
2015 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2016 Yılı Yatırımı	5.600.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan *	2.330.000,00 TL
2016 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	7.930.000,00 TL
2016 Yılı Yatırımı Revizyonu	7.930.000,00 TL

Çizelge 12: Revizyon (2016H032980 Muhtelif İşler)

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2016H032990
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2016-2016
2016 Yılı Proje Tutarı	500.000,00 TL
2015 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2016 Yılı Yatırımı	500.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan*	5.500,00 TL
2016 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	505.500,00 TL
2016 Yılı Yatırımı Revizyonu	505.500,00 TL

Çizelge 13: Revizyon (2016H032990 Yayın Alımı)

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2017
2016 Yılı Kümülatif Proje Tutarı*	41.000.000,00 TL
2015 Yılı Kümülatif Harcama	33.998.000,00 TL
2016 Yılı Yatırımı	5.300.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan**	4.927.306,00 TL
2016 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	45.000.000,00 TL
2016 Yılı Yatırımı Revizyonu	10.227.306,00 TL

Çizelge 14: Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı)

* 2009 yılında 10.000.000,00 TL olan Kampüs Altyapısı proje tutarı 2016 yılında 41.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2017
2016 Yılı Kümülatif Proje Tutarı*	115.000.000,00 TL
2015 Yılı Kümülatif Harcama	101.784.000,00 TL
2016 Yılı Yatırımı	12.500.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	7.281.405,00 TL
2016 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	125.000.000,00 TL
2016 Yılı Yatırımı Revizyonu	19.781.405,00 TL

Çizelge 15: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)

* 2009 yılında 10.000.000,00 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler proje tutarı 2016 yılında 115.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.


Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2017
2016 Yılı Kümülatif Proje Tutarı*	13.000.000,00 TL
2015 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2016 Yılı Yatırımı	2.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	5.429.677,00 TL
2016 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	13.000.000,00 TL
2016 Yılı Yatırımı Revizyonu	5.431.677,00 TL

Çizelge 16: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

* 2010 yılında 6.000.000,00 TL olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri proje tutarı 2016 yılında 13.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Yatırım Harcamalarının Projeler İtibariyle Dağılımı

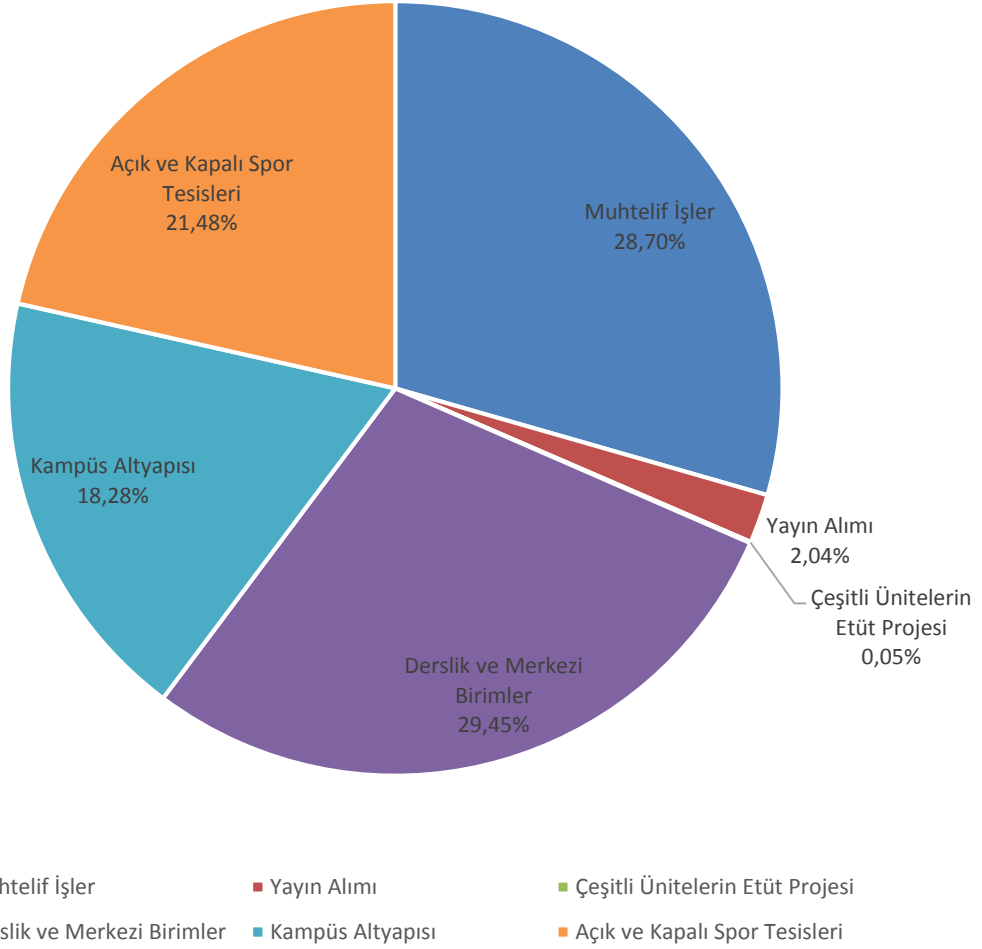

Şekil 3: Yatırım Harcamalarının Projeler İtibariyle Dağılımı

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesini geciktirmektedir.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2016H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2016 yılı bütçemize 100.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği ayrılmış olup yılı içinde herhangi bir ekleme ve düşme işlemi yapılmamıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	100.000,00 TL
Toplam Ödenek	100.000,00 TL
Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Toplam Ödenek Gönderme	100.000,00 TL
Harcama	13.216,00 TL
Kalan Ödenek	86.784,00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	13,22

Çizelge 17: 2016H032970 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Statik Proje Alımı	1	13.216,00
TOPLAM		1	13.216,00

Çizelge 18: 2016H032970 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı

3.2. 2016H032980 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif işler projesi için 2016 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.600.000,00 TL olup likit karşılığı 2.330.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 7.930.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 7.288.121,90 TL' dir. 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.


Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teknik , Mefruşat, T-8 (1 adet)
Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	5.600.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	5.600.000,00 TL
Eklenen *	2.330.000,00 TL
Toplam Ödenek	7.930.000,00 TL
Harcama	7.288.121,90 TL
Kalan Ödenek	641.878,10 TL
Gerçekleşme Oranı %	91,91

Çizelge 19: 2016H032980 Nolu Muhtelif İşler Projesi

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	26	1.569.033,76
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	16	41.384,37
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	2.075	288.640,14
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	4.676	1.444.995,79
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	67	50.022,05
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	77	210.729,98
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımı	602	639.962,82
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	148	575.417,34
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	60	19.470,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımı	1	64.183,79
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Atölye Gereçleri Alımı	1	7.080,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hareketli İş Makinesi Alımı	2	60.810,48
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşat Alımı	57	20.272,40
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	12	64.100,44
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Büyük Bakım-Onarım	1	2.232.018,54
TOPLAM		7.821	7.288.121,90

Çizelge 20: 2016H032980 Nolu Muhtelif İşler Projesi Harcamalarının Detayı

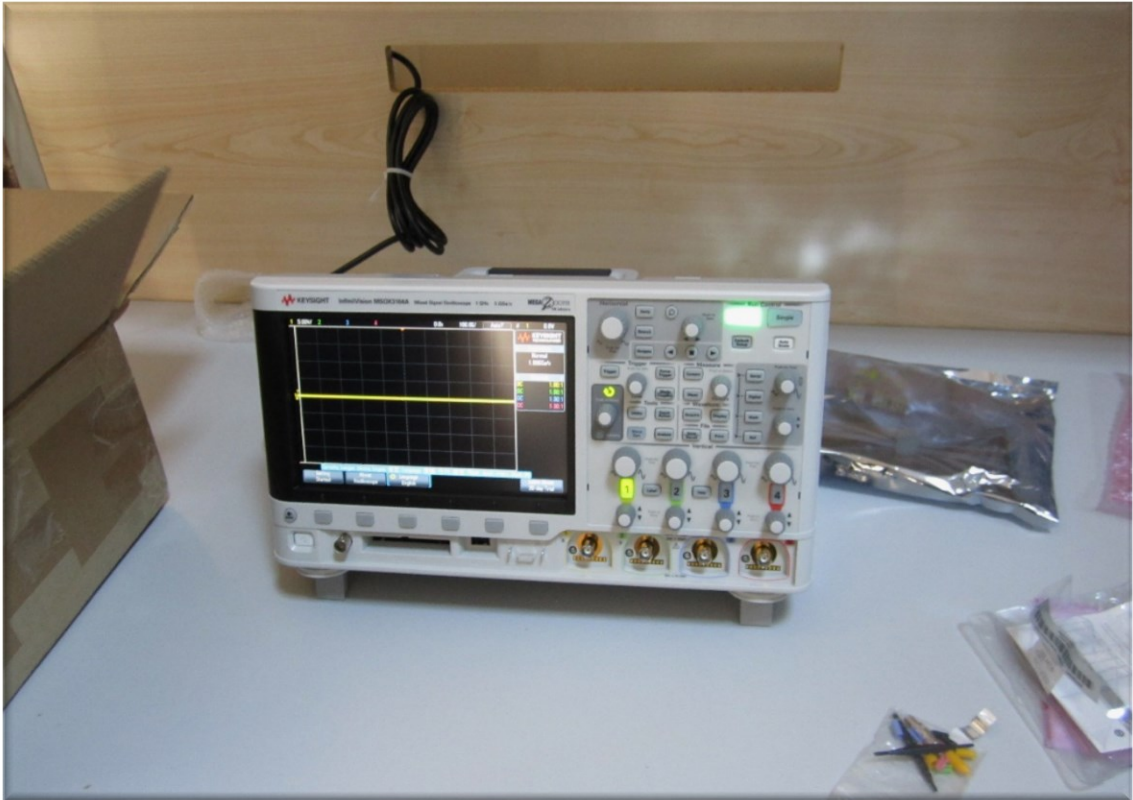

Şekil 4: Laboratuvar Cihazları Alımı



Şekil 5: Laboratuvar Cihazları Alımı



Şekil 6: Laboratuvar Cihazları Alımı



Şekil 7: Okul Mefruşatı Alımları



Şekil 8: Okul Mefruşatı Alımları



Şekil 9: Hareketli İş Makinası Alımı



Şekil 10: Büro Makinası Alımı

3.3. 2016H032990 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2016 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup likit karşılığı 5.500,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 505.500,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 505.429,89 TL' dir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2016
Proje Tutarı	500.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	500.000,00 TL
Eklenen *	5,500,00 TL
Toplam Ödenek	505.500,00 TL
Harcama	505.429,89 TL
Kalan Ödenek	70,11 TL
Gerçekleşme Oranı %	99,99

Çizelge 21: 2016H032990 Nolu Yayın Alımı Projesi

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	725	31.703,59
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	927	211.547,67
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Sürelili Yayın Aboneliği	49	10.839,32
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Veri Tabanı Aboneliği	5	240.938,47
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Urkund İntihal Programı Aboneliği	1	10.400,84
TOPLAM		1.707	505.429,89

Çizelge 22: 2016H032990 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı



Şekil 11: Yayın Alımı

3.4. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2016 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.300.000,00 TL olup 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun altıncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca likit karşılığı 4.927.306,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 10.227.306,00 TL olarak gerçekleşmiş olup toplam harcama 4.525.486,51 TL'dir. 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı, Gün.Enj.Sis., İhata duvarı, Hobi bahçesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	45.000.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	5.300.000,00 TL
Eklenen *	4.927.306,00 TL
Toplam Ödenek	10.227.306,00 TL
Harcama	4.525.486,51 TL
Kalan Ödenek	5.701.819,49 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	44,25

Çizelge 23: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

*Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize ilişkin yatırımların detayları aşağıda gösterilmiştir.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ	1	1.992.202,04
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	1.007.045,76
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	300.893,99
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ İhata Duvarı Yapım İşİ	1	1.225.344,72
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Güneş Enerji Sistemi (İkinci 500 KW)	1	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hobi Bahçesi	1	0,00
TOPLAM		6	4.525.486,51

Çizelge 24: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi

Karaman İlinin güneş enerjisi potansiyeli ve enerji verimliliğinin yüksek olması nedeniyle Üniversitemizin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması amacıyla proje hazırlanmış, 22/10/2013 tarihinde ihale edilmiş ve 02/04/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 04/06/2015 tarihinde yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşme feshedilmiştir. 2015 yılında tekrar ihaleye çıkılarak Ekim ayında başka bir yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

10.000 m² kurulu alana yapılmış olan 500 kW'lık Güneş Enerji Santralimiz PV-SOL lisanslı yazılım programıyla geçmiş yılların meteorolojik verilerini kullanarak yılda yaklaşık 754,5 Mega watt saat enerji üreteceği tahmin edilmektedir. Santralimiz hesaplamalar neticesinde kendisini 6 yılda amorti edecektir. Bu enerji santrali ile yılda 453.000 kg CO² salınımı önlenmiş olup çevresel etkileri diğer geleneksel enerji santrallerine göre oldukça düşüktür. Santralimiz geçici kabulü 06/01/2017 tarihinde yapılmış olup bu tarih itibarıyla şebekeye enerji vermeye başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	CRC Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.760.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	02.10.2015
Sözleşme Tarihi	27.10.2015
Yer Teslim Tarihi	27.10.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	27.10.2015
İşin Bitim Tarihi	06.01.2017
2016 Yılı Harcama Tutarı	1.992.202,04
Toplam Harcama Tutarı	1.992.202,04
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 25: KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi



Şekil 12: Güneş Enerji Santrali

KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Yunus Emre Yerleşkesi Kampüs alanı içerisinde uygulama oteli etrafında 18.500 m²'lik alanda çevre düzenlemesi yaparak öğrenci ve personelimize estetik yönden güzel ve işlevsel bir yaşama ortamı sağlamak amaçlanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup personel ve öğrencilerin sosyal aktivitelerine katkıda bulunulması sağlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Kuant Yapı İnaat Peyzaj Mimar. Müh. Tasarım Sanayi ve Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.524.330,25 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	10.07.2015
Sözleşme Tarihi	14.08.2015
Yer Teslim Tarihi	14.08.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	14.08.2015
İşin Bitim Tarihi	29.04.2016
2016 Yılı Harcama Tutarı	1.007.045,76 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.798.709,70 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 26: KMÜ Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi



Şekil 13: Uygulama Oteli Çevresi Çevre Düzenlemesi



Şekil 14: Uygulama Otel Çevresi Çevre Düzenlemesi

Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre yerleşke alanı içerisinde asfalt yol kenarları, ana giriş kapısı çevresini düzenlemek ve Sosyal Bilimler MYO çevresinin daha elverişli bir ortam haline dönüştürmek amaçlanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup 11/08/2016 tarihi itibari ile ihaleye çıkılmış, 01/09/2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Aralık ayında fen ve sanat kurallarına göre imalat yapılamaması ve yüklenicinin iş programına uymamasından dolayı tamamlanamamıştır. 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Serhat AYDIN
Sözleşmenin Konusu	Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.160.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	11.08.2016
Sözleşme Tarihi	01.09.2016
Yer Teslim Tarihi	05.09.2016
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.09.2016
İşin Bitim Tarihi	
2016 Yılı Harcama Tutarı	300.893,99 TL
Toplam Harcama Tutarı	300.893,99 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	22,00
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 27: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi



Şekil 15: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi

KMÜ İhata Duvarı Yapım İşi

Yunus Emre Yerleşkesi alanını daha güvenli hale getirmek amacıyla yapımı devam eden ihata duvarı ve ferforje korkuluk işi için 31/03/2016 tarihinde ihaleye çıkılmış, 21/04/2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Belediyenin yerleşkemiz güneyinde bulunan yol genişletme çalışmaları uzadığı için meydana gelen kod farkından dolayı imalat tamamlanamamıştır. 2017 yılında projenin tamamlanması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ramazan YILMAZ
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İhata Duvarı Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.647.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	13.132,56 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	31.03.2016
Sözleşme Tarihi	21.04.2016
Yer Teslim Tarihi	25.04.2016
Fiilen İşe Başlama Tarihi	25.04.2016
İşin Bitim Tarihi	
2016 Yılı Harcama Tutarı	1.225.344,72 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.225.344,72 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	70,00
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 28: KMÜ İhata Duvarı Yapım İşi



Şekil 16: İhata Duvarı Yapım İşi

Hobi Bahçesi

Üniversitemiz 2003-2017 Stratejik Planının dördüncü amacı "Karaman'ın ve Türkiye'nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak" olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Üniversitemizin gerek Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü gerekse Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümlerinde eğitim öğretim ve bilimsel nitelikte Ar-Ge (TÜBİTAK, SANTEZ, BAP vb.) çalışmalar yürütülmektedir. Mülkiyeti hazineye ait olan ve Üniversitemize tahsis edilen tarım arazisi üzerine Maliye Bakanlığından alınan onay neticesinde Üniversitemizce stratejik planında yer alan söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için sadece personelimiz ve öğrencilerimize bedel karşılığı kiralanmak üzere gıda-tarım araştırma ve eğitim uygulama alanı ve sosyal amaçlı bir hobi bahçesi yapılması planlanmış fakat gerekli izinler 2016 yılında alınamamıştır. 2017 yılı içerisinde izinlerin alınarak yapımının tamamlanması planlanmaktadır.

3.5. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2016 yılı bütçemize ayrılan ödenek 12.500.000,00 TL olup 7.281.405,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, toplam ödenek 19.781.405,00 TL olmuştur. 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca detay programı yapılmış olan proje kapsamında toplam harcama 7.103.126,69 TL'dir. Detay projelere göre harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	BESYO (6500m ²), Kütüp. Bin. (10500m ²), İslami İlim.Fak. (8350m ²), Müh.Fak. Laboratuvar Bin.
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	125.000.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	12.500.000,00 TL
Eklenen*	7.281.405,00 TL
Toplam Ödenek	19.781.405,00
Harcama	7.103.126,69 TL
Kalan Ödenek	12.678.278,31 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	35,91

Çizelge 29: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

*Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşİ	1	3.212.107,98
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası İnşaatı Yapım İşİ	1	385.905,90
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kütüphane Binası Yapım İşİ	1	3.505.112,81
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Yapım İşİ	1	0,00
TOPLAM		4	7.103.126,69

Çizelge 30: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı

KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi binasında faaliyetlerine devam etmektedir. İslami İlimler Fakültemizin kendi binasında faaliyetlerini yürütmesi amacıyla proje hazırlanarak 2014 yılında Derslik ve Merkezi Birimler Projesine dâhil edilmesi için Kalkınma Bakanlığından talepte bulunulmuştur. İslami İlimler Fakültesi binasının ödenek ihtiyacının tamamının Üniversitemiz finansman fazlasından ödenek eklemek suretiyle karşılanması kaydı ile söz konusu projenin 2014 yılı karakteristiğine yıl içinde dâhil edilmiştir. Kalkınma Bakanlığının onayı ile birlikte ihale çalışmaları başlatılmış ve 08/01/2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yer teslimi 01/04/2015 tarihinde yapılarak inşaat yapım çalışmalarına başlanılmış ve 06/05/2016 tarihinde yapımı tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Sisan Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	7.242.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	83.212,84 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	08.01.2015
Sözleşme Tarihi	25.03.2015
Yer Teslim Tarihi	01.04.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	01.04.2015
İşin Bitim Tarihi	06.05.2016
2016 Yılı Harcama Tutarı	3.212.107,98 TL
Toplam Harcama Tutarı	8.533.887,39
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 31: KMÜ İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı Yapım İşi

İslami İlimler Fakültesi Binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunmuştur.

Fiziki Mekân Artışı	Adedi	m²
Arşiv	4	135,84
Büro	70	1.282,13
Dekan odası	1	63,84
Dekan yardımcısı odası	2	76,93
Depo	3	127,99
Derslik	25	2.055,19
Fakülte sekreteri odası	1	36,57
Hafızlık odası	2	98,55
Kantin	1	286,98
Kazan Dairesi	1	124,02
Konferans salonu	1	286,98
Mescit	2	67,93
Özel kalem odası	1	17,49
Sığınak	1	67,50
Toplantı Odası	2	130,64
TOPLAM	117	4.858,58

Çizelge 32: İslami İlimler Fakültesi fiziki mekan artışı



Şekil 17: İslami İlimler Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İşi

Eğitim-öğretime Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda devam eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine sağlıklı eğitim verebilmek için modern teknolojinin gerektirdiği imkânlardan faydalanarak 1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile bütünleşmiş edilmiş bir bina yapılması planlanmış, 06/06/2014 tarihinde ihale edilerek yapımına başlanmış ve 2015 yılında tamamlanmış olup 2016 yılı Mart ayında son hakediş olarak 385.905,90 TL ödeme yapılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ayşe ALTUNÖZ – Emrah KONUKSEVEN İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İşi
İhale Bedeli	7.085.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	06.06.2014
Sözleşme Tarihi	10.09.2014
Yer Teslim Tarihi	15.09.2014
Fiilen İşe Başlama Tarihi	15.09.2014
İşin Bitim Tarihi	16.11.2015
2016 Yılı Harcama Tutarı	385.905,90
Toplam Harcama Tutarı	8.318.075,00
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 33: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yapım İşi



Şekil 18: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu



Şekil 19: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının yapımıyla aşağıda belirtilen kapalı mekânlara sahip olunmuştur.

Fiziki Mekân Artışı	Adedi	m²
Kazan Dairesi	1	123
Güreş-Boks Salonu	1	85
Halter Salonu	1	74
Judo Salonu	1	100
Tekvando Salonu	1	133
Jimnastik Salonu	1	100
Aerobik Salonu	1	73
Sığınak	1	133
Mescit	2	62
Konferans Salonu (210 kişilik)	1	190
Derslik	10	980
Kantin	1	197
Büro	25	643
Amfi Sınıf	1	190
Bilgisayar Laboratuvarı	2	189
Laboratuvar	2	150
Kütüphane	1	147
TOPLAM	53	3.569

Çizelge 34: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fiziki mekan artışı

Kütüphane Binası Yapım İşi

Üniversitemiz merkez kütüphanesi yeterli büyüklükte ve kütüphane mimarisine uygun olmaması nedeniyle Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 10.500 m² alana sahip bir kütüphane yapılarak öğrencilerimize daha verimli eğitim alanı sağlanması, akademik ve idari personele ihtiyaç duyduğu kaynakları temin edebilmesi amaçlanmıştır. Kütüphane binası yapım işinin 09/09/2014 tarihinde ihalesi yapılmış ve 10/11/2014 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştır. İslami İlimler Fakültesi binası inşaatının yerinin değiştirilmesinden dolayı kütüphane binası yerinin kaydırılması sonucu kod farkı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bodrum kat ilavesi yapılmış olup projede KDV hariç 289.343,02 TL revizyon olmuştur. 30/05/2016 tarihinde 250.000 kitap kapasiteli kütüphane binamız tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ahmet BAZENCİR – Coşkun KARAUSTA Adi İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Kütüphane Binası Yapım İşi
İhale Bedeli	9.123.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	289.343,02 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	09.09.2014
Sözleşme Tarihi	06.11.2014
Yer Teslim Tarihi	10.11.2014
Fiilen İşe Başlama Tarihi	10.11.2014
İşin Bitim Tarihi	03.05.2016
2016 Yılı Harcama Tutarı	3,505.112,81 TL
Toplam Harcama Tutarı	11,038.245,92 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.


Çizelge 35: Kütüphane Binası Yapım İşi

Fiziki Mekân Artışı	Adedi	m²
Grup çalışma odası	12	336,00
Bireysel çalışma odası	42	218,40
Katalog tarama odası	6	117,00
Personel odası	7	123,00
Kantin	1	147,00
Mescit	2	27,00
Ödünç alma odası	1	45,00
İnternet erişim merkezi	1	66,00
Teknik hizmetler birimi	1	34,00
Katalog sınıflama, ciltleme, onarım	1	143,00
Çok amaçlı salon, sergi	1	68,00
Toplantı, eğitim salonu	1	85,00
Konferans salonu	1	145,00
Bilgi işlem odası	2	34,00
Büro	4	164,00
Arşiv	6	370,00
Tez kaynaklar birimi	1	74,00
Nadir eserler birimi	1	56,00
Çeşitli okuma salonları	11	3.405,00
TOPLAM	102	5657,40

Çizelge 36: Kütüphane Binası fiziki mekan artışı



Şekil 20: Kütüphane

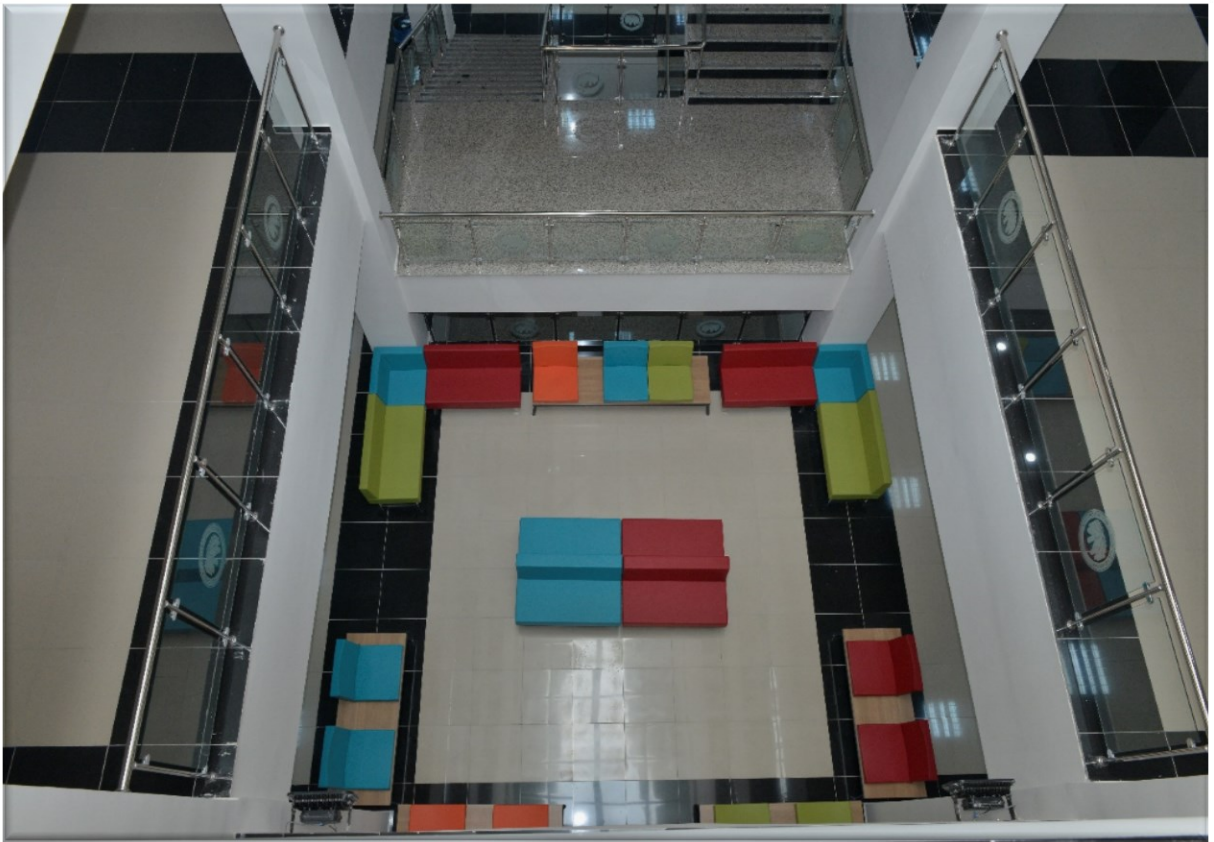

Şekil 21: Kütüphane Binası İç Görünüm

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin eğitim-öğretime devam etmekte olan bölümleri ile öğrenci alımı yapılarak eğitim-öğretim verecek olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik bölümlerindeki öğrencilerin eğitimlerini uygulamalı ve daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için 10.500 m² alana sahip laboratuvarlar yapılması amacıyla ihaleye çıkılmış fakat ihale iptal edilmiştir. 2017 yılı içerisinde yeniden ihale edilmesi planlanmaktadır.

3.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2016 yılı bütçemize ayrılan ödenek 2.000,00 TL olup, yıl içerisinde 5.429.677,00 TL tutarında ödenek eklemesi yapılmış, eklemeler sonucunda 2016 yılı toplam ödeneği 5.431.677,00 TL olmuştur. Toplam harcama 5.315.956,03 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	5000 seyircili Trb. Snt. Yüzy.Atl.Pis.Fut.Sah
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	2.000,00 TL
Eklenen	5.429.677,00 TL
Toplam Ödenek	5.431.677,00 TL
Harcama	5.315.956,03 TL
Kalan Ödenek	115.720,97 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	97,87

Çizelge 37: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı	1	4.480.379,60
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ 1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	835.576,43
TOPLAM		2	5.315.956,03

Çizelge 38: 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı

KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü öğrencilerine daha iyi eğitim verilmesi ve Üniversitemizin üniversitelerarası spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla 5.000 kişilik stadyum yapılacaktır. Stadyumun öncelikle açık spor alanının yapımı planlanmış ve 2015 yılı içerisinde KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapım İşi olarak ihaleye çıkmıştır. 15/12/2016 tarihinde tamamlanan işin geçici kabulü yapılmış olup kesin hakedişinin 2017 yılı içerisinde yapılacağı öngörülmektedir. Tribün ve diğer inşaatların 2017 yılı ve sonrasında yapılması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ketu İnşaat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı
İhale Bedeli	3.895.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	08.09.2015
Sözleşme Tarihi	28.12.2015
Yer Teslim Tarihi	04.01.2016
Fiilen İşe Başlama Tarihi	04.01.2016
İşin Bitim Tarihi	15.12.2016
2016 Yılı Harcama Tutarı	4.480.379,60 TL
Toplam Harcama Tutarı	4.480.379,60 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 39: KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı



Şekil 22: Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti

KMÜ 1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

K.M.Ü. 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu yapım işi 15/12/2012 tarihinde tamamlanmıştır. Fakat yapılan imalat sözleşmedeki şartnameye uymadığı için güneş kırıcı çelik tel için yüklenici firmaya ödeme yapılmamıştır. Dava süreci 2016 yılında sonuçlanmış ve karar gereği yüklenici firmaya 835.576,43 TL ödeme yapılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	K.M.Ü. 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İhale Bedeli	7.143.605,98 TL
İhale Tarihi	22.06.2010
Sözleşme Tarihi	10.08.2010
Yer Teslim Tarihi	13.08.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	13.08.2010
İşin Bitim Tarihi	15.12.2012
2016 Yılı Harcama Tutarı	835.576,43 TL
Toplam Harcama Tutarı	8.287.290,56 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatin Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 40: 1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

4. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe, Kamu Yatırım İzleme Sistemi ve kamuyat programları arasında düzenleme yapılmalıdır.
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.

5. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özeti³

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2016 Yılı Fiyatlarıyla (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		191.536		135.782	135.782		24.002	24.002		19.974	19.974		24.751	24.751
Sağlık															
D.KamuHizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6		191.536		135.782	135.782		24.002	24.002		19.974	19.974		24.751	24.751

Çizelge 41: 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

³ Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

6. 2016 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu**2016 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU****Kuruluş Adı** : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Eğitim

2016 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi (1.000)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
244552	490	2015H032860	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2016	Karaman	0	100	0	0	0	100					13
254331	490	2009H031580	Kampüs Altyapısı	Özel	2017	Karaman	0	45.000	33.998	0	0	10.227					4.525
267372	490	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2017	Karaman	0	125.000	101.784	0	0	19.781					7.103
247226	490	2015H032870	Muhtelif İşler	Özel	2016	Karaman	0	7.930	0	0	0	7.930					7.288
244561	490	2015H032880	Yayın Alımı	Özel	2016	Karaman	0	506	0	0	0	506					506
271279	490	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2017	Karaman	0	13.000	0	0	0	5.432					5.316
TOPLAM							0	191.536	135.782	0	0	43.976					24.751

Çizelge 42: 2016 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu
