

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



2017 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2018 - KARAMAN



Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	I
1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	V
2. GENEL DEĞERLENDİRME	1
2.1. UZGÖRÜŞÜMÜZ	1
2.2. ÖZGÖREVİMİZ	1
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	2
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	6
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	7
2.6. 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	10
2.6.1. Hedeflenen.....	10
2.6.2. Gerçekleşen	10
2.7. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	11
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	11
2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	20
3. PROJE UYGULAMALARI	21
3.1. 2017H033060 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ.....	21
3.2. 2017H033070 MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	23
3.3. 2017H033080 YAYIN ALIMI PROJESİ.....	33
3.4. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	38
3.5. 2009H031590 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	47
3.6. 2010H050170 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ	50
4. ÖNERİLER	55
5. 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	56
6. 2017 YILI YATIRIM HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU	57

ÇİZELGELER TABLOSU

Çizelge 2: Taşınmazların Dağılımı (m2)	7
Çizelge 3: Kapalı Mekanların Dağılımı.....	8
Çizelge 4: Üniversitemiz Kapalı Mekanların Dağılımı (m ²).....	9
Çizelge 5: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı (II. Düzey)	11
Çizelge 6: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey).....	12
Çizelge 7: 06.1 Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	14
Çizelge 8: 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	15
Çizelge 9: 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....	16
Çizelge 10: 06.7 Geyrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	16
Çizelge 11: Revizyon (2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi).....	17
Çizelge 12: Revizyon (2017H033070 Nolu Muhtelif İşler)	17
Çizelge 13: Revizyon (2017H033080 Nolu Yayın Alımı).....	18
Çizelge 14: Revizyon (2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı)	18
Çizelge 15: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler).....	19
Çizelge 16: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	19
Çizelge 17: 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	21
Çizelge 18: 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı	22
Çizelge 19: 2017H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi	23
Çizelge 20: 2017033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi Harcamalarının Detayı	24
Çizelge 21: 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	33
Çizelge 22: 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı	34
Çizelge 23: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	38
Çizelge 24: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı	39
Çizelge 25: 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi.....	40
Çizelge 26: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	42
Çizelge 27: KMÜ İhata Duvarı Yapım İşİ.....	44
Çizelge 28: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	47

Çizelge 29: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı .	48
Çizelge 30: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İşi.....	48
Çizelge 31: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	50
Çizelge 32: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı.....	51
Çizelge 33: Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin Üstünün Kapatılması.....	51
Çizelge 34: KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı.....	53
Çizelge 35: 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	56
Çizelge 36: 2017 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu	57

KISALTMALAR

BESYO	: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
EBYS	: Elektronik Belge Yönetim Sistemi
KMÜ	: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
MYO	: Meslek Yüksekokulu

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Köklü geçmişe ve medeniyete sahip Türkçemizin başkenti Karaman'ın güzide eğitim kurumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde rektör olarak atanarak 26 Ocak 2017 tarihinde bu kutlu görevi devraldım.

Üniversitemizi şehir ve bölge boyutundan daha ileri noktalara taşımak, Ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma getirerek uluslararası bir üniversite hüviyetine kavuşturmak, erdemli ve kalifiye insanlar yetiştirecek her türlü sosyal, bilimsel ve teknolojik alt yapıyı

hazırlamak, mensuplarımızla birlikte hem milletimizin ufkuna hem de insanlığa yeni bir soluk getirmek en büyük temennimizdir.

Bütün paydaşlarımızla bölgesel kalkınma özgörevini ve farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle şehir-üniversite bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atacağız.

Üniversitemiz, bölgesel kalkınmayla birlikte ulusal ölçekte gelişime ve kalkınmaya katkıda bulunmak gayret ve çabası içerisinde. Buradan hareketle, bölgemizin avantajlarından da yararlanarak gıda-tarım, enerji ve Türk Dili alanlarını farklılaşma stratejisi olarak belirlemiş ve yeni dönem Stratejik Planını bu yönde oluşturmuştur. Farklılaşma yolunda ise önemli adımlardan biri olarak Yunus Emre Yerleşkesinde 10 bin metrekare alanda Güneş Enerji Sistemi ile elektrik üretimi yapmaya başlamıştır. Söz konusu tesis, yılda ortalama 754 bin 511 kilowatt saatlik enerji üreterek, yerleşkemiz elektrik sarfiyatının yaklaşık yüzde 25'ini karşılamaktadır. Toplamda 2 milyon 76 bin 800,00 TL'ye tamamlanan proje için altı yıl gibi kısa bir süre içerisinde yatırım geri dönüşüm sürecini tamamlayacaktır. Projenin diğer bir katkısı da özellikle Üniversitemiz Enerji Sistemleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin bu sahada uygulamalı eğitim imkânına kavuşması ve yenilenebilir enerjinin bir kolu olan PV sistemlerin çalışması, kurulumunun nasıl gerçekleştiği ve gelişen teknoloji ile nasıl iyileştirmeler yapılabileceği konusunda bilgi birikimi sağlamış olacaktır.

Yine 2017 yılı yatırım bütçemizde yer alan ödeneklerden, eğitim öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikaların öncelendiği görülmektedir. Buna yönelik olarak gerekli olan derslik, makine-teçhizat, taşıt, fiziki ve teknolojik altyapı alanlarında ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı "2017 Yılı Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu" muzu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Uzgörüřümüz

Bilgi çağının gerektirdiğı nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyler yetiřtiren ve gıda sektörünün iyileřtirilmesi ile Türk dilinin arařtırılması, yaygınlařtırılması, Türkçe bilincinin yerleřtirilmesi konularında öncü çalışmalar yapan “sıradan değıl, aranan” bir üniversite olmaktır.

2.2. Özgörevimiz

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; çağdař ve etik deęerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, üstün nitelikli bireyler yetiřtirmeyi ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı saęlamayı özgörev edinmiřtir.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

Kurumsallaşma Eksenı

STRATEJİK AMAÇ 1: Etkin Ve Verimli Bir İdari Yapı Kurarak, Ulusal Ve Uluslararası Tanınırlığı Artırmak Ve Kurumsal Gelişmeyi Sağlamak.

1. Akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan personeli tamamlamak için serbest kadroların doluluk oranını her yıl %8 artırmak
2. İdari personelin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak
3. Üniversite özgelirlerini her yıl %8 arttırmak
4. Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek için personele yönelik sosyal veya kültürel organizasyon sayısını her yıl %20 arttırmak
5. Üniversite adayları nezdinde tanınırlığın ve Üniversitemize olumlu kanaatlerin artırılması ile öğrenci sayısının artırılması için her yıl 20.000 adaya üniversitenin tanıtımının yapıldığı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alt yapı olanaklarının ortaya konduğu materyaller (kitapçık, CD vb.) dağıtmak
6. Sosyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısını her yıl %10 arttırmak
7. Plan dönemi sonunda idari personelin %5'inin en az bir yabancı dil yeterliliğinin olmasını sağlamak
8. 2017 yılı sonuna kadar Üniversite stadyumunu inşa ederek hizmete açmak
9. 2017 yılı sonuna kadar yüksek lisans ve doktora yapan idari personelin toplam idari personele oranını %10'a çıkarmak
10. İş ve işlemlerin daha hızlı yapılması, maliyetlerin düşürülüp verimliliğin artırılması ve güvenilir bir elektronik ortamda işlemlerin yapılabilmesi için e-imza uygulamalı e-arşiv, e-evrak sistemini 2014 yılında faaliyete geçirmek
11. 2013 yılından itibaren, her eğitim öğretim yarıyılı başında öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlemek
12. 2014 yılından itibaren, personelimizle her son sınıf öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olmasını sağlamak ve 2017 yılına kadar toplam 15.500 ağaç dikimi gerçekleştirmek
13. En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek
14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak bir kimlik ortaya koymak amacıyla 2014 yılına kadar, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) için başvuru yapmak
15. Diğer üniversitelerle işbirliği yaparak idari ve akademik personelin ortak çalışmalar yapmasını sağlamak
16. 2013 yılında öz değerlendirme kurulu oluşturarak kuruma bağlılık ve isteklendirmeyi geliştirmek
17. Mezunların Üniversite'ye, birimlerine ve birbirlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılmasını sağlamak
18. Toplum ve medya ile ilişkileri geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ 2: Eğitim Ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek İçin Fiziki Altyapıyı Geliştirerek, Nitelikli Akademisyenler İle Eğitim Seviyesini Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilir Seviyeye Çıkarmak.

1. 2017 yılı sonunda 12.500 öğrenci sayısına ulaşmak
2. 2017 yılı sonunda öğretim üyelerinin öğretim elemanları içindeki payını %42'ye çıkarmak
3. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak
4. 2017 sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekanların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak
5. Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmak için 2015 yılı sonunda engelsiz üniversite projesini %100 oranında tamamlamak
6. Öğrencilerin yönetime aktif olarak katılımını sağlamak
7. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl %10 arttırmak
8. Plan dönemi sonunda uzaktan eğitim programlarını hizmete açmak için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak
9. Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için sertifikalı yeni kurslar açarak plan dönemi sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını 3 katına çıkarmak
10. 2014 yılı sonuna kadar Üniversitemizdeki tüm eğitim-öğretim programlarını geliştirmek
11. Plan dönemi sonuna kadar Diploma Supplement Label ve ECTS Label uygulamasına geçmek
12. 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizde kalite güvence sistemi oluşturarak “Kalite Sertifikası” almak
13. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ile personelin ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak için uluslararası değişim programlarına katılan personel ve öğrenci sayısını her yıl %15 arttırmak
14. Her yıl Karaman’da faaliyet gösteren en az 5 şirketle staj anlaşması yapmak
15. Yüksek lisans ve doktora programı açmak ve eğitimin kalitesini artırmak amacıyla plan dönemi sonuna kadar eğitim verilen her bölümde en az iki profesör veya doçentin hizmet vermesini sağlamak
16. Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanı başına öğrenci sayısını 25’te tutmak
17. 2017 yılına kadar yabancı ülkelerdeki en az 500 uluslararası öğrencinin Üniversitemizde öğrenim görmelerini sağlamak
18. Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artırılması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilen etkinlikleri her yıl %10 arttırmak
19. Eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇ 3: Üniversitenin Ve Bölgenin İhtiyacı Olan Her Türlü Araştırmanın Yapılabildiği Ve Üretilen Bilginin Paydaşlara Sunulduğu Bir Bilgi Merkezi Olmak.

1. Tüm paydaşların yararlanabileceği uluslararası kuruluşlarca denkliği kabul edilmiş merkezi araştırma laboratuvarını 2017 yılında hizmete sunmak
2. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimini güçlendirmek
3. Bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan yayın sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan veri tabanları ile basılı ve elektronik yayınların sayı ve çeşitliliği her yıl %10 arttırmak
4. Bilimsel araştırma ve yayın sayısını her yıl %10 arttırmak
5. Bilimsel proje sayısını her yıl %10 arttırmak
6. Tüm proje çıktıları ile ilgili olarak paydaşları bilgilendirmek
7. Tüm araştırma ve projelerin %5'ini disiplinler arası çalışma ile yürütmek
8. Plan dönemi sonuna kadar en az bir patent almış olmak
9. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı seminer, konferans ve toplantı vb. etkinliklere katılım sayısını her yıl %10 arttırmak
10. 2013 yılından itibaren lisansüstü düzeyde yapılan çalışmaların en az % 10'unun bölge ve ülke sorunları ile ilgili olmasını sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 4: Karaman'ın Ve Türkiye'nin Gıda Üretiminde Ve Ürün Çeşitliliğinde, Kalite Ve Rekabet Gücünün Yükseltilmesi Konularında Çalışmalar Yapmak.

1. Plan dönemi sonuna kadar Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanı sayısını 6'dan 14'e çıkarmak
2. Plan dönemi sonuna kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde tahıl, meyve-sebze, et-süt mikrobiyoloji-biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapılacak Ar-Ge pilot tesisleri ve laboratuvarları kurmak
3. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlamak ve tamamlamak
4. Plan dönemi sonuna kadar ülke gıda sanayinin kalite ve rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde toplam en az 50 makale yayınlamak
5. Plan dönemi sonuna kadar bölge gıda sanayi profiline (bisküvi-kraker-gofret, bulgur, elma vb.) uygun en az beş kongre/sempozyum/çalıştay ve konferans/panel düzenlemek
6. Gıda Mühendisliği Bölümünde üretilen bilgi ve teknolojinin bölge gıda sanayine aktarılmasını sağlamak için plan dönemi sonuna kadar "Gıda Ürünleri Geliştirme ve Teknoloji Transfer Merkezi" kurmak
7. Bölge gıda sanayinde çalışan teknik elemanların (Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Gıda Teknisyeni vb.) bilgi ve teknolojik düzeylerini hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek amacıyla her yıl eğitim seminerleri ve uygulamalı çalıştaylar düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 5: Türkçenin Doğru Ve Güzel Kullanılmasını Ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak.

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresini geleneksel hale getirip iki yıl arayla düzenlemek
2. Türk Dilinin güncel sorunları üzerine yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi sonuna kadar konuyla ilgili en az bir bilgi şöleni/çalıştay düzenlemek
3. Karamanlı Türkçesi (Karamanlîca) üzerine düzenlenen çalışmalarda öncü olmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve plan dönemi içinde konuyla ilgili en az 5 tane konferans, panel vb. etkinlikler gerçekleştirmek
4. Plan dönemi sonuna kadar Türkçe Müzesi kurmak
5. 2017 yılından itibaren her yıl Türkçe Yetkinlik Sınavı düzenleyip başarılı olanlara “Türkçe Yetkinlik Belgesi” vermek ve belgenin ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak
6. Plan döneminde Türkçe üzerine hazırlanan çalışmaları yayınlamak, araştırmacılara destek olmak ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak
7. Türkçenin doğru etkili kullanılması ve tüm dünyada yaygınlaştırılması için 2017 yılı sonuna kadar en az beş tane ulusal/uluslararası organizasyon (kongre, bilgi şöleni ve yarışma) düzenlemek
8. Türkçenin kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel kullanılmasını desteklemek amacıyla yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında Türkçeyi en iyi kullanan radyo ve televizyon sunucuları ile şair ve yazarlardan plan dönemi sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak olan oylama sonucunda belirlenenlere geleneksel olarak ödül, onurluk vb. vermek
9. Karaman ve Türkiye’de iş yerlerine Türkçe isim verilmesi konusunda karar alınması için Belediyelerle ve Türk Dil Kurumu ile ortak çalışmalar yürütmek
10. Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde plan dönemi sonuna kadar bir Çeviri Merkezi kurmak

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz, 2017 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 29.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 22.135.501,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 51.135.501,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynaklarıyla karşılanmıştır. Projelerin sektöre göre harcama detayları *Çizelge-1*'de yer almaktadır.


Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2017 Yılı Program Ödeneği	2017 Yılı Revizeli Ödenek	2017 Yılı Harcama
Eğitim- Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	150.000.000,00	116.499.000,00	12.400.000,00	26.877.460,00	0,00
Eğitim- Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı (KOP)	52.250.000,00	41.512.000,00	5.000.000,00	9.447.399,00	1.248.679,71
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	35.000.000,00	26.589.000,00	4.000.000,00	4.503.077,00	1.071.664,19
Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	168.000,00	0,00	100.000,00	168.000,00	152.574,00
Eğitim- Yükseköğretim	Muhtelif İşler (KOP)	9.639.565,00	0,00	7.000.000,00	9.639.565,00	8.078.558,25
Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı (KOP)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	494.239,98
TOPLAM		247.557.565,00	184.600.000,00	29.000.000,00	51.135.501,00	11.045.716,13

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taşınmaz varlığı *Çizelge-2*'de yer almakta olup dağılımı *Grafik-1*'de gösterilmiştir. Taşınmazların %94'ü Yunus Emre Yerleşkesi, %3'ü Ermenek MYO ve yine %3'ü Kazım Karabekir MYO'da yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	1.652.648,35	-	1.661.715,35
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazım Karabekir Yerleşkesi	36.322,00	24.102,00	-	60.424,00
Genel Toplam	100.176,11	1.676.750,35	-	1.776.926,46

Çizelge 1: Taşınmazların Dağılımı (m2)

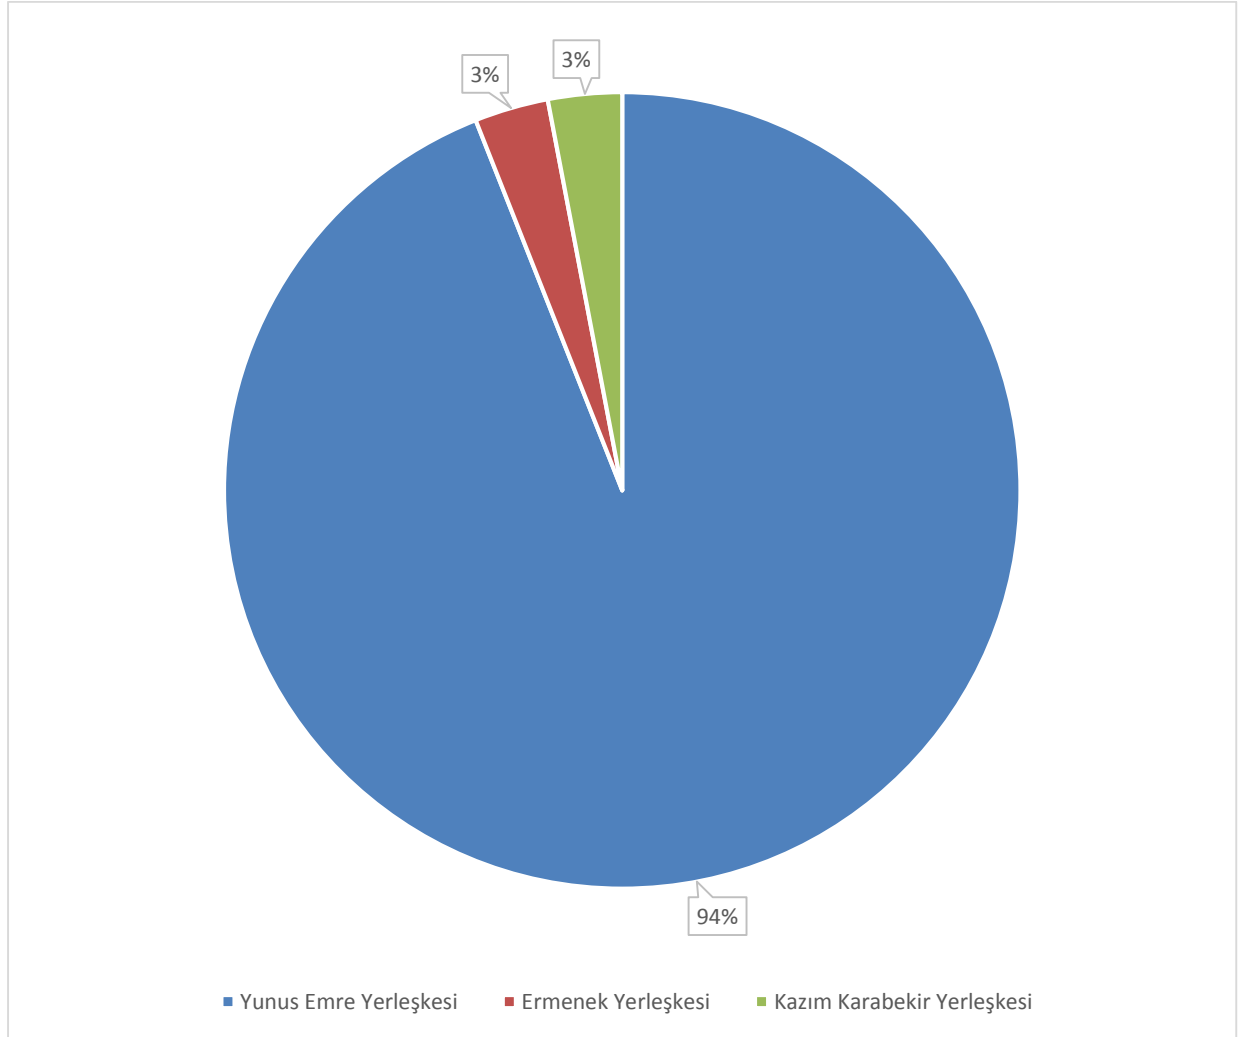


Grafik 1: Taşınmazların yerleşke itibariyle dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânların hizmet alan bilgileri *Çizelge-3*'de yer almakta olup dağılımı *Grafik-2*'de gösterilmiştir. Kapalı hizmet alanlarının %75'ini eğitim alanları, %8'ini spor alanları, %9'unu sosyal alanlar, %6'sını idari alanlar ve %2'sini de diğer alanlar oluşturmaktadır.

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazımkarabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	8.175	-	-	6.755
Eğitim	107.800	7.000	5.680	123.655
Sosyal	13.533	-	-	13.533
Spor	12.582	3.038	150	16.916
Barınma	3.235	-	-	1.480
Genel Toplam	145.325	10.038	5.830	161.193

Çizelge 2: Kapalı Mekanların Dağılımı

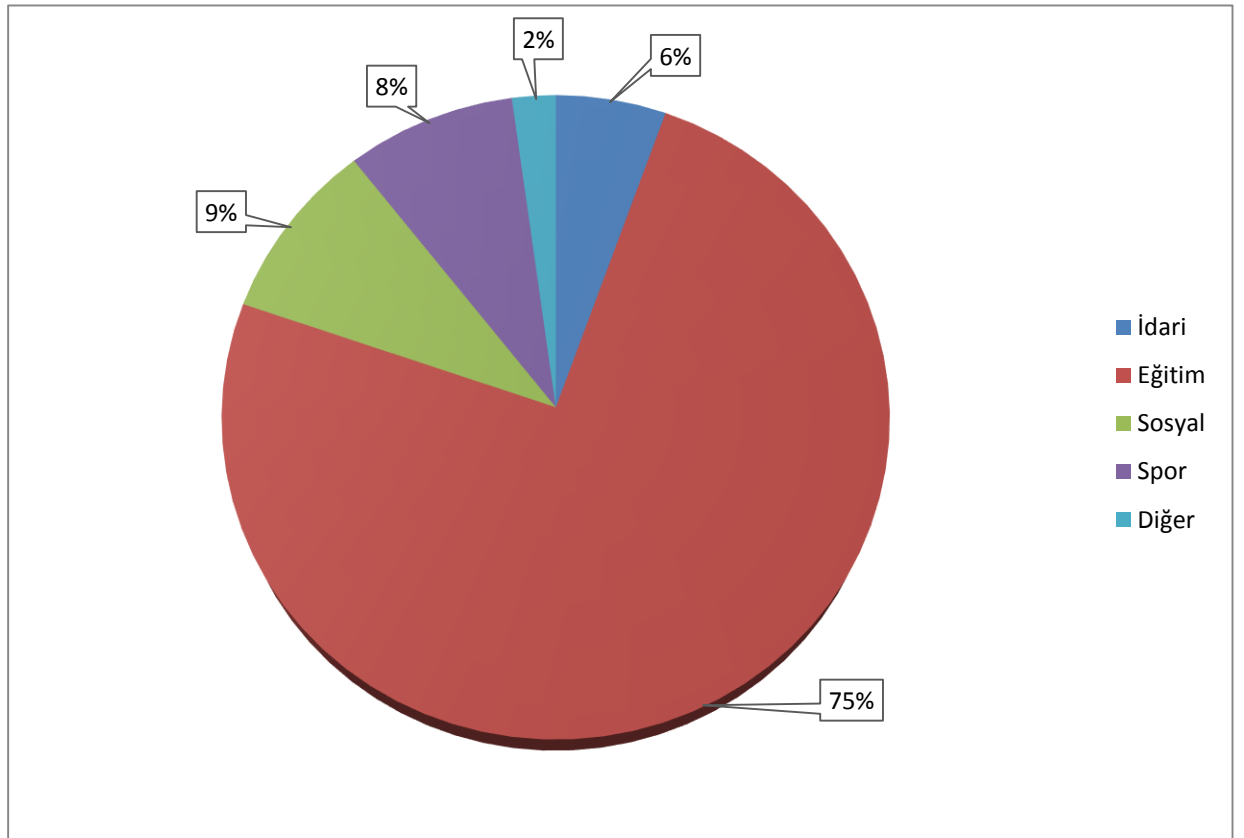

Grafik 2: Taşınmazların hizmet alanları itibariyle dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı *Çizelge-4*'de yer almaktadır.

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Diğer
Rektörlük Hizmet Binası	5.000				
Isı Merkezi					1.755
Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu		17.420			
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		13.000			
İslami İlimler Fakültesi		8.350			
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635			
Mühendislik Fakültesi		20.435			
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		9.270			
Sağlık Bilimleri Fakültesi		3.600			
Ermenek Meslek Yüksekokulu		4.175	150		
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu		7.000	3.038		
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		3.615			
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		6.640			
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		3.170			
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		7.165			
Ermenek Meslek Yüksekokulu Atölyesi		1.505			
Bilgi İşlem Merkezi	3.175				
Kütüphane Binası		10.500			
1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu			7.500		
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu			5.082		
Amfi Tiyatro				533	
Öğrenci Yaşam Merkezi				13.000	
Uygulama Otel					1.130
Rektörlük Konutu					350
TOPLAM	8.175	120.480	15.770	13.533	3.235
GENEL TOPLAM	161.193				

Çizelge 3: Üniversitemiz Kapalı Mekanların Dağılımı (m²)

2.6. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.6.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2017 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, taşıt, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüd projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2017 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2017 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ✓ Sosyal Bilimler MYO çevre düzenlemesi ve ihata duvarı yapım işinin yapımı işi tamamlanmıştır.
- ✓ Kazım Karabekir MYO açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işi tamamlanmıştır.
- ✓ Kazım Karabekir MYO Çok Amaçlı Salon Çelik ve Betonarme Projesi, Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesisleri Üstü Kapatılması İş Çelik Projesi , Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Statik Projesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 10.000 m² Kapalı Alanlı Statik Projesi, 5.000 Kişilik Tribün Statik ve Mimari Projesi, 539 Kwa Güneş Enerji Santrali Projesi, Eğitim Fakültesi Binası Statik Projesi hizmet alımı gerçekleştirilmiş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Binası Zemin Etüdü yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) ile taşıt alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır.
- ✓ İhtiyacımız doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.
- ✓ Kütüphanemizin elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır. Bu aşamada 628 adet basılı, 631 adet elektronik yayın alımı, 7 elektronik veri tabanı ve 1 urkund intihal programı aboneliği gerçekleştirilmiştir.


2.7. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 29.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 51.135.501,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 11.045.716,13 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 21,60'dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerinin dağılımına ilişkin bilgiler Çizelge-5'de yer almakta olup Grafik-3'de gösterilmiştir.

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	4.940.000,00	2.505.237,00	7.445.237,00	7.392.908,39	99,30
6.3	Gayrimaddi Hak Alımları	60.000,00	134.328,00	194.328,00	194.327,14	100,00
6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.500.000,00	19.495.936,00	40.995.936,00	2.472.917,90	6,03
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	985.562,70	39,42
TOPLAM		29.000.000,00	22.135.501,00	51.135.501,00	11.045.716,13	21,60

Çizelge 4: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı (II. Düzey)

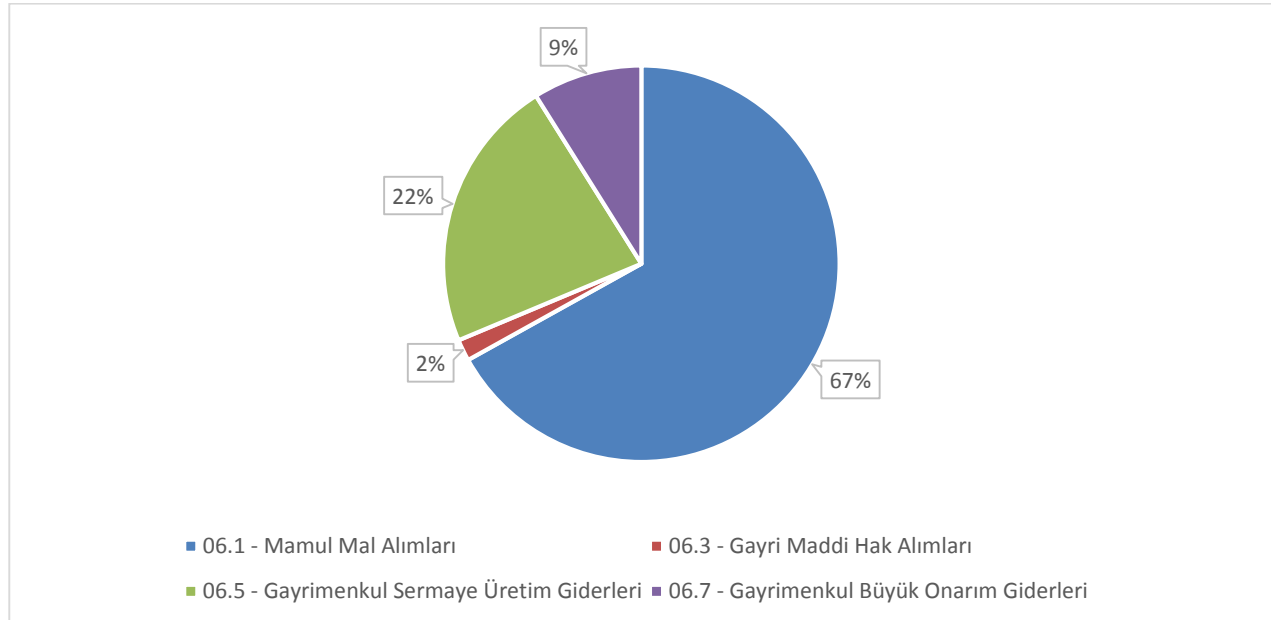

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Yılı bütçesi ile verilen sermaye giderlerine ilişkin 2017 yılı yatırım harcamalarının ekonomik detay dağılımı aşağıdaki Çizelge-6'da yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	257.715,26
6	1	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	121.292,50
6	1	1	5	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	19.482,44
6	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	17.342,55
6	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	415.832,75
6	1	2	1	Büro Makineleri Alımları	29.630,74
6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	1.954.436,76
6	1	2	3	Tıbbi Cihaz Alımları	13.270,51
6	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	3.351.126,47
6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	24.950,27
6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	781.522,73
6	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	6.154.937,48
6	1	4	1	Kara Taşıtı Alımları	325.198,18
6	1	4		Taşıt Alımları	325.198,18
6	1	5	1	Sabit İş Makinesi Alımları	2.700,00
6	1	5		İş Makinası Alımları	2.700,00
6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	18.643,52
6	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	453.176,46
6	1	6	4	Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları	22.420,00
6	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	494.239,98
6	1			Mamul Mal Alımları	7.392.908,39
6	3	1	1	Bilgisayar Yazılı Alımları	194.327,14
6	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	194.327,14
6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	194.327,14
6	5	1	1	Proje Giderleri	152.574,00
6	5	1	90	Diğer Giderler	84.597,95
6	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	237.171,95
6	5	7	90	Diğerleri	2.235.745,95
6	5	7		Müteahhitlik Giderleri	2.235.745,95
6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.472.917,90
6	7	7	90	Diğerleri	985.562,70
6	7	7		Müteahhitlik Giderleri	985.562,70
6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	985.562,70
6				Sermaye Giderleri	11.045.716,13

Çizelge 5: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

06.1 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 4.940.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 2.505.237,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 7.445.237,00 TL olmuştur. 2017H033070 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 6.898.668,41 TL, 2017H033080 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 494.239,98 TL harcama yapılmış olup, bu iki projenin toplam harcaması 7.392.908,39 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 99,30'dur. 06.1 Mamul mal alımlarına ilişkin harcama detayına *Çizelge-7*'de yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.1.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	257.715,26	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.1.3	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	121.292,50	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.1.5	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşat Alımı	19.482,44	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.1.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	14.492,85	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.1.90	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	2.849,70	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			415.832,75	
06.1.2.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	29.630,74	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.2.2	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	1.946.162,15	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.2.2	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	8.274,61	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.2.3	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımı	13.270,51	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.2.4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	3.351.126,47	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.2.5	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	24.950,27	2017H033070	Muhtelif İşler

06.1.2.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	768.153,97	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.2.90	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	13.368,76	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları			6.154.937,48	
06.1.4.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımı	325.198,18	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.4	Taşıt Alımları			325.198,18	
06.1.5.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sabit İş Makinesi Alımı	2.700,00	2017H033070	Muhtelif İşler
06.1.5	İş Makinası Alımları			2.700,00	
06.1.6.1	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	18.643,52	2017H033080	Yayın Alımı
06.1.6.3	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	453.176,46	2017H033080	Yayın Alımı
06.1.6.4	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları	22.420,00	2017H033080	Yayın Alımı
06.1.6	Yayın Alımları ve Yapımları			494.239,98	
06.1	Mamul Mal Alımları			7.392.908,39	

Çizelge 6: 06.1 Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 60.000,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 134.328,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 194.328,00 TL olmuştur. 2017H033070 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 194.327,14 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 100,00'dür. 06.3 Gayrimaddi hak alımlarına ilişkin harcama detayına Çizelge-8'de yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.3.1.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	194.327,14	2017H033070	Muhtelif İşler
06.3.1	Bilgisayar Yazılımı Alımları				194.327,14
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları				194.327,14

Çizelge 7: 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 21.500.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde finansman fazlasından 14.575.936,00 TL ve Kalkınma Bakanlığı'nın onayı ile Maliye Bakanlığı tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi için gönderilen 4.920.000,00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 40.995.936,00 TL olmuştur. 2017H033060 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, 2009H031580 nolu Kampüs Altyapısı projesi ile 2010H050170 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 2.472.917,90 TL harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 6,03'dür. 06.5 Gayrimenkul sermaye üretim giderlerini ilişkin harcama detayına *Çizelge-9*'da yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.5.1.1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	152.574,00	2017H033060	Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi
06.5.1.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	84.597,95	2009H031580	Kampüs Altyapısı
06.5.1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler			237.171,95	
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	1.164.081,76	2009H031580	Kampüs Altyapısı
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	1.071.664,19	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
06.5.7	Müteahhitlik Giderleri			2.235.745,95	
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			2.472.917,90	

Çizelge 8: 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 2017H033070 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 985.562,70 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 39,42'dir. 06.7 Gayrimenkul büyük onarım giderlerine ilişkin harcama detayına *Çizelge-10*'da yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.7.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	985.562,70	2017H033070	Muhtelif İşler
06.7.7	Müteahhitlik Giderleri			985.562,70	
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			985.562,70	

Çizelge 9: 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

Üniversitemiz 2017 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge 11-12-13-14-15-16*'da yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'de gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2017H033060
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2017-2017
2017 Yılı Proje Tutarı	100.000,00 TL
2016 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2017 Yılı Yatırımı	100.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan *	68.000,00 TL
2017 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	168.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı Revizyonu	168.000,00 TL

Çizelge 10: Revizyon (2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2017H033070
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2017-2017
2017 Yılı Proje Tutarı	7.000.000,00 TL
2016 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2017 Yılı Yatırımı	7.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan *	2.639.565,00 TL
2017 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	9.639.565,00 TL
2017 Yılı Yatırımı Revizyonu	9.639.565,00 TL

Çizelge 11: Revizyon (2017H033070 Nolu Muhtelif İşler)

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2017H033080
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2017-2017
2017 Yılı Proje Tutarı	500.000,00 TL
2016 Yılı Kümülatif Harcama	0,00 TL
2017 Yılı Yatırımı	500.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan	0,00 TL
2017 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	500.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı Revizyonu	500.000,00 TL

Çizelge 12: Revizyon (2017H033080 Nolu Yayın Alımı)

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2017
2017 Yılı Kümülatif Proje Tutarı*	47.500.000,00 TL
2016 Yılı Kümülatif Harcama	41.512.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı	5.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan**	4.447.399,00 TL
2017 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	52.250.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı Revizyonu	9.447.399,00 TL

Çizelge 13: Revizyon (2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı)

* 2009 yılında 10.000.000,00 TL olan Kampüs Altyapısı proje tutarı 2017 yılında 47.500.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2017
2017 Yılı Kümülatif Proje Tutarı*	138.000.000,00 TL
2016 Yılı Kümülatif Harcama	116.499.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı	12.400.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	14.477.460,00 TL
2017 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	150.000.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı Revizyonu	26.877.460,00 TL

Çizelge 14: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)

* 2009 yılında 10.000.000,00 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler proje tutarı 2017 yılında 138.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır.


** 9.557.460,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle, 4.920.000,00 TL Maliye Bakanlığı tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi için gönderilen ödenekten karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2017
2017 Yılı Kümülatif Proje Tutarı*	35.000.000,00 TL
2016 Yılı Kümülatif Harcama	26.589.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı	4.000.000,00 TL
Eklenen/Aktarılan **	503.077,00 TL
2017 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	13.000.000,00 TL
2017 Yılı Yatırımı Revizyonu	4.503.077,00 TL

Çizelge 15: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

* 2010 yılında 6.000.000,00 TL olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri proje tutarı 2017 yılında 35.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

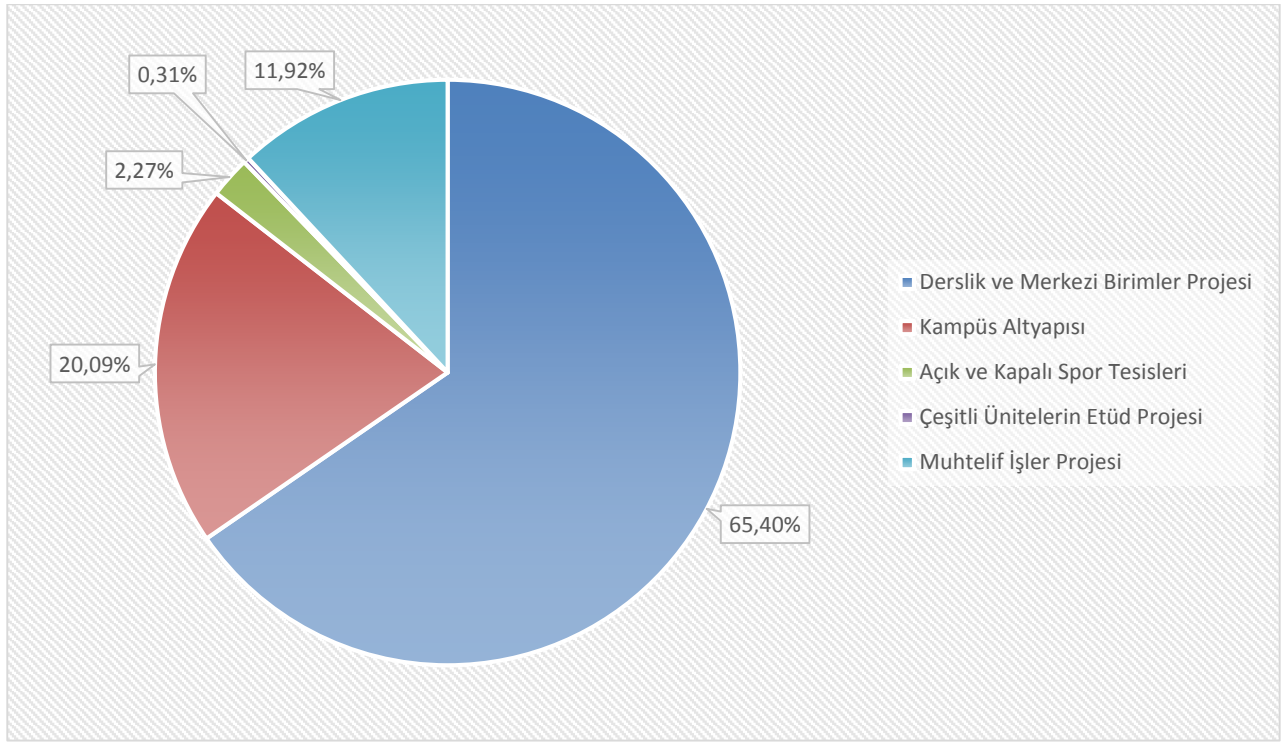

Grafik 4: Yapılan Rezizyonların Proje Bazında Dağılımı

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Üniversitemizin tabi olduğu yasal mevzuat gereği takip edilen süreçler içerisinde özellikle Fetö/PDY yapılanmasına ilişkin olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, ihaleye katılan isteklilerin sorgulama süreçlerinin gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmamış olması sebebiyle gecikmesi ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin imzalanmasında öngörülen sürelerde işin sonuçlanmamasına sebep olmaktadır. Bu durum planlanan yatırımların zamanında başlanılmasına ve sonuçlandırılmasını olumsuz etkilemektedir.

Bununla birlikte, sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. sebebiyle daha uzun sürmektedir.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2017H033060 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2017 yılı bütçemize 100.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuş olup, likit karşılığı 68.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 168.000,00 TL, toplam harcama ise 152.574,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017H033060 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine ait detaylar *Çizelge-17*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	100.000,00 TL
Eklenen *	68.000,00 TL
Toplam Ödenek	168.000,00 TL
Harcama	152.574,00 TL
Kalan Ödenek	15.426,00 TL
Gerçekleşme Oranı %	90,82 %

Çizelge 16: 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Üniversitemiz tarafından 2017 yılında, Kazım Karabekir MYO Çok Amaçlı Salon için Çelik ve Betonarme Projesi, Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesisleri Üstü Kapatılması İşi için Çelik Projesi , Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon için Statik Proje, Sağlık Bilimleri Fakültesi için 10.000 m² Kapalı Alanlı Statik Projesi, 5.000 Kişilik Tribün için Statik ve Mimari Projesi, 539 kwe Güneş Enerji Santrali Projesi, Eğitim Fakültesi Binası Statik Projesi hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Binası Zemin Etüdü yapılmıştır.

2017H033060 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar *Çizelge-18*'de yer almaktadır.

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Mühendislik Fakültesi Lab. Zemin Etüdü Yapılması	3.540,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO Çok Amaçlı Salon Çelik ve Betonarme Proje Hizmet Alımı	16.520,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesisleri Üstü Kapatılması İşi Çelik Proje Hizmet Alımı	18.290,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Statik Proje Hizmet Alımı	16.520,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Binası Zemin Etüdü Yapılması	9.204,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sağlık Bilimleri Fakültesi 10.000 m ² Kapalı Alanlı Statik Proje Hizmet Alımı	22.420,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.000 Kişilik Tribün Statik ve Mimari Proje Hizmet Alımı	22.420,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	539 kwe Güneş Enerji Santrali Proje Hizmet Alımı	22.420,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Eğitim Fakültesi Binası Statik Proje Hizmet Alımı	21.240,00
TOPLAM		152.574,00

Çizelge 17: 2017H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Harcamalarının Detayı

3.2. 2017H033070 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif işler projesi için 2017 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 7.000.000,00 TL olup likit karşılığı 2.639.565,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 9.639.565,00 TL, toplam harcama ise 8.078.558,25 TL olarak gerçekleşmiştir. *2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar*'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, 2017H033070 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı *Çizelge-19*'da, birimler itibariyle dağılımları ise *Çizelge-20* de yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) ile taşıt alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır. İhtiyacımız doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat , Mefruşat, T-14 (1 adet)
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	7.000.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	7.000.000,00 TL
Eklenen *	2.639.565,00 TL
Toplam Ödenek	9.639.565,00 TL
Harcama	8.078.558,25 TL
Kalan Ödenek	1.561.006,75 TL
Gerçekleşme Oranı %	83,81 %

Çizelge 18: 2017H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi

* Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	823	257.715,26
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımları	490	121.292,50
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	131	14.492,85
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinesi Alımları	16	29.630,74
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	431	1.946.162,15
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımları	2	13.270,51
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihaz Alımları	63	3.351.126,47
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	51	24.950,27
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	250	768.153,97
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Kara Taşıtı Alımları	1	325.198,18
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sabit İş Makinesi Alımları	1	2.700,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	6	194.327,14
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	1	19.482,44
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	1	2.849,70
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	3	8.274,61
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	47	13.368,76
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Büyük Bakım-Onarım	1	985.562,70
TOPLAM		2.325	8.078.558,25

Çizelge 19: 2017033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi Harcamalarının Detayı

Büro Mefruşatı Alımları

Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2 adet halı, 32 adet ağır yük rafı, 30 adet masa, 480 adet koltuk, 279 adet mobilya ve 215 m² perde alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 1: Büro Mefruşatı

Okul Mefruşatı Alımları

Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 100 adet askı, 66 adet amfi sırası, 20 adet yazı tahtası, 4 adet akıllı tahta ve 300 adet laboratuvar taburesi alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 2: Akıllı Tahta

Diğer Mefruşat Alımları

Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 46 adet tekstil ürünü, 85 adet mobilya ile 1 adet televizyon alımı gerçekleştirilmiştir.

Büro Makinesi Alımları


Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2 adet yazıcı, 1 adet barkod okuyucu, 3 adet evrak imha makinesi, 2 adet baskı makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemizdeki engelli kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merkez Kütüphanemiz için alımlar gerçekleştirilmiştir.



Resim 3: Yazıcı ve Evrak İmha Makinesi

Bilgisayar Alımları

Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 2'si dizüstü, 20 tanesi All in One olmak üzere toplam 434 adet bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 4: All in One Bilgisayar

Tıbbi Cihaz Alımları


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere 1 adet hasta başı monitör, 1 adet de Aspiratör alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 5: Aspiratör ve Hasta Başı Monitör

Laboratuvar Cihaz Alımları

Üniversitemiz Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi için 16 adet, Teknik Bilimler MYO için 3 adet, Kamil Özdağ Fen Fakültesi için 2 adet ve Mühendislik Fakültesi için 42 adet olmak üzere toplam 63 adet alım gerçekleştirilmiştir.



Resim 6: Blue-Ray Cyclyer Cihazı



Resim 7: Kramatografi Cihazı



Resim 8: Buğday Öğütme Değirmeni

İşyeri Makine Teçhizat Alımları

Üniversitemiz amfilerinde kullanılmak üzere 46 parça ses sistemi alımı ile 5 adet evrak imha makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 9: Amfi Ve Masa Mikrofonu

Diğer Makine Teçhizat Alımları

Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 20 adet tarayıcı, 1 adet yazıcı, 123 adet kamera, 2 adet güç kaynağı, 30 adet projeksiyon, 1 adet klima, 1 adet dış cephe temizleyici, 3 adet fotoğraf makinesi, 3 adet zemin temizleme otomatı, 1 adet otomat süpürge, 12 adet araç içi kamera, 50 adet telefon ve 46 parça ses sistemi alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 10: Dış Cephe Temizleyici ve Zemin Temizleme Otomatı

Kara Taşıtı Alımları

Üniversitemizde kullanılmak üzere 1 adet su tankeri ve kar bıçağı monteli kamyon alımı (T-14) gerçekleştirilmiştir.



Resim 11: Su Tankeri Ve Kar Bıçağı Monteli Kamyon

Sabit İş Makinesi Alımları

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere 1 adet tesviye küreği alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 12: Tesviye Küreği

Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları

Üniversitemiz Yunus Emre K lt r Evinde kullanılmak  zere 1 takım sedir alımı ger ekleřtirilmiřtir.



Resim 13: Yunus Emre K lt r Evi – Sedir

Bilgisayar Yazılımı Alımları

2017 yılı i erisinde 1 adet anti-vir s, 2 adet g venlik, 1 adet mobil elektronik belge y netim sistemi, 2 adet m hendislik yazılımı alınmıřtır.

- **McAfee Antivir s Yazılımı**

 niversitemizde McAfee lisanslı antivir s yazılımı kullanılmakta ve Endpoint seviyesinde koruma saėlamaktadır.

- **Palo Alto Networks G venlik Yazılımı**

Palo Alto Networks yeni nesil aė g venliėi řirketidir. Palo Alto Networks řirketlerin, servis saėlayıcıların ve resmi kurumların, aėlardaki gittik e karmařıklařan ve hızla b y yen sayıdaki uygulamayı g venle etkinleřtirmelerini ve siber saldırılara karřı korunmalarını saėlayarak aėları g venilir hale getirmektedir. Palo Alto Networks platformunun  ekirdeėini, kendi markası donanım ve yazılım mimarisiyle g venlik duvarı ile t mleřik uygulama, kullanıcı ve i erik g r n rl ė  ve kontrol  saėlayan Yeni Nesil G venlik Duvarı oluřurmaktadır. 100'  ařkın  lkede, 125.000'den

fazla müşteri tarafından kullanılan Palo Alto Networks ayrıca üst üste Gartner MQ Enterprise Network Firewalls yayının da liderliğini korumaktadır.

Palo Alto Networks Yeni Nesil Güvenlik Duvarları şifrelenmiş trafiği de çözümleyerek tüm trafiği uygulama bazlı, fonksiyonel bazlı, kullanıcı ve içerik bazlı sınıflandırabilir. Böylelikle bütünüyle görünürlük, kontrol ve güvenlik sağlayabilir.

- **EBYS Mobil**

01.01.2014 tarihinden itibaren Üniversitemizdeki evrak akışı tamamen elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 2017 yılında mobil ortamda da erişimin sağlanabilmesi amacıyla EBYS Mobil yazılımı satın alınmıştır.

- **ANSYS Academic Research Mechanical And Cfd**

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), ilgili alanda detaylı hesaplamaların yapılabilirdiği, akış alanı ve diğer fiziksel detayların gösterilebildiği, bilgisayar tabanlı bir mühendislik yöntemidir. ANSYS akışkanlar dinamiğinin diğer fiziksel olaylarla ilişkisini modelleme de yüksek teknolojiye multidisipliner yaklaşım kullanılır. CFD analizlerinin sonuçları, simülasyon tabanlı ürün tasarım sürecinde ürünün çalışmasını, varsa problemleri bilgisayara ortamında simüle etmeye ve ürün performansını optimize etmekte önemli faydalar sağlar.

ANSYS Fluent ve ANSYS CFX, genel amaçlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözümleri bu paketin içinde bulunmaktadır. Bu programlar ile üstün fiziksel modelleme yetenekleri donanımların yüksek güvenilirlik ve doğrulukla analiz edilmesini sağlar. Ayrıca CFD-Post gelişmiş kantitatif analiz ve yüksek kaliteli görselleştirme için kullanılır.

- **Plaxis 3D Sonlu Elemanlar Yazılımı**

Bu program, geoteknik problemlerinin deformasyon analizlerinin gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş, sonlu elemanlar programıdır. Plaxis 3D Programı ile Temel sistemi analizleri, Stabilité analizleri, Derin kazı analizleri, Tünel sistemleri, Zemin iyileştirme analizleri, Zamana bağlı analizler, Kazı-dolgu analizleri vb. gibi geoteknik mühendisliğinde sıklıkla karşılaşılan birçok problemin analizinde kullanılmaktadır.

Büyük Bakım-Onarım

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde akademik ve idari birimlerimizin kullanmış oldukları binaların bakım onarımları yapılmıştır.

3.3. 2017H033080 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2017 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Toplam harcama 494.239,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017H033080 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar *Çizelge-21*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	500.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	500.000,00 TL
Eklenen	0,00 TL
Toplam Ödenek	500.000,00 TL
Harcama	494.239,98 TL
Kalan Ödenek	5.760,02 TL
Gerçekleşme Oranı %	98,85 %

Çizelge 20: 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi

2017 yılı içersinde Üniversitemiz kütüphanesi elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır. Bu aşamada 628 adet basılı, 631 adet elektronik yayın alımı, 7 elektronik veri tabanı ve 1 urkund intihal programı aboneliği gerçekleştirilmiştir.

2017H033080 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar Çizelge-22’de yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	HukukTürk Veri Tabanı Aboneliği	1.154,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	URKUND İntihali Önleme Programı Hizmeti Aboneliği	17.133,55
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Wiley Online Library Elektronik Dergi Veri Tabanı Aboneliği	107.577,33
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Worlde-Book Library Veri Tabanı	22.040,88
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	E-Marefa Veri Tabanı	24.263,06
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	JSTOR Veri Tabanı	3.062,78
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Ebrary Veri Tabanı	23.666,34
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	SOBİAD Veri Tabanı	6.500,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Cambridge E-Kitap Alımı	161.117,17
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Wiley E-Kitap Alımı	86.661,35
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Kitap Alımı	18.643,52
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Üniversitemiz Kurumsal Tanıtım Filmi	22.420,00
TOPLAM		494.239,98

Çizelge 21: 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **HukukTürk Veri Tabanı**

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisleri bünyesinde bulunduran bir veritabanıdır.

- **URKUND İntihali Önleme Programı Hizmeti**

URKUND İntihal Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca alınan "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler" kararının Tezler başlıklı maddesi 1. Fıkrası (Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.) gereğince abone olunarak Üniversitemiz Öğretim Elemanları, idari personel ve öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Program ile Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerinde hazırlanan tez, proje ve ödev vb. yayınların intihal (benzerlik) analizi yapılmaktadır.

- **Wiley Online Library Elektronik Dergi Veri Tabanı**

Wiley Online Library, 1997'den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. 363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır. Wiley makalelerine 6,678,048 atıf yapılmıştır, bu da JCRdeki atıfların %12'sinin Wiley makalelerinden geldiğini göstermektedir. Wiley makaleleri 34 alanda en çok paylaşılan makalelerdir. CA- A Cancer Journal for Clinicians dergisinin etki değeri 187.04'tür ve JCR'de etki değeri en yüksek dergidir. Bu dergi ANKOS dergi paketi içinde yer almaktadır. Wiley Online Library araştırma alanları: Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Dış Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji'dir.

- **World-Book Library Veri Tabanı**

World eBook Library Veri Tabanı, PDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkanı, her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap, eşsiz bir birincil kaynak ve nadir eser koleksiyonu, dünyanın en büyük elektronik kütüphanesi'dir.

1000 yılı kapsayan bir koleksiyon, 200'den fazla dilde kitap ve doküman, 16 milyon Ansiklopedi makalesi, 4.186.162 başlık, 3.000.000'dan fazla ekitap (pdf), 510.252 çeşitli doküman (pdf), 145.503 dergi (pdf), 11.158 gazete (pdf), 5791 sesli kitap (mp4), 5318 eğitim videosu, 15,126 ciltlenmemiş nota içermektedir.

Kapsadığı kilit konu başlıkları: Sosyoloji, Psikoloji, Filozofi, Ekonomi, Yönetim, Kamu, Tarih, Tarım, Tıp, Eğitim, Güzel Sanatlar, Dil, Hukuk, Edebiyat, Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji, Antropoloji, Teknoloji'dir.

- **E-Marefa Veri Tabanı**

E-Marefa Arap dünyasının en prestijli akademik yayıncıları tarafından hakemli dergilerde yayınlanan tam metin makalelere, istatistiklere, tezlere erişim imkanı sunmaktadır. Marefa, Ürdün'de "World Company for Digital Content" tarafından yönetilen bir Arap elektronik veritabanıdır. Bu şirket Arap dijital içeriği ve bilgi sağlamada uzmanlaşmıştır. İçeriğinde genel olarak 19 Arap ülkesindeki 300 kuruluşun yaklaşık 1750 akademik ve istatistikî tam metin dergi, 250.000 tam metin makale bulunmaktadır. Islamic Studies & Arabic Language Veritabanı İslam araştırmaları ve Arap edebiyatında uzmanlaşmış yüzlerce e-kitap ve bildiri, dergiler, tezler ve Arapça, İngilizce, Fransızca uluslararası tezlerin Arapça değerlendirmelerini sunar. Bu veri tabanında 107 tam metin dergi, 20.000 tam metin makale, 5.700 tam metin yüksek lisans ve doktora tezi ve tez özeti, 11.000 araştırma özeti, 3.000 e-kitap ve kitap yorumu, 500 konferans bildirisi, 600 Arapça uluslararası tez değerlendirmesi olmak üzere yaklaşık 47.000 doküman bulunmaktadır.

- **JSTOR Veri Tabanı**

JSTOR veri tabanı, sanat, mimarlık, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil bilimi, edebiyat, bölge çalışmaları, felsefe, sosyoloji, istatistik, matematik gibi çok çeşitli konu alanlarında uluslararası düzeyde yayınlanmış 3.904 adet hakemli dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Life Sciences, Business IV, Ecology and Botanic, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection(içerisinde 2.154 araştırma raporu da dahil)'a erişim sağlanmaktadır.

- **Ebrary Veri Tabanı**

Ebook Central 150.000'nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir

- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atfın bulunduğu bir veritabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir.

Sobiad; hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır. Ayrıca üniversitelerin işbirliği içerisinde olduğu diğer üniversiteler, öğretim üyelerinin

yayın yaptığı dergiler, birlikte yayın yaptığı akademisyenlerin bilgisi paylaşılmaktadır. Ayrıca kütüphane yetkilisi kullanım istatistiklerine istediği zaman ulaşabilmektedir.

Sobiad, Türkiye merkezli sosyal bilgiler dergilerini taramakla birlikte; birçok yabancı dergi SOBIAD’da taranmak için başvurusunu yapmış bulunmaktadır.

- **Cambridge E-Kitap Alımı**

Cambridge e-kitap koleksiyonu satın alınmıştır. Bu koleksiyon kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda alımı yapılan çeşitli konu başlıklarında 348 adet elektronik kitabı içermektedir.

- **Wiley E-Kitap Alımı**

Wiley e-kitap koleksiyonu satın alınmıştır. Bu koleksiyon kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda alımı yapılan çeşitli konu başlıklarında 283 adet elektronik kitabı içermektedir.

- **Basılı Kitap Alımı**

2017 yılı içerisinde 628 adet basılı kitap alımı gerçekleştirilmiştir.



Resim 14: Basılı Kitap

3.4. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2017 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup finansman fazlasından likit karşılığı 4.447.399,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 9.447.399,00 TL olup toplam harcama 1.248.679,71 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %13,22 olarak gerçekleşmiştir.

2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup 2009H031580 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar *Çizelge-23*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	52.250.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	5.000.000,00 TL
Eklenen *	4.447.399,00 TL
Toplam Ödenek	9.447.399,00 TL
Harcama	1.248.679,71 TL
Kalan Ödenek	8.198.719,29 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	13,22 %

Çizelge 22: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

*Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi ile İhata Duvarı Yapım İşi tamamlanmıştır.

Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi işi yüklenicinin taahhütlerini yerine getirememesinden dolayı iptal edilmiştir. İkmal için tekrar ihaleye çıkılacaktır.

2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar Çizelge-24’de yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi	84.597,95
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	501.257,83
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ İhata Duvarı Yapım İşi	662.823,93
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Güneş Enerji Sistemi (İkinci 500 KW)	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hobi Bahçesi	0,00
TOPLAM		1.248.679,71

Çizelge 23: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı



Resim 15: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamındaki Yapım İşleri

500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi

Karaman ilinin güneş enerjisi potansiyeli ve enerji verimliliğinin yüksek olması nedeniyle Üniversitemizin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması amacıyla proje hazırlanmış, 22/10/2013 tarihinde ihale edilmiş ve 02/04/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 04/06/2015 tarihinde yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleşme feshedilmiştir. 2015 yılında tekrar ihaleye çıkılarak Ekim ayında başka bir yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

10.000 m² kurulu alan üzerine inşa edilen Güneş Enerji Sistemi panelleri, yılda ortalama 754.511 kw saatlik enerji üreterek elektrik sarfiyatının %25'ini karşılayacak. 2.076.799,99 TL'ye tamamlanan proje, altı yıl içerisinde kendisini amorti ederek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Santralimiz geçici kabulü 06/01/2017 tarihinde yapılmış olup bu tarih itibariyle şebekeye enerji vermeye başlanmıştır. 20/07/2017 tarihinde kesin hakedişi yapılan işin 06/01/2018 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.

KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşine ait detaylar Çizelge-25'de yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	CRC Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.760.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	02.10.2015
Sözleşme Tarihi	27.10.2015
Yer Teslim Tarihi	27.10.2015
Fiilen İşe Başlama Tarihi	27.10.2015
İşin Bitim Tarihi	06.01.2017
2017 Yılı Harcama Tutarı	84.597,95
Toplam Harcama Tutarı	2.076.799,99
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 24: 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşİ



Resim 16: Güneş Enerji Sistemi

Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre yerleşke alanı içerisinde asfalt yol kenarları, ana giriş kapısı çevresini düzenlemek ve Sosyal Bilimler MYO çevresinin daha elverişli bir ortam haline dönüştürmek amaçlanmıştır.

Proje çalışmaları tamamlanmış olup 11/08/2016 tarihi itibari ile ihaleye çıkılmış, 01/09/2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

2017 yılında %76'sı tamamlanan işin yüklenicinin taahhütlerini yerine getirememesinden dolayı iptal edilmiştir. 2018 yılında ikmal ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşine ait detaylar *Çizelge-26*'da yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Serhat AYDIN
Sözleşmenin Konusu	Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.160.000,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	11.08.2016
Sözleşme Tarihi	01.09.2016
Yer Teslim Tarihi	05.09.2016
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.09.2016
İşin Bitim Tarihi	22.11.2017 tarihinde feshedildi.
2017 Yılı Harcama Tutarı	501.257,83 TL
Toplam Harcama Tutarı	802.151,82 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	73 %
İnşaatın Durumu	İkmal ihalesine çıkılacaktır.

Çizelge 25: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi



Resim 17: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi

KMÜ İhata Duvarı Yapım İşi

Yunus Emre Yerleşkesi alanını daha güvenli hale getirmek amacıyla yapımı devam eden ihata duvarı ve ferforje korkuluk işi için 31/03/2016 tarihinde ihaleye çıkılmış, 21/04/2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Belediyenin yerleşkemiz güneyinde bulunan yol genişletme çalışmaları uzadığı için meydana gelen kod farkından dolayı ancak 2017 yılında tamamlanabilmektedir.

KMÜ İhata Duvarı Yapım İşine ait detaylar *Çizelge-27*'de yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ramazan YILMAZ
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İhata Duvarı Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	1.647.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	13.132,56 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	31.03.2016
Sözleşme Tarihi	21.04.2016
Yer Teslim Tarihi	25.04.2016
Fiilen İşe Başlama Tarihi	25.04.2016
İşin Bitim Tarihi	15.06.2017
2017 Yılı Harcama Tutarı	662.823,93 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.888.168,65 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100 %
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 26: KMÜ İhata Duvarı Yapım İşİ



Resim 18: İhata Duvarı

Güneş Enerji Sistemi (İkinci 500 KW)

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üreterek Ring Sistemine Entegre edilmesi amaçlı 2. etap proje çalışmaları ve gerekli izinler alınarak 20.11.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup değerlendirme ve güvenlik soruşturmalarının ardından 2018 yılı içerisinde sözleşme imzalanacaktır.

Hobi Bahçesi

Üniversitemiz 2003-2017 Stratejik Planının dördüncü amacı "Karaman'ın ve Türkiye'nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak" olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Üniversitemizin gerek Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü gerekse Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümlerinde eğitim öğretim ve bilimsel nitelikte Ar-Ge (TÜBİTAK, SANTEZ, BAP vb.) çalışmalar yürütülmektedir.

Mülkiyeti hazineye ait olan ve Üniversitemize tahsis edilen tarım arazisi üzerine Maliye Bakanlığından alınan onay neticesinde Üniversitemizce stratejik planında yer alan söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için sadece personelimiz ve öğrencilerimize bedel karşılığı kiralanmak üzere gıda-tarım araştırma ve eğitim uygulama alanı ve sosyal amaçlı bir hobi bahçesi yapılması planlanmış fakat gerekli izinler 2017 yılında alınamamıştır. 2018 yılı içerisinde izinlerin alınarak yapımının tamamlanması planlanmaktadır.



Resim 19: Hobi Bahçesi Proje Fotoğrafi

3.5. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2017 yılı bütçemize ayrılan ödenek 12.400.000,00 TL olup 14.477.460,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, toplam ödenek 26.877.460,00 TL olmuştur. 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca detay programı yapılmış olan proje kapsamında harcama yapılmamıştır. 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ait detaylar *Çizelge-28*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Eğitim Fakültesi (8.000 m ²), Kazım Karabekir MYO (1.500 m ²), Sağlık Bilimleri Fakültesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	150.000.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	12.400.000,00 TL
Eklenen*	14.477.460,00 TL
Toplam Ödenek	26.877.460,00 TL
Harcama	0,00 TL
Kalan Ödenek	26.877.460,00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	0,00 %

Çizelge 27: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

*Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

2009H031590Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında herhangi bir harcama olmamıştır. Detaylar *Çizelge-29*'da yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Eğitim Fakültesi Binası Yapım İş (8.000 m ²)	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İş (1.500 m ²)	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sağlık Bilimleri Fakültesi	0,00
TOPLAM		0,00

Çizelge 28: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı

Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İş (1.500 m²)

Kazım Karabekir MYO öğrenci sayısının hızla artması ve okulun sosyal faaliyetlerinin fazla olması sebebiyle Kazım Karabekir Meslek Yüksekokuluna ilave 500 kişilik çok amaçlı salon yapılması ile öğrencilerin ve okulun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre ile okulun daha da bütünleştirilmesi planlanmıştır. İhale 28.09.2017 tarihinde yapılmış, 21.12.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanıp 26.12.2017 tarihinde de yer teslimi yapılarak ihale sonuçlandırılmıştır. Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İşine ait detaylar *Çizelge-30*'da yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Koçoğlu Mek. Tes. İnş. Çevre Tekn. San. ve Tic. Ltd. Şti
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İş
Proje Numarası	2009H031590
İhale Bedeli	2.947.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeyle İlgili Revizyonlar	0,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	28.09.2017
Sözleşme Tarihi	21.12.2017
Yer Teslim Tarihi	25.12.2017
Fiilen İşe Başlama Tarihi	25.12.2017
İşin Bitim Tarihi	09.12.2018
2017 Yılı Harcama Tutarı	0,00 TL
Toplam Harcama Tutarı	0,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	0,00 %
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

Çizelge 29: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İş

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversitemiz sağlık yüksekokulu olarak kullanılan binanın yetersiz gelmesi, öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için yeni hizmet binası yapılması ihtiyacı doğmuş olup 10.500 m² kapalı alanın yeterli olacağı planlanmıştır. Yapım işinin 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.

Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşi (8.000 m²)

Üniversitemiz tarafından yaptırılan, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında öğrenci alımına başlayan fakültemizin yeni hizmet binası ihtiyacı doğmuş olup 8.000 m² kapalı alanın yeterli olacağı planlanmıştır. İhalesi 10.11.2017 tarihinde yapılmış olup ihale sözleşmeye davet aşamasındadır.



Resim 20: Eğitim Fakültesi Binası Proje Fotoğrafl

3.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2017 yılı bütçemize ayrılan ödenek 4.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde 503.077,00 TL tutarında ödenek eklemesi yapılmış, eklemeler sonucunda 2017 yılı toplam ödeneği 4.503.077,00 TL olmuştur. Toplam harcama 1.071.664,19 TL'dir. 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ait detaylar *Çizelge-31*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Spor Salonu (500 Seyirci kapasitesi), Stadyum (5.000 seyirci kapasitesi)
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2017
Proje Tutarı	35.000.000,00 TL
Kesintili Başlangıç Ödeneği	4.000.000,00 TL
Eklenen	503.077,00 TL
Toplam Ödenek	4.503.077,00 TL
Harcama	1.071.664,19 TL
Kalan Ödenek	115.720,97 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	23,80 %

Çizelge 30: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2010H050170 Nolu Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar Çizelge-32’de yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin Üstünün Kapatılması	1.071.664,19
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Stadyum (Tribün)	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.000 Seyircili Tribün Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Futbol Sahası	0,00
TOPLAM		1.071.664,19

Çizelge 31: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamalarının Detayı

Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin Üstünün Kapatılması

Kazım Karabekir MYO açık spor tesislerinin üstünün, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden spor aktivitelerini yapabilmeleri amacıyla kapatılması planlanmıştır. 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde ihalesi yapılmış 21.06.2017 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. 07.12.2017 tarihinde bitirilerek hizmete açılmıştır.

Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin Üstünün Kapatılması işine ait detaylar Çizelge-33’de yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Mustafa SÜER (OKS Mimarlık)
Sözleşmenin Konusu	Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin Üstünün Kapatılması
Proje Numarası	2010H050170
İhale Bedeli	855.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	66.488,00 TL (KDV Hariç)
İhale Tarihi	11.05.2017
Sözleşme Tarihi	21.06.2017
Yer Teslim Tarihi	28.06.2017
Fiilen İşe Başlama Tarihi	28.06.2017
İşin Bitim Tarihi	05.10.2017
2017 Yılı Harcama Tutarı	1.071.664,19 TL
Toplam Harcama Tutarı	1.071.664,19 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 32: Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin Üstünün Kapatılması



Resim 21: Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesisleri – Üstü Kapatılmadan Önce



Resim 22: Kazım Karabekir Açık Spor Tesisleri – Üstü Kapatıldıktan Sonra

KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti ile Stadyum Yapım İşi

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü öğrencilerine daha iyi eğitim verilmesi ve Üniversitemizin üniversitelerarası spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla 5.000 kişilik stadyum yapılacaktır. Stadyumun öncelikle açık spor alanının yapımı planlanmış ve 2015 yılı içerisinde KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapım İşi olarak ihaleye çıkmıştır. 15/12/2016 tarihinde tamamlanan işin geçici kabulü yapılmış olup kesin hakedişinin 2018 yılı içerisinde yapılacağı öngörülmektedir.

5.000 kişilik üstü kapalı seyirci tribünü yapılmasıyla stadyum ihtiyacımız tamamlanacaktır. Stadyum yapım işi ihale aşamasındadır.

Üniversitemiz Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapım İşine ilişkin detaylar *Çizelge-34*'de yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ketu İnşaat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı
Proje Numarası	2010H050170
İhale Bedeli	3.895.000,00 TL (KDV Hariç)
Projeye İlgili Revizyonlar	0,00 TL
İhale Tarihi	08.09.2015
Sözleşme Tarihi	28.12.2015
Yer Teslim Tarihi	04.01.2016
Fiilen İşe Başlama Tarihi	04.01.2016
İşin Bitim Tarihi	15.12.2016
2017 Yılı Harcama Tutarı	0,00 TL
Toplam Harcama Tutarı	0,00 TL
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 33: KMÜ Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti Yapımı



Resim 23: Sentetik Yüzeyle Atletizm Pisti



Resim 24: 5.000 Kişilik Üstü Kapalı Seyirci Tribünü Proje Fotoğrafi

4. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe, Kamu Yatırım İzleme Sistemi ve kamuyat programları arasında düzenleme yapılmalıdır.
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.

5. 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti¹

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2017 Yılı Fiyatlarıyla (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		247.558		184.600	184.600		29.000	29.000		51.136	51.136		11.046	11.046
Sağlık															
D.KamuHizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6		247.558		184.600	184.600		29.000	29.000		51.136	51.136		11.046	11.046

Çizelge 34: 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

¹ Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

6. 2017 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu

2017 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sektör Adı : Eğitim

2017 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi (1.000)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
244552	490	2017H033060	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2017	Karaman	0	168	0	0	0	168					153
254331	490	2009H031580	Kampüs Altyapısı	Özel	2017	Karaman	0	52.250	41.512	0	0	9.447					1.249
267372	490	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2017	Karaman	0	150.000	116.499	0	0	26.878					0
247226	490	2017H033070	Muhtelif İşler	Özel	2017	Karaman	0	9.640	0	0	0	9.640					8.078
244561	490	2017H033080	Yayın Alımı	Özel	2017	Karaman	0	500	0	0	0	500					494
271279	490	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2017	Karaman	0	35.000	26.589	0	0	4.503					1.072
TOPLAM							0	247.558	184.600	0	0	51.136					11.046

Çizelge 35: 2017 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu
