



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Mustafa Kemal Atatürk

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....	I
1. Yönetici Özeti.....	VII
2. Genel Değerlendirme.....	9
2.1. UZGÖRÜŞÜMÜZ.....	9
2.2. ÖZGÖREVİMİZ.....	9
2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER.....	10
2.4. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	13
2.5. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	14
2.6. 2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	17
2.6.1. Hedeflenen.....	17
2.6.2. Gerçekleşen.....	17
2.6.3. Devam Edenler.....	18
2.7. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	19
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	19
2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	28
3. Proje Uygulamaları.....	29
3.1. 2018H033060 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (KOP).....	29
3.2. 2018H033070 MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KOP).....	30
3.3. 2017H033080 YAYIN ALIMI PROJESİ (KOP).....	31
3.4. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ (KOP).....	36
3.5. 2009H031590 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (KOP).....	44
3.6. 2010H050170 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ (KOP).....	51
4. Öneriler.....	55

ÇİZELGELER TABLOSU

Çizelge 1: Stratejik eksenler ve amaçlar.....	10
Çizelge 2: 1. Stratejik amaç ve hedefler	10
Çizelge 3: 2. Stratejik amaç ve hedefler	11
Çizelge 4: 3. Stratejik amaç ve hedefler	11
Çizelge 5: 4. Stratejik amaç ve hedefler	12
Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları.....	13
Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m ²).....	14
Çizelge 8: Kapalı Mekânların Dağılımı.....	15
Çizelge 9: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²).....	16
Çizelge 10: Sermaye giderlerinin ekonomik kod ve dağılımı	19
Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey).....	20
Çizelge 12: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	21
Çizelge 13: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	22
Çizelge 14: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....	23
Çizelge 15: Geyrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	24
Çizelge 16: Revizyon (2017H033070 Nolu Muhtelif İşler (KOP))	25
Çizelge 17: Revizyon (2017H033080 Nolu Yayın Alımı).....	25
Çizelge 18: Revizyon (2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı (KOP))	26
Çizelge 19: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)).....	26
Çizelge 20: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)).....	27
Çizelge 21: 2018H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	29
Çizelge 22: 2018H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) Harcamalarının Detayı ...	29
Çizelge 23: 2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP)	30
Çizelge 24: 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	31
Çizelge 25: 2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı	32
Çizelge 26: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi (KOP)	36
Çizelge 27: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı.....	37

Çizelge 28: 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi.....	38
Çizelge 29: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	39
Çizelge 30: 2018 Yılı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	40
Çizelge 31: 539kWe Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi	41
Çizelge 32: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	44
Çizelge 33: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı.....	44
Çizelge 34: Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşi	45
Çizelge 35: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İşi.....	47
Çizelge 36: Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapım İşi.....	49
Çizelge 37: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP).....	51
Çizelge 38: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı.....	51

KISALTMALAR

BESYO	: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
EBYS	: Elektronik Belge Yönetim Sistemi
KMÜ	: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
MYO	: Meslek Yüksekokulu

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Köklü geçmişe ve medeniyete sahip Türkçemizin başkenti Karaman'ın güzide eğitim kurumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde rektör olarak atanarak 26 Ocak 2017 tarihinde bu kutlu görevi devraldım.

Üniversitemizi şehir ve bölge boyutundan daha ileri noktalara taşımak, Ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma getirerek uluslararası bir üniversite hüviyetine kavuşturmak, erdemli ve kalifiye insanlar yetiştirecek her türlü sosyal, bilimsel ve teknolojik alt yapıyı

hazırlamak, mensuplarımızla birlikte hem milletimizin ufku hem de insanlığa yeni bir soluk getirmek en büyük temennimizdir.

Bütün paydaşlarımızla bölgesel kalkınma öz görevini ve farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle şehir-üniversite bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

Üniversitemiz, bölgesel kalkınmayla birlikte ulusal ölçekte gelişime ve kalkınmaya katkıda bulunmak gayret ve çabası içerisinde. Buradan hareketle, bölgemizin avantajlarından da yararlanarak gıda-tarım, temiz enerji ve Türk Dili alanlarını farklılaşma stratejisi olarak belirlemiş ve 2019-2023 Stratejik Planını bu yönde oluşturmuştur. Farklılaşma alanlarından biri olan temiz enerji yolunda önemli adımlardan biri olarak Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içinde güneş enerjisinden elektrik üreterek ring sistemine entegre edilmesi amaçlı 539kWe Güneş Enerjisi Santrali yapım işi tamamlanarak 21 Eylül 2018 enerji üretimine başlanılmıştır. Bununla birlikte yine enerji alanında KMÜ Enerji Verimliliği Merkezi ve Atölye binasının zemin etüdü için hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

Yine 2018 yılı yatırım bütçemizde yer alan ödeneklerden, eğitim öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikaların öncelendiği görülmektedir. Buna yönelik olarak gerekli olan derslik, makine-teçhizat, taşıt, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları alanlarında ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha düzenli ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

Yapılmakta olan Eğitim Fakültesi Binası ile eğitim öğretim faaliyetlerinde kaliteyi artırmak; Sağlık Bilimleri (Morfoloji) Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile de sağlık alanında fark yaratacak fakültelerin eğitim öğretime geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” muzu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Uzgörüřümüz

İnsanlıęa ve doęaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî deęerleri önceleyen nesiller yetiřtiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliřtirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.

2.2. Özgörevimiz

Üniversitemiz arařtırmayı, öęrenmeyi, paylařmayı esas alan köklerine baęlı ve evrensel deęerlerle donatılmıř görev ve sorumluluęunun bilincinde erdemli bir neslin yetiřtirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiřtir.

2.3. Temel Amaç ve Hedefler

EKSENLER	AMAÇLAR
EĞİTİM EKSENİ	Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ	Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
FARKLILAŞMA EKSENİ	Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
KURUMSALLAŞMA EKSENİ	Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Çizelge 1: Stratejik eksenler ve amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.
	Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.
	Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.
	Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Çizelge 2: 1. Stratejik amaç ve hedefler

AMAÇ 2	HEDEFLER
<p>Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.</p>	<p>Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.</p>
	<p>Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.</p>
	<p>Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.</p>

Çizelge 3: 2. Stratejik amaç ve hedefler

AMAÇ 3	HEDEFLER
<p>Türk dili, gıda, tarım ve temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.</p>	<p>Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.</p>
	<p>Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.</p>
	<p>Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.</p>
	<p>Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.</p>
	<p>TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.</p>

Çizelge 4: 3. Stratejik amaç ve hedefler

AMAÇ 4	HEDEFLER
Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.
	Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.
	Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.
	Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.
Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.	

Çizelge 5: 4. Stratejik amaç ve hedefler

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2018 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 30.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen 45.231.879,00,00 TL ile birlikte yıl sonu ödenek toplamı 75.231.879,00 TL olmuştur. Projelerin sektöre göre harcama detayları *Çizelge-6*'da yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2018 Yılı Program Ödeneği	2018 Yılı Revizeli Ödenek	2018 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	31.931.000,00	20.517.000,00	10.000.000,00	37.477.460,00	21.893.896,68
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı (KOP)	57.512.000,00	46.512.000,00	7.000.000,00	15.240.121,00	7.472.628,83
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	17.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	8.431.413,00	30.821,33
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.150,70
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler (KOP)	13.474.885,00	0,00	7.400.000,00	13.474.885,00	10.968.805,80
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı (KOP)	508.000,00	0,00	500.000,00	508.000,00	502.735,98
TOPLAM		120.525.885,00	71.029.000,00	30.000.000,00	75.231.879,00	40.874.039,32


Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taşınmaz varlığı *Çizelge-7*'de yer almakta olup dağılımı *Grafik-1*'de gösterilmiştir. Taşınmazların % 94'ü Yunus Emre Yerleşkesi, % 3'ü Ermenek MYO ve yine % 3'ü Kazım Karabekir MYO'da yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	1.652.648,35	-	1.661.715,35
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazım Karabekir Yerleşkesi	36.322,00	24.102,00	-	60.424,00
Genel Toplam	100.176,11	1.676.750,35	-	1.776.926,46

Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m2)

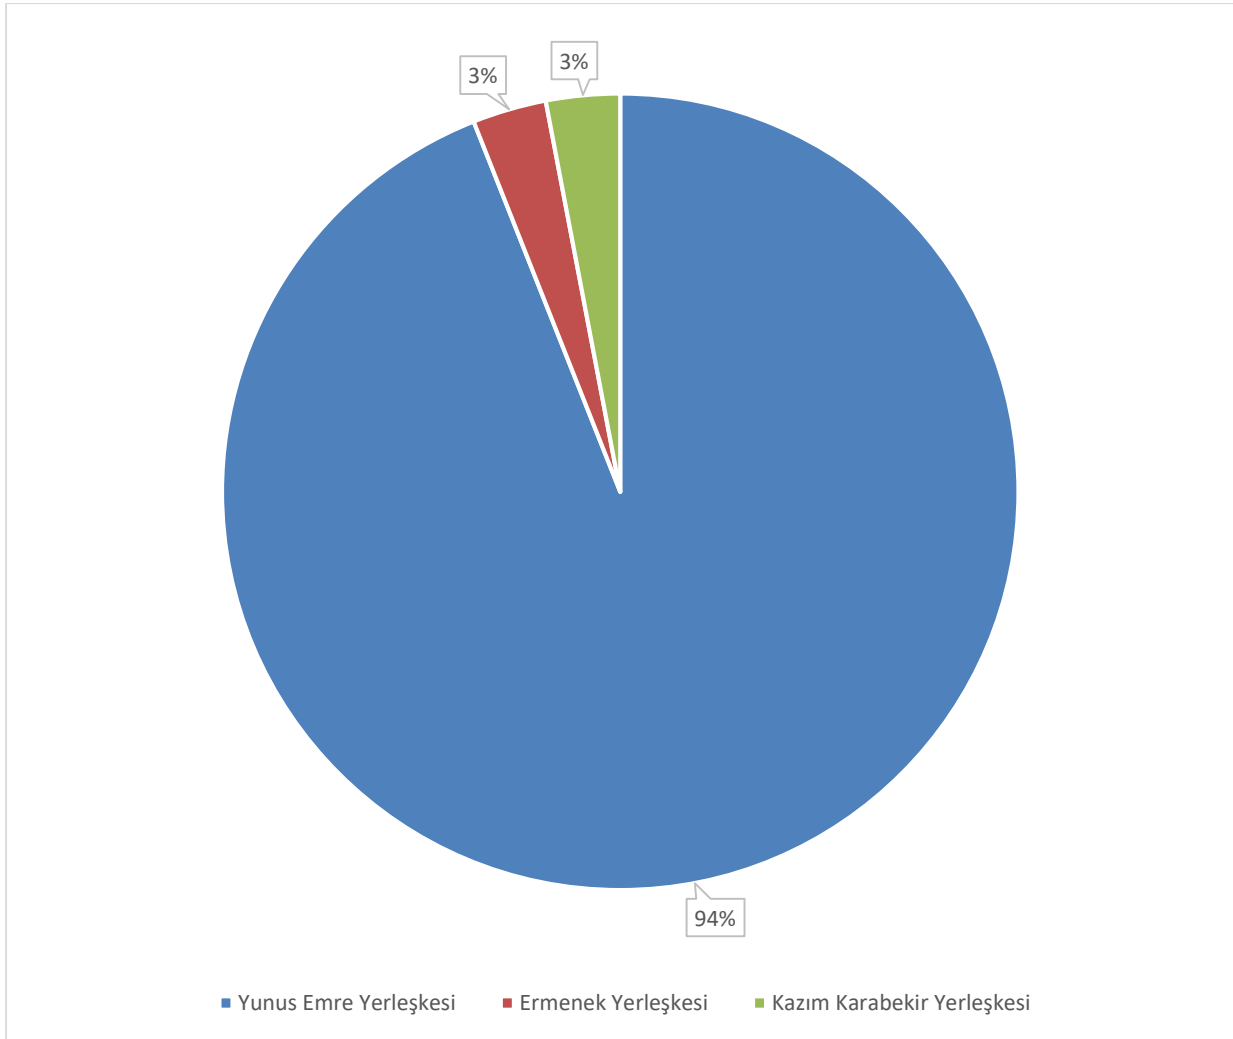


Grafik 1: Taşınmazların yerleşke itibariyle dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânların hizmet alan bilgileri *Çizelge-8*'de yer almakta olup dağılımı *Grafik-2*'de gösterilmiştir. Kapalı hizmet alanlarının % 76'sını eğitim alanları, % 8'ini spor alanları, % 9'unu sosyal alanlar, % 5'ini idari alanlar, % 1'ini barınma alanları ve % 1'ini diğer alanlar oluşturmaktadır.

Hizmet Alanı	Yerleşke Adı			Toplam (m ²)
	Yunus Emre	Kazım Karabekir	Ermenek	
İdari	8.175	-	-	8.175
Eğitim	107.800	7.000	5.830	120.630
Sosyal	13.533	-	-	13.533
Spor	12.582	-	150	12.732
Barınma	1.480	-	-	1.480
Diğer	1.755	-	-	1.755
Genel Toplam	145.325	7.000	5.980	158.305

Çizelge 8: Kapalı Mekânların Dağılımı

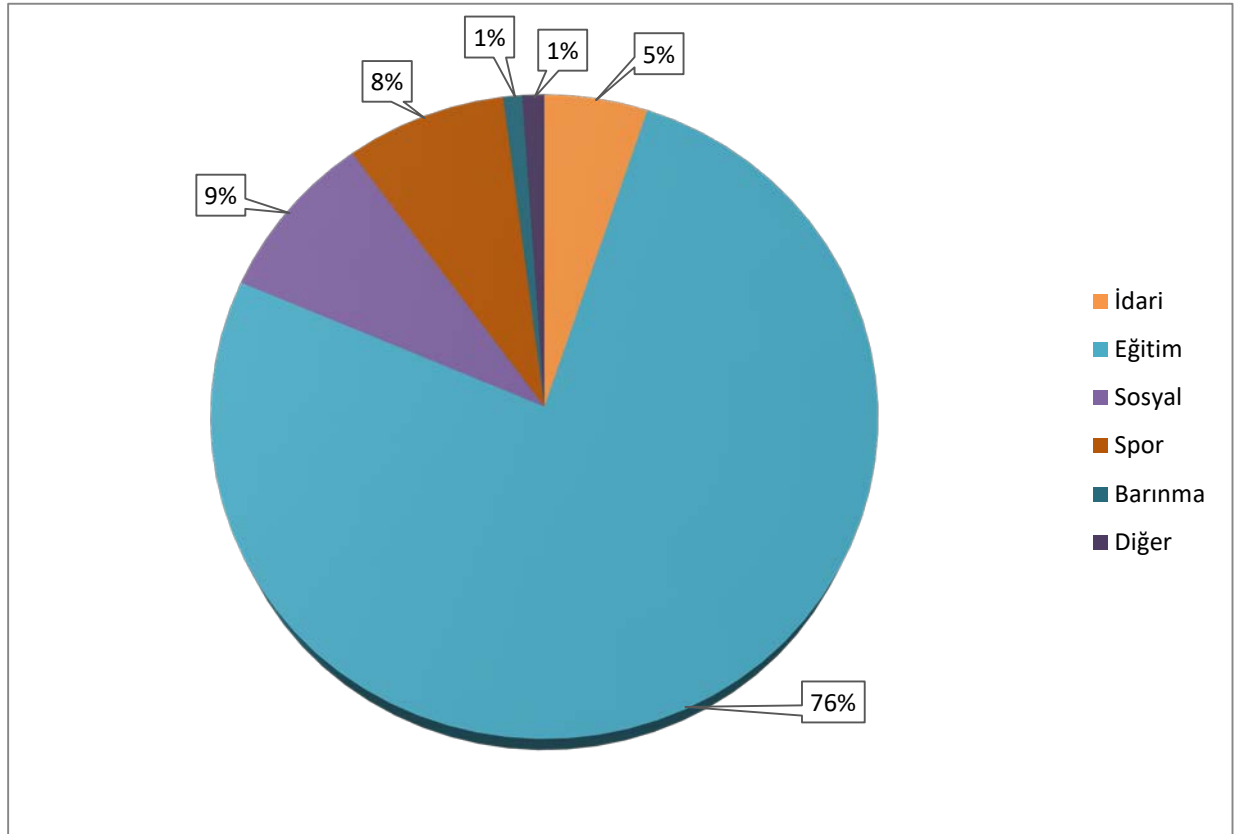

Grafik 2: Taşınmazların hizmet alanları itibariyle dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı *Çizelge-4*'de yer almaktadır.

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Barınma	Diğer
1.500 Kişilik Kapalı Spor Sal.			7.500			
Amfi Tiyatro				533		
BESYO Binası		9.270				
Bilgi İşlem Binası	3.175					
Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu		17.420				
Ermenek MYO		4.325				
Ermenek MYO Atölye		1.505				
Ermenek Spor Salonu			150			
Halicılık - Seramik Atölyesi		3.798				
Isı Merkezi						1.755
İİBF		13.000				
İslami İlimler Fakültesi		8.350				
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635				
Kazım Karabekir MYO		7.000				
Kütüphane Binası		10.500				
Makine - Otomotiv atölyesi		3.367				
BİLTEM		3.170				
Misafirhane					1.130	
Mühendislik Fakültesi		20.435				
Rektörlük Hizmet Binası	5.000					
Rektörlük Konutu					350	
Sağlık HMYO		3.615				
Sağlık Bilimleri Fakültesi		3.600				
Sosyal Bilimler MYO / Uygulamalı Bilimler Fak.		6.640				
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu			5.082			
Yemekhane-Kafeterya-Çarşı				13.000		
TOPLAM	8.175	120.630	12.732	13.533	1.480	1.755
TOPLAM				158.305		

Çizelge 9: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

2.6. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.6.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2018 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, taşıt, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüd projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2018 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2018 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ✓ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çevresinin çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.
- ✓ 2018 Yılı Çevre Düzenlemesi Yunus Emre Yerleşkesinde yer alan kütüphane binası, Doğu Kışla giriş kapısı ile cami arasında kalan alanda çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışması yapılmıştır.
- ✓ 2. Etap 539kWe Güneş Enerjisi Santrali yapımı tamamlanmıştır.
- ✓ İhata Duvarı yapım işi tamamlanmıştır.
- ✓ KMÜ Enerji Verimliliği Merkezi ve Atölye Binasının zemin etüdü için hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyacımız doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.
- ✓ 2018 yılı içerisinde elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır.

2.6.3. Devam Edenler

✓ Yunus Emre Yerleşkesi 2. etap çalışmaları kapsamında yapımı devam eden Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri (Morfoloji) Fakültesi ve yapımına başlanılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi Binası ulaşımlarını sağlayabilmek için asfalt yol ve çevre düzenlemesi ihale çalışmaları yapılmış olup süreç devam etmektedir.

✓ Eğitim Fakültesi binası, Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salonu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binası için yer teslimi yapılmış olup bina inşaatı devam etmektedir.

✓ Ermenek MYO Uygulama Oteli proje çalışmaları devam etmekte olup 2019 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.


2.7. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 30.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 75.231.879,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 40.874.039,32 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu toplam ödeneğine oranı % 54,33'tür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde *Çizelge-10*'da yer almakta olup dağılımı *Grafik-3*'de gösterilmiştir.

Eko. Kod	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcamanın Toplam Ödeneğe Oranı
6.1	5.300.000,00	5.858.000,00	11.158.000,00	10.639.190,09	95,35%
6.3	100.000,00	27.000,00	127.000,00	123.944,60	97,59%
6.5	22.100.000,00	39.346.879,00	61.446.879,00	29.600.381,63	48,17%
6.7	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	510.523,00	20,42%

Çizelge 10: Sermaye giderlerinin ekonomik kod ve dağılımı

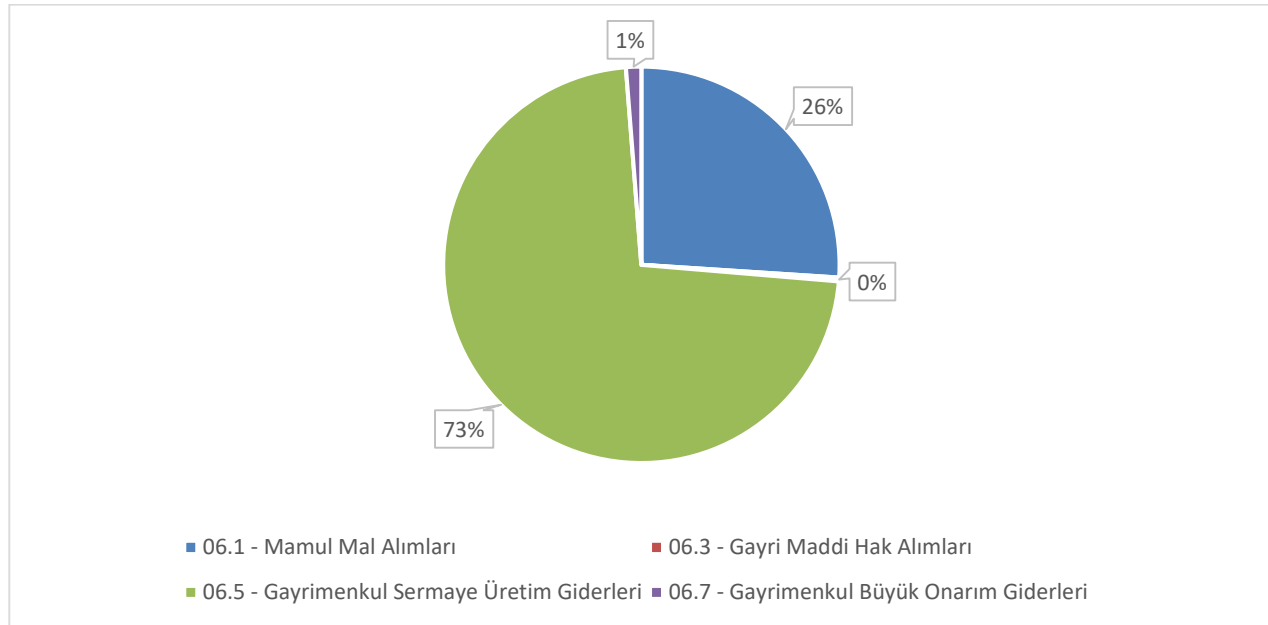

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Sermaye giderleri gerçekleştirmelerinin % 26'sını mamul mal alımları, % 0,3'ünü gayri maddi hak alımları, % 72,42'sini gayrimenkul sermaye üretim giderleri, % 1,25'ini gayrimenkul üretim giderleri oluşturmaktadır.

Yılı bütçesi ile verilen sermaye giderlerine ilişkin 2018 yılı yatırım harcamalarının ekonomik detay dağılımı aşağıdaki *Çizelge-11*'de yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	253.275,34
6	1	1	2	İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri)	50.269,42
6	1	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	159.260,30
6	1	1	4	Hastane Mefruşatı Alımları	9.055,31
6	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	26.841,58
6	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	498.701,95
6	1	2	1	Büro Makineleri Alımları	206.863,59
6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	2.794.963,11
6	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	5.501.227,60
6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.655,00
6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.107.217,26
6	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	9.612.926,56
6	1	3	2	Atölye Gereçleri Alımları Alımları	9.517,40
6	1	3	5	Zirai Gereç Alımları	14.912,90
6	1	3	90	Diğer Avadanlık Alımları	395,30
6	1	3		Avadanlık Alımları	24.825,60
6	1	6	1	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	102.884,24
6	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	399.851,74
6	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	502.735,98
6	1			Mamul Mal Alımları	10.639.190,09
6	3	1	1	Bilgisayar Yazılı Alımları	123.944,60
6	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	123.944,60
6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	123.944,60
6	5	1	90	Diğer Giderler	5.150,70
6	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.150,70
6	5	7	1	Hizmet Binası	19.762.315,35
6	5	7	4	Sosyal Tesisler	2.150.035,72
6	5	7	90	Diğerleri	7.682.879,86
6	5	7		Müteahhitlik Giderleri	29.595.230,93
6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.600.381,63
6	7	1	90	Diğer Giderler	325.587,96
6	7	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	325.587,96
6	7	7	90	Diğerleri	184.935,04
6	7	7		Müteahhitlik Giderleri	184.935,04
6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	510.523,00
6				Sermaye Giderleri	40.874.039,32

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

06.1 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 5.300.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 5.858.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 11.158.000,00 TL olmuştur. 2018H033070 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 10.136.454,11 TL, 2018H033080 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 502.735,98 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 10.639.190,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 95,35'tir. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına Çizelge-12'de yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.1.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	253.275,34	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1.2	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri)	50.269,42	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1.3	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	159.260,30	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1.4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hastane Mefruşatı Alımları	9.055,31	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	26.841,58	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			498.701,95	
06.1.2.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	206.863,59	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.2	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	2.794.963,11	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	5.501.227,60	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.5	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	2.655,00	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	1.107.217,26	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları			9.612.926,56	
06.1.3.2	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Atölye Gereçleri Alımları	9.517,40	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.3.5	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Zirai Gereç Alımları	14.912,90	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.3.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Avadanlık Alımları	395,30	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.4	Avadanlık Alımları			24.825,60	
06.1.6.1	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	102.884,24	2018H033080	Yayın Alımı (KOP)
06.1.6.3	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	399.851,74	2018H033080	Yayın Alımı (KOP)
06.1.6	Yayın Alımları ve Yapımları			502.735,98	
06.1	Mamul Mal Alımları			10.639.190,09	

Çizelge 12: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 27.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 127.000,00 TL olmuştur. 2018H033070 nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP) kapsamında 123.944,60 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 97,59'dur. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına *Çizelge-13*'te yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.3.1.1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	123.944,60	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.3.1	Bilgisayar Yazılımı Alımları				123.944,60
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları				123.944,60

Çizelge 13: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 22.100.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde finansman fazlasından 39.346.879,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 61.446.879,00 TL olmuştur. 2018H034890 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP), 2009H031580 nolu Kampüs Altyapısı Projesi (KOP), 2009H031590 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) ile 2010H050170 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP) kapsamında 29.600.381,63 TL harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 48,17'dir. 06.5 Gayrimenkul sermaye üretim giderlerini ilişkin harcama detayına *Çizelge-14'* de yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.5.1.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	5.150,70	2018H034890	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
06.5.1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler				5.150,70
06.5.7.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	19.762.315,35	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
06.5.7.04	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Tesisler	2.131.581,33	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
06.5.7.04	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Tesisler	18.454,39	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	7.472.628,83	2009H031580	Kampüs Altyapısı (KOP)
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	12.366,94	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	197.884,09	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.5.7	Müteahhitlik Giderleri				29.595.230,93
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				29.600.381,63

Çizelge 14: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 2018H033070 nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP) kapsamında 510.523,00 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 20,42'dir. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına *Çizelge-15*'te yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.7.1.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	325.587,96	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.7.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	184.935,04	2018H033070	Muhtelif İşler (KOP)
06.7.7	Müteahhitlik Giderleri				510.523,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				510.523,00

Çizelge 15: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

2.7.2 Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2018 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-16* ile 20'de yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'de gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2018H033070
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2018-2018
2018 Yılı Proje Tutarı TL	7.400.000,00
2017 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2018 Yılı Yatırımı TL	7.400.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ¹	6.074.885,00
2018 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	13.474.885,00
2018 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	13.474.885,00

Çizelge 16: Revizyon (2017H033070 Nolu Muhtelif İşler (KOP))

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2018H033080
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2018-2018
2018 Yılı Proje Tutarı TL	500.000,00
2017 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2018 Yılı Yatırımı TL	500.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ²	8.000,00
2018 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	508.000,00
2018 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	508.000,00

Çizelge 17: Revizyon (2017H033080 Nolu Yayın Alımı)

¹ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

² Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2020
2018 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	57.512.000,00
2017 Yılı Kümülatif Harcama TL	46.512.000,00
2018 Yılı Yatırımı TL	7.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ³	8.240.121,00
2018 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	57.512.000,00
2018 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	15.240.121,00

Çizelge 18: Revizyon (2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı (KOP))

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2019
2018 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL ⁴	31.931.000,00
2017 Yılı Kümülatif Harcama TL ⁵	20.517.000,00
2018 Yılı Yatırımı TL	10.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ⁶	27.477.460,00
2018 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	31.931.000,00
2017 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	37.477.460,00

Çizelge 19: Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler (KOP))

³ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.


⁴ 2017 yılında 138.000.000,00 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) tutarı 2018 yılında 31.931.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

⁵ 2017 yılında 116.499.000,00 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) kümülatif harcama tutarı 2017 yılında 20.517.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

⁶ 22.477.460,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle, 5.000.000,00 TL Maliye Bakanlığı tarafından Ermenek MYO Uygulama Oteli için aktarılan ödenekten karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2020
2018 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL ⁷	17.000.000,00
2017 Yılı Kümülatif Harcama TL	4.000.000,00
2018 Yılı Yatırımı TL	5.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ⁸	3.431.413,00
2018 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	17.000.000,00
2018 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	8.431.413,00

Çizelge 20: Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP))

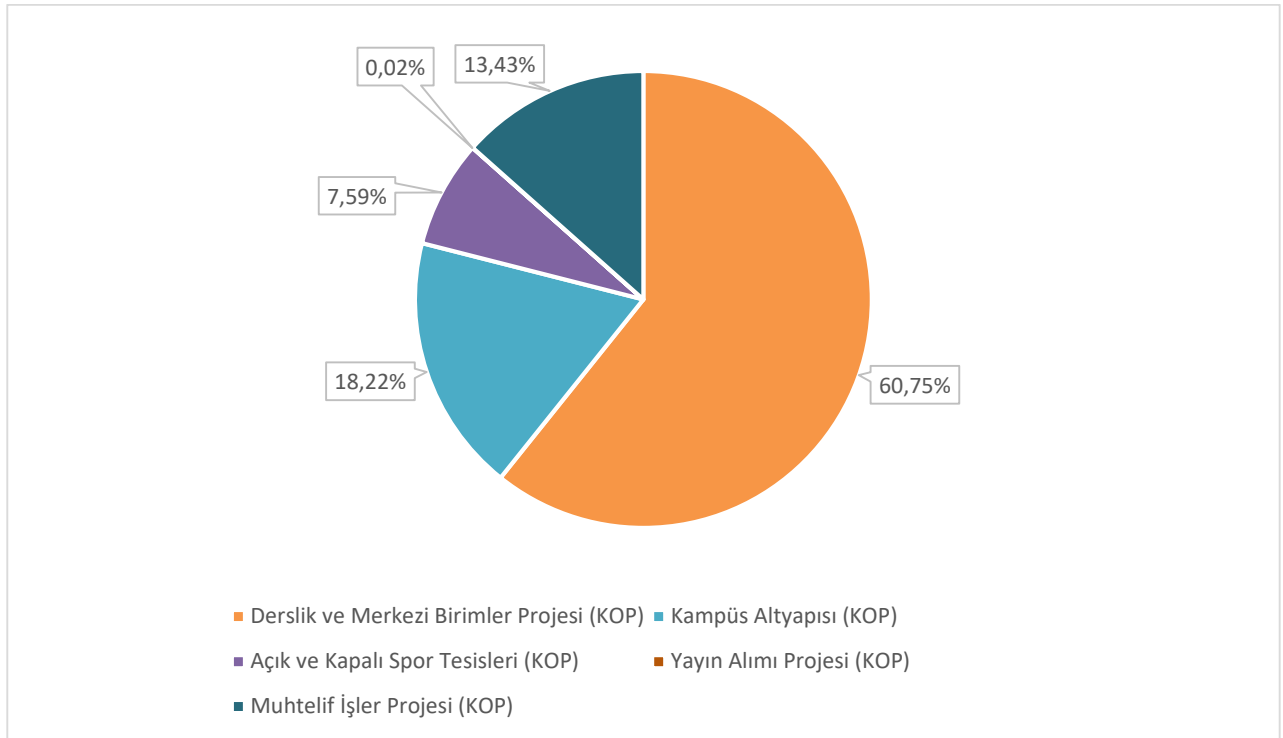

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı

⁷ 2017 yılında 35.000.000,00 TL olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP) tutarı 2018 yılında 17.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

⁸ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

2.7.3 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. sebebiyle daha uzun sürmektedir.

2018 yılının özellikle 3. çeyreğinde döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle girdi fiyatlarındaki artış yaklaşık maliyetleri de beraberinde yükseltmiştir. Bu durum planlanan yatırımların zamanında yapılamamasına veya sonuçlandırılmamasına neden olmuştur.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2018H033060 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) için 2018 yılı bütçemize 100.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Toplam harcama ise 5.150,70 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018H033060 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine (KOP) ait detaylar *Çizelge-21*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı TL	100.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	100.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	100.000,00
Harcama TL	5.150,70
Kalan Ödenek TL	94.849,30
Gerçekleşme Oranı %	5,15

Çizelge 21: 2018H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)

Üniversitemiz tarafından 2018 yılında KMÜ Enerji Verimliliği Merkezi ve Atölye Binasının zemin etüdü için hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

2018H033060 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar *Çizelge-22*'de yer almaktadır.

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Enerji Verimliliği Merkezi ve Atölye Binası Zemin Etüdü Yapılması	5.150,70
TOPLAM		5.150,70

Çizelge 22: 2018H033060 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) Harcamalarının Detayı

3.2. 2018H033070 Muhtelif İşler Projesi (KOP)

Muhtelif İşler Projesi (KOP) için 2018 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 7.400.000,00 TL olup likit karşılığı 6.074.885,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 13.474.885,00 TL, toplam harcama ise 10.968.805,80 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, 2018H033070 nolu Muhtelif İşler Projesine (KOP) ait harcamaların detayı *Çizelge-23*'te yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı TL	13.474.885,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	7.400.000,00
Eklenen TL ⁹	6.074.885,00
Toplam Ödenek TL	13.474.885,00
Harcama TL	10.968.805,80
Kalan Ödenek TL	2.506.079,20
Gerçekleşme Oranı %	81,12

Çizelge 23: 2018H033070 Nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP)

⁹ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

3.3. 2017H033080 Yayın Alımı Projesi (KOP)

Yayın Alımı Projesi (KOP) için 2018 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup yıl içinde 8.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 508.000,00 TL, toplam harcama ise 502.735,98 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,96 olarak gerçekleşmiştir.

2018H033080 nolu Yayın Alımı Projesine (KOP) ait detaylar *Çizelge-25*'te yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2018
Proje Bitiş Yılı	2018
Proje Tutarı TL	500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	500.000,00
Eklenen TL ¹⁰	8.000,00
Toplam Ödenek TL	508.000,00
Harcama TL	502.735,98
Kalan Ödenek TL	5.264,02
Gerçekleşme Oranı %	99,96

Çizelge 24: 2017H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi

2018 yılı içerisinde Üniversitemiz kütüphanesi elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar yapılmıştır. Bu aşamada 5.001 adet yerli ve yabancı kitap ile 2.055 adet e-kitap satın alınarak kullanıcı hizmetine sunulmuştur. Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan 1.874 adet kitap bağış olarak temin edilmiştir. 57 adet süreli yayın aboneliği yapılmış ve güncel süreli yayınlar salonunda kullanıcı hizmetine sunulmuştur.

¹⁰ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

2018H033080 nolu Yayın Alımı Projesi (KOP) kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar *Çizelge-25*'da yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	HukukTürk Veri Tabanı Aboneliği	1.246,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Türkiye Atıf Dizini Online Veritabanı	8.968,80
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Oxford Journal Online Veritabanı	24.681,48
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	E-Marefa Veri Tabanı	28.668,22
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	İdeal Online Süreli Yayın Veritabanı	12.000,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	EndNote Veri Tabanı (Yazılım Programı)	46.031,75
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Ebrary Veri Tabanı	43.690,75
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) Veri Tabanı	7.150,00
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	World-EBook Library Veri Tabanı	29.404,73
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Cambridge Journal Online Veritabanı	21.968,57
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Hiper Kitap Veritabanı	45.530,74
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	American Chemical Society (ACS) Veritabanı	45.026,65
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Rosetta Stone Online Dil Eğitim Aracı	36.629,71
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Springer E-Kitap Alımı	48.854,34
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Kitap Alımı	102.884,24
TOPLAM		502.735,98

Çizelge 25: 2018H033080 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **HukukTürk Veri Tabanı**

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisleri bünyesinde bulunduran bir veritabanıdır.

- **Türkiye Atıf Dizini Online Veritabanı**

Atıf Dizini, Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında 2008’den günümüze yayımlanan 410 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlayan, aynı zamanda tüm bu makalelere tam metin erişilebilen tek ulusal atıf tarama dizinidir. Türkiye Atıf Dizini’ne kayıtlı tüm dergilerin makaleleri, sağlık bilimleri alanında (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri branşları) yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir. Kayıtlı tüm dergiler, Türkiye’de en az iki sayı düzenli olarak yayımlanan hakemli (danışman değerlendirme sistemi olan) dergilerdir.

- **Oxford Journal Online Veritabanı**

Oxford Journals elektronik dergi veritabanı ekonomi, işletme, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler alanında 336 adet tam metinli (full text) dergiyi içermektedir.

- **E-Marefa Veri Tabanı**

E-Marefa Arap dünyasının en prestijli akademik yayıncıları tarafından hakemli dergilerde yayınlanan tam metin makalelere, istatistiklere, tezlere erişim imkanı sunmaktadır. Marefa, Ürdün’de "World Company for Digital Content" tarafından yönetilen bir Arap elektronik veritabanıdır.

İçeriğinde genel olarak 19 Arap ülkesindeki 300 kuruluşun yaklaşık 1750 akademik ve istatistiki tam metin dergi, 250.000 tam metin makale bulunmaktadır.

- **İdeal Online Süreli Yayın Veritabanı**

İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır. İdeal online içerisinde akademik dergiler, popüler dergiler, ideal tıp kitapları, konferans & armağanlar ve ideal ekitap olmak üzere 5 ayrı veri tabanı vardır.

İdealonline veri tabanlarının amacı; Türkçe bilgi kaynaklarını e-ortama taşımak, Türkçe bilgi kaynaklarına 7/24 erişim sağlamak, Türkçe içeriğe modern veri tabanı sistemi ve cihazlarla erişim sağlamak, Türkçe içeriği dünyanın kullanımına sunmak ve daha fazla Türkçe kaynak yayınlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

- **EndNote Veri Tabanı**

EndNote yazılımı, tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinde sizlere yardımcı olabilecek referans yönetim aracıdır.

- **Ebrary Veri Tabanı**

Ebook Central 150.000'nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.

- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir.

Sobiad; hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır. Ayrıca üniversitelerin işbirliği içerisinde olduğu diğer üniversiteler, öğretim üyelerinin yayın yaptığı dergiler, birlikte yayın yaptığı akademisyenlerin bilgisi paylaşılmaktadır. Ayrıca kütüphane yetkilisi kullanım istatistiklerine istediği zaman ulaşabilmektedir.

Sobiad, Türkiye merkezli sosyal bilgiler dergilerini taramakla birlikte; birçok yabancı dergi SOBİAD'da taranmak için başvurusunu yapmış bulunmaktadır.

- **World-Book Library Veri Tabanı**

World eBook Library Veri Tabanı, PDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkanı, her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap, eşsiz bir birincil kaynak ve nadir eser koleksiyonu, dünyanın en büyük elektronik kütüphanesi'dir.

1000 yılı kapsayan bir koleksiyon, 200'den fazla dilde kitap ve doküman, 16 milyon Ansiklopedi makalesi, 4.186.162 başlık, 3.000.000'dan fazla ekitap (pdf), 510.252 çeşitli doküman (pdf), 145.503 dergi (pdf), 11.158 gazete (pdf), 5791 sesli kitap (mp4), 5318 eğitim videosu, 15,126 ciltlenmemiş nota içermektedir.

Kapsadığı kilit konu başlıkları: Sosyoloji, Psikoloji, Filozofi, Ekonomi, Yönetim, Kamu, Tarih, Tarım, Tıp, Eğitim, Güzel Sanatlar, Dil, Hukuk, Edebiyat, Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji, Antropoloji, Teknoloji'dir.

- **Cambridge E-Kitap Alımı**

Cambridge e-kitap koleksiyonu satın alınmıştır. Bu koleksiyon kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda alımı yapılan çeşitli konu başlıklarında 348 adet elektronik kitabı içermektedir.

- **Hiper Kitap Veritabanı**

Hukuk'tan sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata, mimarlıktan mühendislik, bilgisayar, tasarım, teknik bilimlere 28 temel konu başlığında 17.000'den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlayan Türkçe içerikli bir elektronik kitap veritabanıdır. Türkiye'nin ilk ve tek Türkçe içerikli online kütüphanesidir.

- **American Chemical Society (ACS) Veri Tabanı**

American Chemical Society; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi vb. konuları kapsayan 50'den fazla dergiye ilk sayılarından günümüze erişim vermektedir.

- **Rosetta Stone Online Dil Eğitim Aracı**

Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracı Rosetta Stone, başarısı kanıtli Dynamic Immersion yöntemi ile 22,000'den fazla okula, 12,000'in üzerinde kuruma 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Ödül kazanmış etkileşimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir ve artık her yerden ve her zaman erişim imkanı sunmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilir. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilir.

- **Springer E-Kitap Alımı**

Springer e-Kitap koleksiyonu mühendislik ve bilgisayar bilimler alanlarındaki 2.000'in üzerinde kitap ile kütüphane koleksiyonunda yer almıştır.



Resim 1: Kütüphane

3.4. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Projesi (KOP)

Kampüs Altyapısı Projesi (KOP) için 2018 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 7.000.000,00 TL olup finansman fazlasından likit karşılığı 8.240.121,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 15.240.121,00 TL olup toplam harcama 7.472.628,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 49,03 olarak gerçekleşmiştir.

2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup 2009H031580 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar *Çizelge-26*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	57.512.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	7.000.000,00
Eklenen TL ¹¹	8.240.121,00
Toplam Ödenek TL	15.240.121,00
Harcama TL	7.472.628,83
Kalan Ödenek TL	7.767.492,17
Gerçekleşme Oranı (%)	49,03

Çizelge 26: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi (KOP)

İkinci Etap Galeri Hattı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çevresi Çevre Düzenlemesi İkmali, 539kWe Güneş Enerjisi Santrali ve 2018 Yılı Çevre Düzenlemesi yapım işi tamamlanmıştır.

¹¹ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar Çizelge-27’de yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	2018 Harcama Tutarı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İkinci Etap Galeri Hattı	2.999.556,44
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çevresi Çevre Düzenlemesi İkmali	472.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2018 Yılı Çevre Düzenlemesi	1.137.381,05
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	539kWe Güneş Enerjisi Santrali	2.808.400,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhata Duvarı	55.291,34
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hobi Bahçesi	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2. Etap 1. Kısım Yol Yapım İşİ	0,00
TOPLAM		7.472.628,83

Çizelge 27: 2009H031580 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı



Resim 2: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamındaki Yapım İşleri

3.4.1. İKİNCİ ETAP GALERİ HATTI

Yunus Emre Yerleşkesi içerisindeki hizmet binaları ve tesislerin ihtiyacı olan ısınma, temiz su, fiber hatları ve elektrik hatları için galeri hattı yapılmaktadır. 07 Eylül 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yapımı devam etmektedir.

İkinci Etap Galerî Hattı yapım işine ait detaylar *Çizelge-28*'da yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Emrah KONUKSEVEN (Konukseven Müh.)
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İkinci Etap Galerî Hattı Yapım İşî
Proje Numarası	2009H031580
İhale Tarihi	20 Temmuz 2018
Sözleşme Tarihi	07 Eylül 2018
Sözleşme Bedeli TL	8.083.000,00
Yer Teslim Tarihi	11 Eylül 2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	11 Eylül 2018
İşin Bitim Tarihi	18 Mayıs 2019
2017 Yılı Harcama Tutarı	2.999.556,44
Toplam Harcama Tutarı	2.999.556,44
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	48
İnşaatın Durumu	Devam ediyor.

Çizelge 28: 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşî



Resim 3: 2. Etap Galerî Hattı

3.4.2. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Üniversitemiz Yunus Emre yerleşke alanı içerisinde asfalt yol kenarları, ana giriş kapısı çevresini düzenlemek ve Sosyal Bilimler MYO çevresinin daha elverişli bir ortam haline dönüştürmek amaçlanmıştır.

01 Eylül 2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 2017 yılında %76'sı tamamlanan iş yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme feshedilmiştir. Ardından ikmal ihalesine çıkılarak 15 Ağustos 2018 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çevresi çevre düzenlemesi yapım işi tamamlanmış olup detaylar *Çizelge-29*'da yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Emrah KONUKSEVEN
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çevresi Çevre Düzenlemesi İkmal Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031580
İhale Tarihi	29 Haziran 2018
Sözleşme Tarihi	15 Ağustos 2018
Sözleşme Bedeli TL	472.000,00
Yer Teslim Tarihi	27 Ağustos 2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	27 Ağustos 2018
İşin Bitim Tarihi	07 Aralık 2018
2018 Yılı Harcama Tutarı	472.000,00
Toplam Harcama Tutarı	472.000,00
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 29: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ



Resim 4: Sosyal Bilimler MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ

3.4.3. 2018 YILI ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Yunus Emre Yerleşkesinde yer alan kütüphane binası, Doğu Kışla giriş kapısı ile cami arasında kalan alanda çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışması yapılmıştır. 09 Nisan 2018 tarihinde ihale edilmiştir. 18 Haziran 2018 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım işlerine başlanmıştır. 04 Aralık 2018 tarihinde çevre düzenleme tamamlanmıştır.

Çevre düzenlemesi yapım işi tamamlanmış olup detaylar *Çizelge-30'* da yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	İnanç ERGÜL
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 2018 Yılı Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031580
İhale Tarihi	09 Nisan 2018
Sözleşme Tarihi	07 Haziran 2018
Sözleşme Bedeli TL	1.263.780,00
Yer Teslim Tarihi	18 Haziran 2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18 Haziran 2018
İşin Bitim Tarihi	04 Aralık 2018
2018 Yılı Harcama Tutarı	1.137.381,05
Toplam Harcama Tutarı	1.137.381,05
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 30: 2018 Yılı Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ



Resim 5: Çevre Düzenlemesi

3.4.4. 539KWE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içinde güneş enerjisinden elektrik üreterek ring sistemine entegre edilmesi amaçlı 2. etap proje çalışmaları ve gerekli izinler alınarak 20 Kasım 2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup değerlendirme ve güvenlik soruşturmalarının ardından 14 Şubat 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

539 kWe enerji kapasiteli 2. etap güneş enerji santrali TEDAŞ tarafından geçici kabulü 21 Eylül 2018 tarihinde yapılarak enerji üretimine başlanılmıştır.

539 kWe Güneş Enerjisi Santrali yapım işine ait detaylar *Çizelge-31*'de yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Yücel ALAMAN (Doruk Enerji)
Sözleşmenin Konusu	539kWe Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Tarihi	20 Kasım 2017
Sözleşme Tarihi	14 Şubat 2018
Sözleşme Bedeli TL	2.808.400,00
Yer Teslim Tarihi	21 Şubat 2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	21 Şubat 2018
İşin Bitim Tarihi	21 Eylül 2018
2018 Yılı Harcama Tutarı	2.808.400,00
Toplam Harcama Tutarı	2.808.400,00
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 31: 539kWe Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi



Resim 6: Güneş Enerji Sistemi

3.4.5. İHATA DUVARI YAPIM İŞİ

Yunus Emre Yerleşkesi alanını daha güvenli hale getirmek amacıyla yapımı tamamlanan ihata duvarı ve ferforje korkuluk işi için 2018 yılında 55.291,34 TL ödeme yapılmıştır.

3.4.6. HOBI BAHÇESİ

Üniversitemizin gerek Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü gerekse Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümlerinde eğitim öğretim ve bilimsel nitelikte Ar-Ge (TÜBİTAK, SANTEZ, BAP vb.) çalışmalar yürütülmektedir.

Mülkiyeti hazineye ait olan ve Üniversitemize tahsis edilen tarım arazisi üzerine Maliye Bakanlığında alınan onay neticesinde Üniversitemizce sadece personelimiz ve öğrencilerimize bedel karşılığı kiralanmak üzere gıda-tarım araştırma ve eğitim uygulama alanı ve sosyal amaçlı bir hobi bahçesi yapılması planlanmış fakat gerekli izinler alınamamıştır.



Resim 7: Hobi Bahçesi Proje Fotoğrafi

3.4.7. 2. ETAP 1. KISIM YOL YAPIM İŞİ

Yunus Emre Yerleşkesi 2. etap çalışmaları kapsamında yapımı devam eden Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri (Morfoloji) Fakültesi ve yapımına başlanılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi Binası ulaşımlarını sağlayabilmek için asfalt yol ve çevre düzenlemesi ihale çalışmaları yapılmıştır.

3.5. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) için 2018 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 10.000.000,00 TL olup 27.477.460,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, toplam ödenek 37.477.460,00 TL olmuştur. 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup detaylar *Çizelge-32*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Eğitim (19.900 m ²)
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı TL	31.931.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	10.000.000,00
Eklenen TL ¹²	27.477.460,00
Toplam Ödenek TL	37.477.460,00
Harcama TL	21.893.896,68
Kalan Ödenek	15.583.563,32
Gerçekleşme Oranı (%)	58,42

Çizelge 32: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2009H031590 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar *Çizelge-33*'de yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Eğitim Fakültesi Binası Yapım İş (8.000 m ²)	7.362.905,68
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İş (1.500 m ²)	2.131.581,33
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sağlık Bilimleri Fakültesi (10.500 m ²)	12.399.409,67
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m ²)	0,00
TOPLAM		21.893.896,68

Çizelge 33: 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı

¹² Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

3.5.1. EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ (8.000 M²)

2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayan Eğitim Fakültesinin yeni hizmet binası ihtiyacını karşılamak üzere 8.000 m² kapalı alana bir hizmet binası yapılmaktadır. İhalesi 10 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır. 08 Şubat 2018 tarihinde yer teslimi yapılan Eğitim Fakültesi bina inşaatı devam etmektedir.

Eğitim Fakültesi Binası yapım işine ait detaylar *Çizelge-34'* te yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ayşe ALTUNÖZ-Emrah KONUKSEVEN İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031590
İhale Tarihi	10 Kasım 2017
Sözleşme Tarihi	30 Ocak 2018
Sözleşme Bedeli TL	11.984.080,00
Yer Teslim Tarihi	08 Şubat 2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	08 Şubat 2018
İşin Bitim Tarihi	16 Ağustos 2019
2018 Yılı Harcama Tutarı TL	7.362.905,68
Toplam Harcama Tutarı TL	7.362.905,68
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	58
İnşaatın Durumu	Devam ediyor.

Çizelge 34: Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşİ



Resim 8: Eğitim Fakültesi Binası Proje Fotoğrafi



Resim 9: Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı

3.5.2. KAZIM KARABEKİR MYO 500 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI SALON (1.500 M²)

Kazım Karabekir MYO öğrenci sayısının hızla artması ve okulun sosyal faaliyetlerinin fazla olması sebebiyle Kazım Karabekir Meslek Yüksekokuluna ilave 500 kişilik çok amaçlı salon yapılması ile öğrencilerin ve meslek yüksekokulunun sosyal ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. İhalesi 28 Eylül 2017 tarihinde yapılmış, 21 Aralık 2017 tarihinde sözleşmesi imzalanıp 25 Aralık 2017 tarihinde de yer teslimi yapılarak yapım işine başlanılmış olup, inşaat devam etmektedir.

Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon yapım işine ait detaylar *Çizelge-35*'da yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Koçoğlu Mek. Tes. İnş. Çevre Tekn. San. ve Tic. Ltd. Şti
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031590
İhale Tarihi	28 Eylül 2017
Sözleşme Tarihi	21 Aralık 2017
Sözleşme Bedeli TL	3.477.460,00
Yer Teslim Tarihi	25 Aralık 2017
Fiilen İşe Başlama Tarihi	25 Aralık 2017
İşin Bitim Tarihi	19 Mart 2019
2018 Yılı Harcama Tutarı TL	2.131.581,33
Toplam Harcama Tutarı TL	2.131.581,33
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	50
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

Çizelge 35: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İşİ

Resim 10: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salonu

3.5.3. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılan bina yetersiz gelmektedir. Öğrencilerimize daha iyi eğitim verebilmek için yeni hizmet binası yapımına başlanmıştır. 10.500 m² kapalı alana sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi binası yapım işi 10 Ocak 2018 tarihinde ihale edilmiştir. 5 Mart 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 12 Mart 2018 tarihinde yapılarak inşaat başlanmış ve hâlen inşaatı devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi yapım işine ait detaylar *Çizelge-36*'da yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Hayma İnş Taah. Mad. Nak. Hyv. Pet. Ene. Yol Yapım San. Tic. Aş.-Özcan Çelik Adi Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H031590
İhale Tarihi	10 Ocak 2018
Sözleşme Tarihi	5 Mart 2018
Sözleşme Bedeli TL	15.564.200,00
Yer Teslim Tarihi	12 Mart 2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	12 Mart 2018
İşin Bitim Tarihi	26 Temmuz 2019
2018 Yılı Harcama Tutarı TL	12.399.409,67
Toplam Harcama Tutarı TL	12.399.409,67
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	61
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 36: Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapım İşİ



Resim 11: Sağlık Bilimleri Fakültesi bina inşaatı

3.5.4. ERMENEK MYO UYGULAMA OTELİ

Ermenek Barajının tamamlanması ile ilçe turizmde cazibe merkezi olabileceği düşünülmektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na bağlı Turizm Rehberliği Bölümü için yapılması düşünülen Ermenek MYO Uygulama Otelinin, bodrum+zemin+2 kat olmak üzere 8.000 m² alana sahip olması planlanmaktadır.

Proje çalışmaları devam etmekte olup 2019 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

3.6. 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP)

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP) için 2018 yılı bütçemize ayrılan ödenek 5.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde 3.431.413,00 TL tutarında ödenek eklemesi yapılmıştır. Eklemeler sonucunda 2018 yılı toplam ödeneği 8.431.413,00 TL olmuştur. Toplam harcama 30.821,33 TL'dir. 2010H050170 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine (KOP) ait detaylar *Çizelge-37*'de yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı TL	17.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	5.000.000,00
Eklenen TL ¹³	3.431.413,00
Toplam Ödenek TL	8.431.413,00
Harcama TL	30.821,33
Kalan Ödenek	8.400.591,67
Gerçekleşme Oranı (%)	0,37

Çizelge 37: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP)

2010H050170 nolu Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar *Çizelge-38*'de yer almaktadır.

Alımı Gerçekleştiren Birim	Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin Üstünün Kapatılması	12.366,94
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.000 Seyircili Tribün Sentetik Yüzeyleli Atletizm Pisti Futbol Sahası	18.454,39
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Stadyum (Tribün)	0,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu	0,00
TOPLAM		30.821,33

Çizelge 38: 2010H050170 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı

¹³ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

3.6.1. KAZIM KARABEKİR MYO AÇIK SPOR TESİSLERİNİN ÜSTÜNÜN KAPATILMASI

Kazım Karabekir MYO açık spor tesislerinin üstünün, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden spor aktivitelerini yapabilmeleri amacıyla kapatılması planlanmıştır. 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde ihalesi yapılmış, 21 Haziran 2017 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. 07 Aralık 2017 tarihinde bitirilerek hizmete açılan Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesislerinin için 2018 yılında 12.366,94 TL ödeme yapılmıştır.



Resim 12: Kazım Karabekir MYO Açık Spor Tesisleri - Üstü Kapatılmadan Önce



Resim 13: Kazım Karabekir Açık Spor Tesisleri - Üstü Kapatıldıktan Sonra

3.6.2. KMÜ SENTETİK YÜZEYLİ ATLETİZM PİSTİ İLE STADYUM YAPIM İŞİ

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü öğrencilerine daha iyi eğitim verilmesi ve Üniversitemizin üniversitelerarası spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla 5.000 kişilik stadyum yapılacaktır. Stadyumun öncelikle açık spor alanının yapımı planlanmış ve 2015 yılı içerisinde KMÜ Sentetik Yüzeyle Atletizm Pisti Yapım İşİ olarak ihaleye çıkmıştır. 15/12/2016 tarihinde tamamlanan işin geçici kabulü yapılmıştır. Kesin hesabı 2018 yılı içerisinde yapılan iş için 18.454,39 TL ödeme yapılmıştır.



Resim 14: Sentetik Yüzeyle Atletizm Pisti

3.6.3. STADYUM (TRİBÜN)

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine daha iyi eğitim vermek ve Üniversitemizin üniversiteler arası spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla tam olimpik atletizm pisti 2016 Aralık ayı itibari ile tamamlanmıştır. 5.000 kişilik üstü kapalı seyirci tribünü yapılmasıyla stadyum ihtiyacı tamamlanacaktır. Tribün yapım işi projelendirilmiş olup değerlendirme ve ihale aşamasındadır.



Resim 15: 5.000 Kişilik Üstü Kapalı Seyirci Tribünü Proje Fotoğrafi

3.6.4. ERMENEK MYO KAPALI SPOR SALONU

Üniversitemizin Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sosyal tesis kazandırmak ve Taşeli Bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yapımı planlanan Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu projelendirilmiş olup değerlendirme ve ihale aşamasındadır.

4. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe, Kamu Yatırım İzleme Sistemi ve kamuyat programları arasında düzenleme yapılmalıdır.
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.
5. Proje ve ihale süreçlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.

