



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU





Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
ÇİZELGELER TABLOSU.....	iii
KISALTMALAR.....	v
1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	vii
2. GENEL DEĞERLENDİRME	9
2.1. UZGÖRÜŞÜMÜZ	9
2.2. ÖZGÖREVİMİZ	9
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ	9
2.4. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	10
2.5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	13
2.6. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	14
2.7. 2019 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	17
2.7.1. Hedeflenen	17
2.7.2. Gerçekleşen	17
2.7.3. Devam Edenler	18
2.8. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	19
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	19
2.7.2 Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri.....	26
2.7.3 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	29
3. PROJE UYGULAMALARI.....	30
3.1. 2019H03-3471 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ (KOP).....	30
3.2. 2019H03-3472 MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KOP)	31
3.3. 2019H03-3473 YAYIN ALIMI PROJESİ (KOP)	39
3.4. 2009H03-1056 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ (KOP).....	43
3.4.1. İkinci Etap Galeri Hattı	44
3.4.2. İkinci Etap Yol Yapım İşİ	46
3.5. 2009H03-1057 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (KOP)	47
3.5.1. Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşİ.....	48
3.5.2. Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon	50
3.5.3. Sağlık Bilimleri Fakültesi	52
3.5.4. Ermenek MYO Uygulama Oteli	54
3.6. 2010H05-1269 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ (KOP).....	55
3.6.1. Stadyum (Tribün)	56
3.6.2. Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu	56
4. ÖNERİLER	57

ÇİZELGELER TABLOSU

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar	10
Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri	10
Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler	11
Çizelge 4: Farklılaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler	11
Çizelge 5: Kurumsallaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler	12
Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları.....	13
Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m ²).....	14
Çizelge 8: Kapalı Mekânların Dağılımı.....	15
Çizelge 9: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)	16
Çizelge 10: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı	19
Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey).....	21
Çizelge 12: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	22
Çizelge 13: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey).....	22
Çizelge 14: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....	23
Çizelge 15: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)	24
Çizelge 16: Geyrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	25
Çizelge 17: Revizyon (2019H03-3471 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)	26
Çizelge 18: Revizyon (2019H03-3472 Nolu Muhtelif İşler (KOP)).....	26
Çizelge 19: Revizyon (2019H03-3473 Nolu Yayın Alımı).....	27
Çizelge 20: Revizyon (2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı (KOP))	27
Çizelge 21: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)).....	28
Çizelge 22: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP))	28
Çizelge 23: 2019H03-3471 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP).....	30
Çizelge 24: 2019H03-3471 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP) Harcamalarının Detayı ...	30
Çizelge 25: 2019H03-3472 Nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP).....	31
Çizelge 26: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)	32
Çizelge 27: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (BİLTEM)	33

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı).....	33
Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....	34
Çizelge 30: 2019H03-3473 Nolu Yayın Alımı Projesi	39
Çizelge 31: 2019H03-3473 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı.....	40
Çizelge 32: 2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi (KOP).....	43
Çizelge 33: 2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı	43
Çizelge 34: 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşi.....	44
Çizelge 35: İkinci Etap Yol Yapım işi.....	46
Çizelge 36: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	47
Çizelge 37: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı.....	47
Çizelge 38: Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşi	48
Çizelge 39: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İşi.....	50
Çizelge 40: Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapım İşi.....	52
Çizelge 41: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP)	55

KISALTMALAR

BESYO	: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
EBYS	: Elektronik Belge Yönetim Sistemi
KMÜ	: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
MYO	: Meslek Yüksekokulu
BİLTEM	: Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Üniversitemizi şehir ve bölge boyutundan daha ileri noktalara taşımak, Ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma getirerek uluslararası bir üniversite hüviyetine kavuşturmak, erdemli ve kalifiye insanlar yetiştirecek her türlü sosyal, bilimsel ve teknolojik alt yapıyı hazırlamak, mensuplarımızla birlikte hem milletimizin ufkuna hem de insanlığa yeni bir soluk getirmek en büyük hedefimizdir.

Bütün paydaşlarımızla bölgesel kalkınma öz görevini ve farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil

toplum kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi/Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

Üniversitemiz gelişim planına göre ilk etap projelerini büyük oranda tamamlayarak ikinci etap projelerini uygulamaya koyduk. Buna göre Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları Üniversitemizin ikinci etaptaki ilk projeleri arasında yerini aldı. 2019 yılı ikinci etap ısı kanalı projesini de hayata geçirdik. Yeni dönemde ilçelerdeki altyapı çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu bünyesinde 500 kişilik çok amaçlı salon hizmete açılmış olup sosyal ve kültürel faaliyetlerde hem Kazım Karabekir yerleşkesindeki öğrencilerimize hem de ilçe halkına hizmet verecektir.

Yine 2019 Yılı Yatırım Bütçemizde yer alan ödeneklerden, eğitim öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikaların öncelendiği görülmektedir. Buna yönelik olarak gerekli olan derslik, makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları alanlarında ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha düzenli ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

Üniversitenin tüm imkânlarını ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için seferber ettik ve ihtiyaç duyulan alanlarda iyi yetişmiş öğrenciler mezun etmek amacıyla var gücümüzle çaba gösterdik. Üniversitemiz için olduğu kadar ilimiz ve ülkemiz için de son derece önemli bir sağlık ve eğitim yatırımı olan Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ile ülkemizin sağlık alanında da yetişmiş eleman ihtiyacına katkı sağlayacağız.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” nu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Uzgörüřümüz

İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiřtiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliřtirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.

2.2. Özgörevimiz

Üniversitemiz arařtırmayı, öğrenmeyi, paylařmayı esas alan köklerine baėlı ve evrensel değerlerle donatılmış görev ve sorumluluėunun bilincinde erdemli bir neslin yetiřtirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiřtir.

2.3. Temel Deėerlerimiz

- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Etik deėerlere baėlılık
- ✓ řeffaflık
- ✓ Öğrenci merkezlik
- ✓ Kent, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ İnsan hak ve özgürlüklerine saygı
- ✓ Türk dilinin doğru kullanılması ve yaygınlařtırılmasına karřı duyarlılık

2.4. Temel Amaç ve Hedefler

EKSENLER	AMAÇLAR
EĞİTİM EKSENİ	Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ	Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.
FARKLILAŞMA EKSENİ	Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.
KURUMSALLAŞMA EKSENİ	Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.	Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.
	Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.
	Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.
	Teoriye uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri

AMAÇ 2	HEDEFLER
Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.	Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.
	Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.

Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 3	HEDEFLER
Türk dili, gıda, tarım ve temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.	Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.
	Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.
	Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.
	Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.
	TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üretmek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.

Çizelge 4: Farklılaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 4	HEDEFLER
Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.
	Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.
	Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.
	Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.
	Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.

Çizelge 5: Kurumsallaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2019 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 14.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 35.406,699,00 TL olmuştur. Projelerin sektöre göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2019 Yılı Program Ödeneği	2019 Yılı Revizeli Ödenek	2019 Yılı Harcama
Eğitim- Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	50.463.000,00	18.639.000,00	4.342.000,00	15.232.743,00	9.752.263,48
Eğitim- Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı (KOP)	64.544.000,00	52.948.580,00	4.101.000,00	11.592.456,00	11.271.932,79
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	19.546.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	58.675,50
Eğitim- Yükseköğretim	Muhtelif İşler (KOP)	7.831.500,00	0,00	4.807.000,00	7.831.500,00	7.675.690,48
Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı (KOP)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	476.005,08
TOPLAM		143.084.500,00	71.587.580,00	14.000.000,00	35.406.699,00	29.234.567,33


Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 94,57'si Yunus Emre Yerleşkesi, % 2,90'ı Ermenek MYO Yerleşkesi ve % 2,53'ü de Kazım Karabekir MYO Yerleşkesinde yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	5.492,33	1.780.389,32	-	1.785.881,65
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazım Karabekir Yerleşkesi	23.850,99	23.938,98	-	47.789,97
Genel Toplam	84.130,43	1.804.328,30	-	1.888.458,73

Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m²)

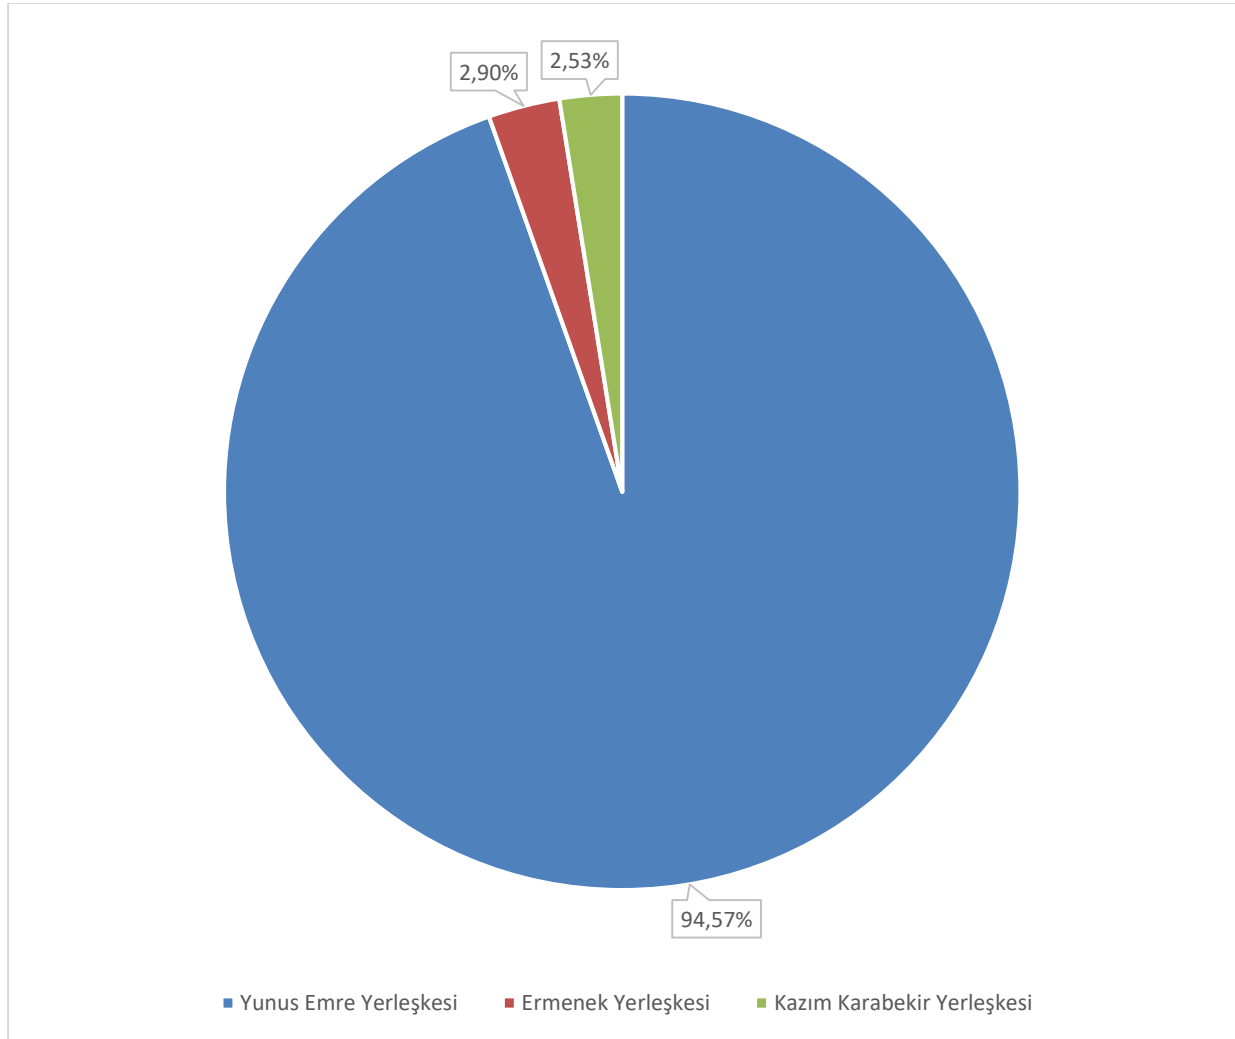


Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı

Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kapalı hizmet alanlarının % 78,85'ini eğitim alanları, % 7,60'ını sosyal alanlar, % 7,15'ini spor alanları, % 5,57'sini idari alanlar ve % 0,83'ünü barınma alanları oluşturmaktadır.

Hizmet Alanı	Yerleşke Adı			Toplam (m ²)
	Yunus Emre	Ermenek	Kazım Karabekir	
İdari	9.930	-	-	9.930
Eğitim	126.300	5.680	8.500	140.480
Spor	12.582	150	-	12.732
Sosyal	13.533	-	-	13.533
Barınma	1.480	-	-	1.480
Genel Toplam	163.825	5.830	8.500	178.155

Çizelge 8: Kapalı Mekânların Dağılımı

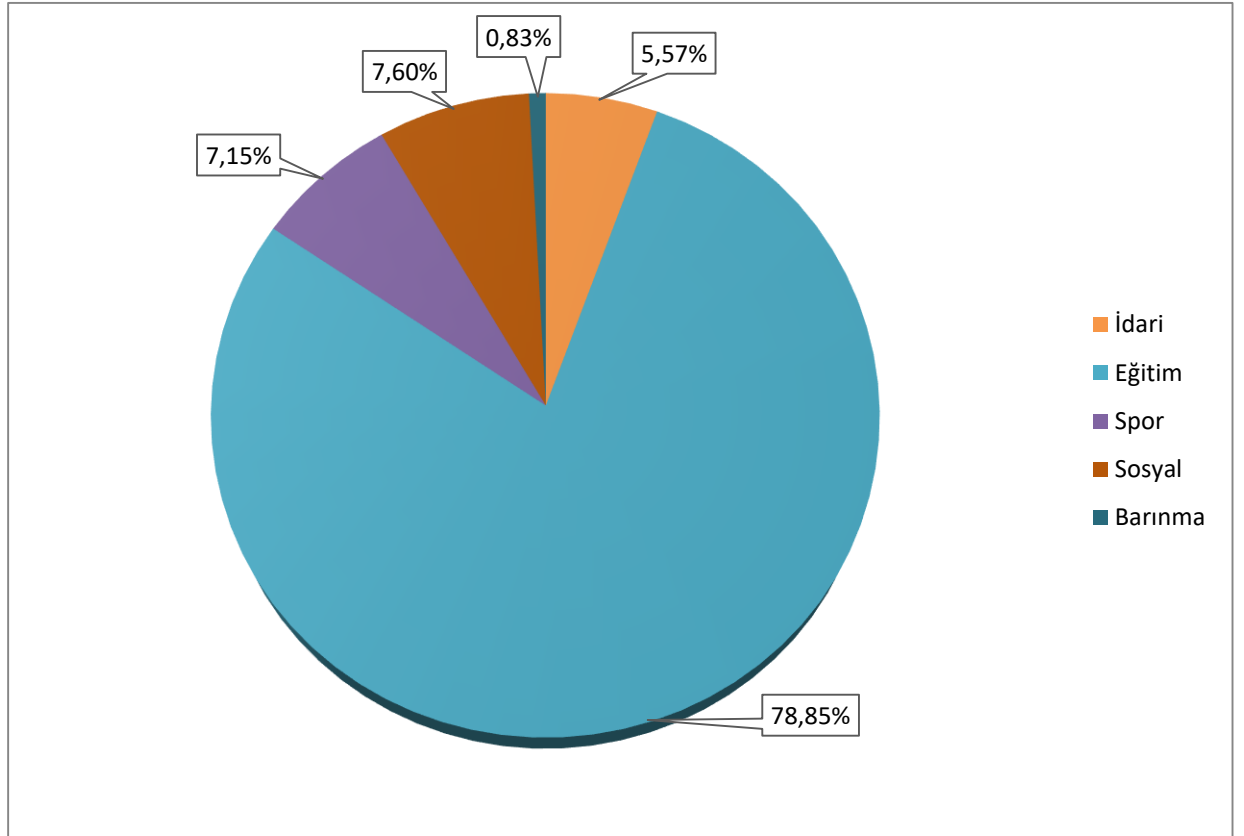

Grafik 2: Taşınmazların Hizmet Alanları İtibariyle Dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Barınma
Yunus Emre Yerleşkesi					
İslami İlimler Fakültesi		8.350			
Eğitim Fakültesi		8.000			
Sağlık Bilimleri Fakültesi		10.500			
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		13.000			
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635			
Sosyal Bilimler MYO/Uygulamalı Bilimler Fak.		6.640			
Sağlık Hizmetleri MYO		7.215			
Mühendislik Fakültesi		20.435			
Edebiyat Fakültesi ve Konf. Sal.		17.420			
BESYO Binası		9.270			
Kütüphane Binası		10.500			
Halıcılık-Seramik Atölyesi		3.798			
Makine- Otomotiv atölyesi		3.367			
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		3.170			
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu			5.082		
1.500 Kişilik Kapalı Spor Salonu			7.500		
Amfi Tiyatro				533	
Yemekhane Kafeterya Çarşı Binası				13.000	
Isı Merkezi	1.755				
Bilgi İşlem Binası	3.175				
Rektörlük Hizmet Binası	5.000				
Rektörlük Konutu					350
Misafirhane					1.130
TOPLAM	9.930	126.300	12.582	13.533	1.480
Ermenek Yerleşkesi					
Ermenek MYO		4.175			
Ermenek Spor Salonu			150		
Ermenek MYO Atölye		1.505			
TOPLAM	0	5.680	150	0	0
Kazım Karabekir Yerleşkesi					
Kazım Karabekir MYO		7.000			
Kazım Karabekir Konf. Sal.		1.500			
TOPLAM	0	8.500	0	0	0
GENEL TOPLAM	9.930	140.480	12.732	13.533	1.480
			178.155		

Çizelge 9: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

2.7. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.7.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2019 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2019 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2. Gerçekleşen

2019 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ✓ Kazım Karabekir yerleşkesindeki çok amaçlı salon yapım işi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
- ✓ Eğitim Fakültesi binasının geçici kabulü yapılmış ve tefrişatı yapılarak hizmete açılmıştır.
- ✓ Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının geçici kabulü yapılmıştır.
- ✓ İkinci etap galeri hattının geçici kabulü yapılmıştır.
- ✓ Tribün, Diş Hekimliği, Ermenek spor salonu için zemin etüt ve raporlama hizmeti, Enerji Verimi Laboratuvarı için statik proje çizimi hizmeti ve Yunus Emre yerleşkesi için 2 adet imar tadilatı projesi yaptırılması hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyacımız doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.
- ✓ 2019 yılı içerisinde elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar gerçekleştirilmiştir.

2.7.3. Devam Edenler

✓ Üniversitemizin 2. etap yerleşkesinde hizmete girmiş olan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi Binası ile Ahmet-Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yapımına başlanan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve ilerleyen zamanlarda yapılması düşünülen eğitim ve hizmet binalarına ulaşımın sağlanması amacıyla 2. Etap yol projesi çalışmaları 2018 yılında başlamış olup faaliyet dönemi içerisinde de devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.


2.8. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 14.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 48.706.699,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 29.234.567,33 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 60,02'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir. Sermaye Giderleri gerçekleştirmelerinin % 21,26'sını mamul mal alımları, % 0,65'ini gayri maddi hak alımları, % 72,50'sini gayrimenkul sermaye üretim giderleri, % 0,57'sini menkul malların büyük onarım giderleri ve % 5,01'ini gayrimenkul büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

Eko. Kod	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcamanın Toplam Ödeneğe Oranı
6.1	3.557.000,00	2.700.000,00	6.257.000,00	6.216.016,60	99,34%
6.3	100.000,00	100.000,00	200.000,00	190.955,60	95,48%
6.5	8.693.000,00	31.808.699,00	40.501.699,00	21.195.051,02	52,33%
6.6	150.000,00	98.000,00	248.000,00	167.856,31	67,68%
6.7	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.464.687,80	97,65%
Top.	14.000.000,00	34.706.699,00	48.706.699,00	29.234.567,33	60,02%

Çizelge 10: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı

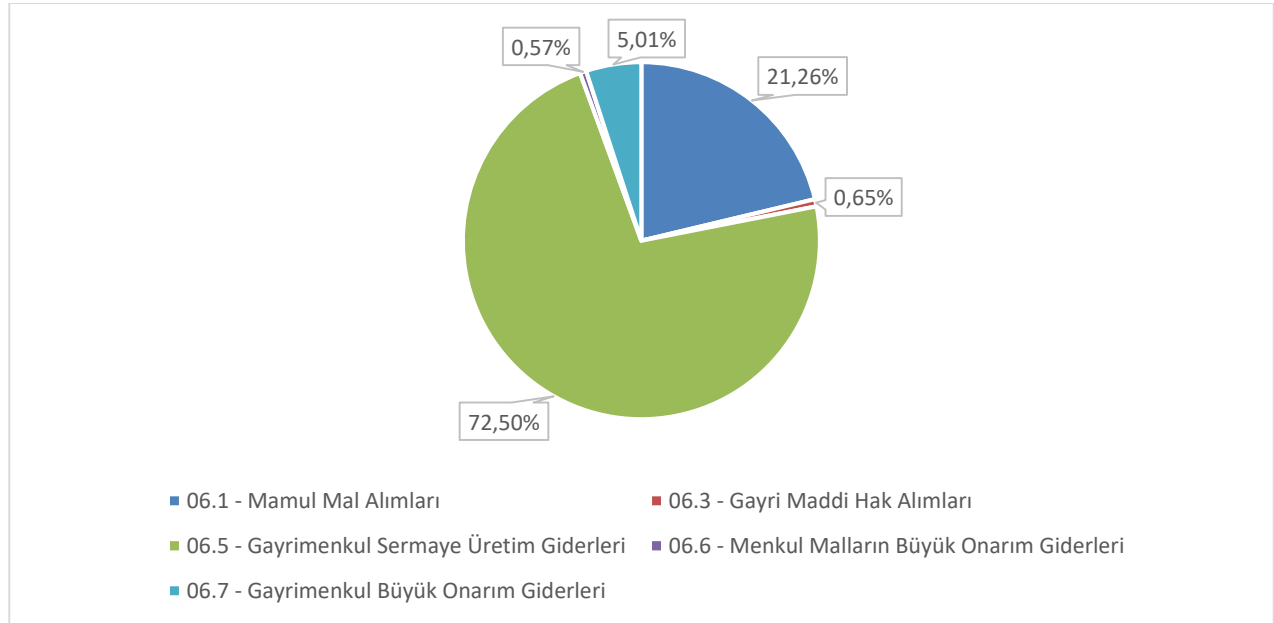

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Sermaye giderlerine ilişkin 2019 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
06	1	1	01	Büro Mefruşatı Alımları	277.197,07
06	1	1	02	İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri)	62.540,00
06	1	1	03	Okul Mefruşatı Alımları	1.278.825,50
06	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	300.350,68
06	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.918.913,25
06	1	2	01	Büro Makineleri Alımları	255.029,21
06	1	2	02	Bilgisayar Alımları	23.221,46
06	1	2	04	Laboratuvar Cihazı Alımları	89.504,80
06	1	2	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	42.923,00
06	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	3.400.474,76
06	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	3.811.153,23
06	1	3	04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	9.923,80
06	1	3	90	Diğer Avadanlık Alımları	21,24
06	1	3		Avadanlık Alımları	9.945,04
06	1	6	01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	59.776,39
06	1	6	03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	416.228,69
06	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	476.005,08
06	1			Mamul Mal Alımları	6.216.016,60
06	3	1	01	Bilgisayar Yazılı Alımları	190.425,95
06	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	190.425,95
06	3	9	01	Diğer Fikri Hak Alımları	529,65
06	3	9		Diğer Fikri Hak Alımları	529,65
06	3			Gayri Maddi Hak Alımları	190.955,60
06	5	1	01	Proje Giderleri	30.355,50
06	5	1	90	Diğer Giderler	28.320,00
06	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	58.675,50
06	5	2	90	Diğer Giderler	980,51
06	5	2		Malzeme Giderleri	980,51
06	5	7	01	Hizmet Binası	7.838.398,09
06	5	7	04	Sosyal Tesisler	1.653.056,36
06	5	7	07	Yol Yapım Giderleri	5.640.443,10
06	5	7	90	Diğerleri	6.003.497,46
06	5	7		Müteahhitlik Giderleri	21.135.395,01
06	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.195.051,02
06	6	2	01	Malzeme Giderleri	25.922,59
06	6	2		Malzeme Giderleri	25.922,59
06	6	9	01	Diğer Giderler	141.933,72

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
06	6	9		Diğer Giderler	141.933,72
06	6			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	167.856,31
06	7	2	01	İnşaat Malzemesi Giderleri	10.646,08
06	7	2	02	Elektrik Tesisatı Giderleri	35.093,44
06	7	2	90	Diğer Giderler	65.596,20
06	7	2		Malzeme Giderleri	111.335,72
06	7	7	90	Diğerleri	1.225.857,80
06	7	7		Müteahhitlik Giderleri	1.225.857,80
06	7	9	01	Diğer Giderler	127.494,28
06	7	9		Diğer Giderleri	127.494,28
06	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.464.687,80
06				Sermaye Giderleri	29.234.567,33

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

06.1 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 3.557.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 2.700.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 6.257.000,00 TL olmuştur. 2019H03-3472 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 5.740.011,52 TL, 2019H03-3473 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 476.005,08 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 6.216.016,60 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 99,34'dür. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.1.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	277.197,07	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri)	62.540,00	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	1.278.825,50	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	300.350,68	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.1	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları			1.918.913,25	
06.1.2.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	255.029,21	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	23.221,46	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımı	89.504,80	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat ve Diğer Makine Teçhizat Alımı	42.923,00	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.2.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine ve Teçhizat Alımı	3.400.474,76	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları				3.811.153,23
06.1.3.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	9.923,80	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.3.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Avadanlık Alımları	21,24	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.1.3	Avadanlık Alımları				9.945,04
06.1.6.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	59.776,39	2019H03-3473	Yayın Alımı (KOP)
06.1.6.03	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	416.228,69	2019H03-3473	Yayın Alımı (KOP)
06.1.6	Yayın Alımları ve Yapımları				476.005,08
06.1	Mamul Mal Alımları				6.216.016,60

Çizelge 12: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde finansman fazlasından 100.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 200.000,00 TL olmuştur. 2019H03-3472 nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP) kapsamında 190.955,60 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 95,48'dir. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.3.1.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	190.425,95	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.3.1	Bilgisayar Yazılımı Alımları				190.425,95
06.3.9.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Fikri Hak Alımları	529,65	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.3.9	Diğer Fikri Hak Alımları				529,65
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları				190.955,60

Çizelge 13: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 8.693.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde finansman fazlasından 31.808.699,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 40.501.699,00 TL olmuştur. 2019H03-3471 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP), 2009H03-1056 nolu Kampüs Altyapısı Projesi (KOP), 2009H03-1057 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) kapsamında 21.195.051,02 TL harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 48,17'dir. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.5.1.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	30.355,50	2019H03-3471	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)
06.5.1.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	28.320,00	2019H03-3471	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)
06.5.1	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler			58.675,50	
06.5.2.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	980,51	2009H03-1056	Kampüs Altyapısı (KOP)
06.5.2	Malzeme Giderleri			980,51	
06.5.7.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	7.838.398,09	2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
06.5.7.04	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Tesisler	1.653.056,36	2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
06.5.7.07	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sosyal Tesisler	5.640.443,10	2009H03-1056	Kampüs Altyapısı (KOP)
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	112.179,25	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	5.630.509,18	2009H03-1056	Kampüs Altyapısı (KOP)
06.5.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	260.809,03	2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)
06.5.7	Müteahhitlik Giderleri			21.135.395,01	
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			21.195.051,02	

Çizelge 14: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 150.000,00 TL olan 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde finansman fazlasından 98.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 248.000,00 TL olmuştur. 2019H03-3472 nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP) kapsamında 167.856,31 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 67,68'dir. 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.6.2.01	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Malzeme Giderleri	1.343,00	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.6.2.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	13.579,63	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.6.2.01	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	10.999,96	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.6.2	Malzeme Giderleri			25.922,59	
06.6.9.01	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Diğer Giderler	81.039,60	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.6.9.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	51.214,12	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.6.9.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	9.680,00	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.6.9	Diğer Giderler			141.933,72	
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			167.856,31	

Çizelge 15: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 2019H03-3472 nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP) kapsamında 1.464.687,80 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 97,65'dir. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Eko. Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.7.2.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İnşaat Malzemesi Giderleri	10.646,08	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.7.2.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Elektrik Tesisatı Giderleri	35.093,44	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.7.2.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	65.596,20	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.7.2	Malzeme Giderleri			111.335,72	
06.7.7.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğerleri	1.225.857,80	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.7.7	Müteahhitlik Giderleri			1.225.857,80	
06.7.9.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	127.494,28	2019H03-3472	Muhtelif İşler (KOP)
06.7.9	Diğer Giderler			127.494,28	
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			1.464.687,80	

Çizelge 16: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

2.7.2 Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2019 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-17* ile 22'de yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'de gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2019H03-3471
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2019-2019
2019 Yılı Proje Tutarı TL	200.000,00
2018 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2019 Yılı Yatırımı TL	200.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2019 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	200.000,00
2019 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	200.000,00

Çizelge 17: Revizyon (2019H03-3471 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2019H03-3472
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2019-2019
2019 Yılı Proje Tutarı TL	4.807.000,00
2018 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2019 Yılı Yatırımı TL	4.807.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ¹	3.024.500,00
2019 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	7.831.500,00
2019 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	7.831.500,00

Çizelge 18: Revizyon (2019H03-3472 Nolu Muhtelif İşler (KOP))

¹ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2019H03-3473
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2019-2019
2019 Yılı Proje Tutarı TL	500.000,00
2018 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2019 Yılı Yatırımı TL	500.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2019 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	500.000,00
2019 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	500.000,00

Çizelge 19: Revizyon (2019H03-3473 Nolu Yayın Alımı)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H03-1056
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2020
2019 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	64.544.000,00
2018 Yılı Kümülatif Harcama TL	52.948.580,00
2019 Yılı Yatırımı TL	4.101.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ²	7.491.456,00
2019 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	64.544.000,00
2019 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	11.592.456,00

Çizelge 20: Revizyon (2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı (KOP))

² Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H03-1057
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2019
2019 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	50.463.000,00
2018 Yılı Kümülatif Harcama TL	18.639.000,00
2019 Yılı Yatırımı TL	4.342.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ³	15.890.743,00
Tenkis ⁴	5.000.000,00
2019 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	50.463.000,00
2019 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	15.232.743,00

Çizelge 21: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler (KOP))

Sektörü	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H05-1269
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2020
2019 Yılı Kümülatif Proje Tutarı TL	19.546.000,00
2018 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2019 Yılı Yatırımı TL	50.000,00
Eklenen/Aktarılan TL ⁵	8.300.000,00
Tenkis ⁶	8.300.000,00
2019 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	19.546.000,00
2019 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	50.000,00


Çizelge 22: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP))

³ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

⁴ Ermenek MYO Uygulama Oteli projesi askıya alındığından ödenek tenkis edilmiştir.

⁵ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

⁶ Stadyum (Tribün) ve Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu projeleri askıya alındığından ödenek tenkis edilmiştir.

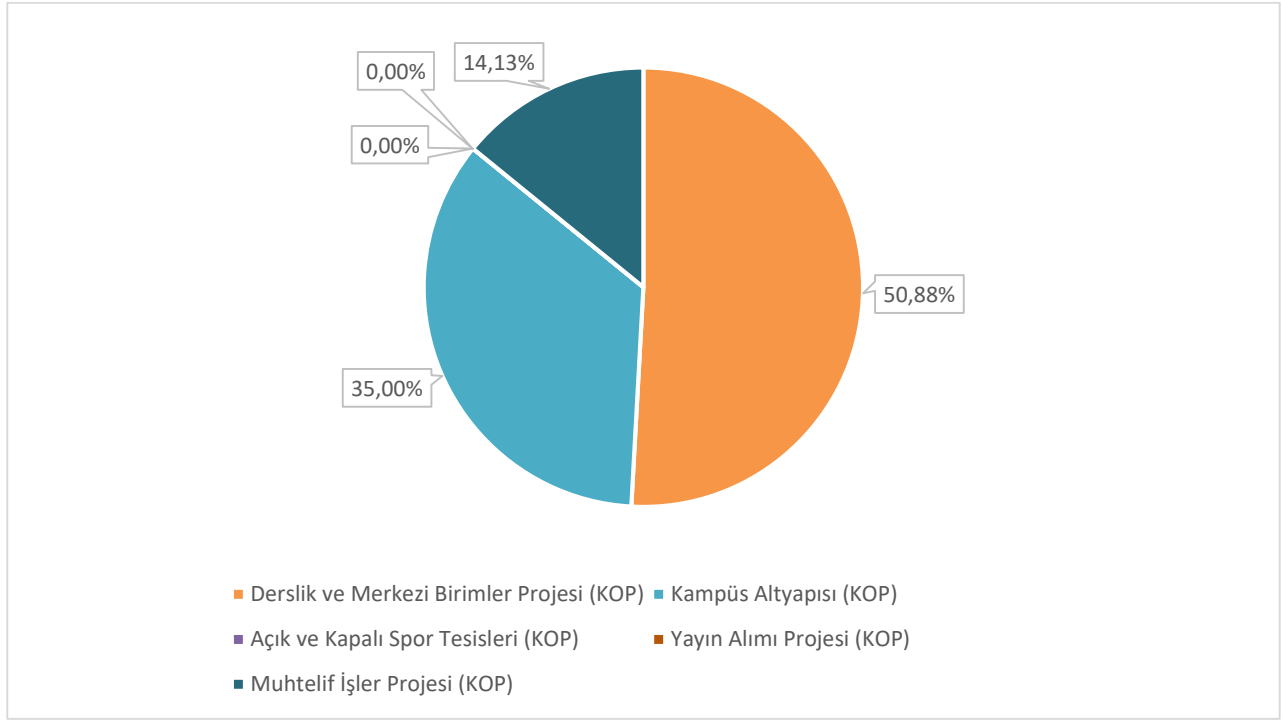

Grafik 4: Yapılan Rezizyonların Proje Bazında Dağılımı

2.7.3 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. sebebiyle daha uzun sürmektedir.
- Dolar kurundaki istikrarsızlık ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte ve maliyet hesabında sorunlara yol açmaktadır.
- Teknik personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, proje hazırlığı ile ihaleye çıkılması arasındaki süre yetersizliği vb. durumlardan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.
- Yatırım programında yer almasına rağmen (Stad/Otel/Spor salonu vb.) yıl içinde ihaleye izin verilmemesi nedeniyle acil ihtiyaçlar karşılanamamaktadır.
- Kesin teminatın iadesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ihale mevzuatına göre geçici kabul yapıldıktan sonra kesin teminatın yarısının iade edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun'a göre kesin teminatın yarısının iadesinde ilişiksiz belgesi aranmamakta, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı Kanun'a göre ilişiksiz belgesi düzenlenmeden kesin teminatın yarısının iadesinin yapılamayacağı belirtilmekte olup SGK tarafından ilişiksiz belgesi düzenlenebilmesi için işe ait kesin hakediş tutarı istenilmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kesin hakediş tutarı, kesin kabul aşamasında kesin hakediş raporu ile tespit edilmektedir. Geçici kabul işleminden sonra işin kesin hakediş tutarı belli olmadığı için kesin teminatın yarısının iadesi mümkün olmamaktadır.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2019H03-3471 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP) için 2019 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Toplam harcama ise 58.675,50 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019H03-3471 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine (KOP) ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı TL	200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	200.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	200.000,00
Harcama TL	58.675,50
Kalan Ödenek TL	141.324,50
Gerçekleşme Oranı %	29,34

Çizelge 23: 2019H03-3471 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)

Üniversitemiz tarafından 2019 yılında 2 adet imar tadilatı projesi yaptırılmış, Stadyum Tribünü, Dış Hekimliği Fakültesi, Ermenek MYO Spor Salonu için zemin etüt ve raporlama hizmeti ile enerji verimliliği laboratuvarı için statik proje çizimi hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

2019H03-3471 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP) kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
İmar Tadilatı Projesi Yaptırılması Hizmet Alım İşİ	28.320,00
Stadyum Tribünü, Dış Hekimliği Fakültesi, Ermenek MYO Spor Salonu için Zemin Etüt ve Raporlama Hizmeti Alım İşİ	27.995,50
Enerji Verimliliği Laboratuvarı İçin Statik Proje Çizimi Hizmeti Alım İşİ	2.360,00
TOPLAM	58.675,50

Çizelge 24: 2019H03-3471 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP) Harcamalarının Detayı

3.2. 2019H03-3472 Muhtelif İşler Projesi (KOP)

Muhtelif İşler Projesi (KOP) için 2019 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.807.000,00 TL olup likit karşılığı 3.024.500,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 7.831.500,00 TL, toplam harcama ise 7.675.690,48 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019H03-3472 nolu Muhtelif İşler Projesine (KOP) ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Büyük Onarım, Donanım Onarımı, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı TL	7.831.500,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	4.807.000,00
Eklenen TL ⁷	3.024.500,00
Toplam Ödenek TL	7.831.500,00
Harcama TL	7.675.690,48
Kalan Ödenek TL	155.809,52
Gerçekleşme Oranı %	98,01

Çizelge 25: 2019H03-3472 Nolu Muhtelif İşler Projesi (KOP)

⁷ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Büro Mefruşat Alımları	1.266	98.662,51
Okul Mefruşatı Alımları	1.241	377.800,22
Büro Makineleri Alımları	49	125.777,01
Bilgisayarlar ve Sunucu Alımları	79	229.958,72
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	46	127.600,62
Laboratuvar Cihazı Alımları	165	2.223.489,70
Diğer Makine Teçhizat Alımları	26	733.327,18
Tıbbi Cihaz Alımları	1	67.025,80
Diğer Mefruşat Alımları	10	35.791,24
Atölye Gereçleri Alımı	109	633.520,76
Ağaç Ürünleri	2	11.153,36
Büro Mobilyaları	436	1.075.904,40
Sunucu Sanallaştırma Lisans Alımı Ödemesi	1	26.550,00
İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Alımı Ödemesi	1	5.000,00
Arvento Güncelleme Yazılımı	10	2.273,62
BİLTEM İçin TSE Belgesi (TS12300 TS2383 TS7800)	1	108,00
NMKL Method No.161 Handling Fee Standart Alımı	1	421,65
Öğrenci İşleri İçin TEGSOFT 2-INBOUND AGENT Lisansı Alımı (Çağrı Merkezi Çözümü Programı)	1	34.220,00
Yedekleme Yazılımı	6	122.382,33
Yedek Parça Alımı	-	3.425,86
Araç Bakım Onarım İçin Yedek Parça Alımı	30	23.410,02
Yazıcı ve Fotokopi Makinesi Malzemesi Alımı	20	8.988,06
Üniversite Giriş-Çıkış Kapısı Otomatik Geçiş Sisteminde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	7	1.165,71
Tel Örgü (410 Metre)	1	16.004,10
Kütüphanede Kullanılmakta Olan Temizlik Makinası İçin Akü Alımı	4	11.800,00
TOPLAM	3.513	5.995.760,87

Çizelge 26: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Bilimsel ve Teknolojik Arařtırmalar Uygulama ve Arařtırma Merkezi tarafından Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler ařağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
HPLC Bakım Onarım Ödemesi	1	17.700,00
Çay Kazanı Onarım İři	1	259,60
Saf Su Yedek Parça (Valf) Alımı	1	1.298,00
Tg-Dta Bakım Onarım Servis Bedeli	1	54.280,00
XRD Sistemi Bakım Onarım Hizmeti	1	8.260,00
Bilgisayar Onarımı	1	540,00
V Tipi Kayıř, Yağ Filtresi Alımı	2	45,00
TOPLAM	8	82.382,60

Çizelge 27: Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler (BİLTEM)

Öğrenci İřleri Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler ařağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Fotokopi Makinesi Parça Değıřimi ve Bakımı	4	10.999,96
TOPLAM	4	10.999,96

Çizelge 28: Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler (Öğrenci İřleri Daire Başkanlığı)

Yapı İřleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İřler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan iřler ařağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İřler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yunus Emre, Ermenek ve Kazım Karabekir Yerleřkelerinde Orta ve Alçak Gerilim Tesislerinin Bakım Onarımı ve İřletme Sorumluluğı	22	9.680,00
Yunus Emre, Ermenek ve Kazım Karabekir Yerleřkelerinde Kullanılmak Üzere Mal ve Malzeme Alım İři	2	45.538,68
Derin Kuyu Besleme Kablosu Alım İři (292 Metre)	1	35.093,44
Su ve Tesisat Malzemesi Alımı	1.291	30.703,60
Kapalı Spor Salonu Havalandırma Sistemi Bakım Onarımı	1	590.675,50
Eğitim Ve Hizmet Binaları Büyük Bakım Onarımı	1	305.637,60
Asansörler İçin Yeřil Etiket Alımı	34	34.338,00

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Demir Malzeme Alımı (7 Kalem)	7	6.844,20
Su Yalıtımı Ürünleri Alımı (7 Kalem)	7	288.362,5
41 Adet Asansörün Yıllık Bakım Onarımı	41	25.955,28
Orta Refüj ve Kavşak Tadilatı Bakım Onarımı	1	35.105,00
Hizmet Binaları ve Peyzajda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	3.618	35.164,00
Heykel Kaidesi Mekanik Kaplama ve Çevre Düzenlemesi	1	31.270,00
Çevre Düzenlemesi Kesin Hesabı	1	112.179,25
TOPLAM	5.028	1.586.547,05

Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)



Resim 1: Eğitim Fakültesi Okul Mefruşatı



Resim 2: Hassas Lazer Kesim Cihazı



Resim 3: Fotoğraf Makinası



Resim 4: EGM Ölçüm Cihazı



Resim 5: Yol Süpürme Aracı



Resim 6: İçten Yanmalı Motor Test Sistemi



Resim 7: Laboratuvar Cihazları



Resim 8: Akıllı Tahta

3.3. 2019H03-3473 Yayın Alımı Projesi (KOP)

Yayın Alımı Projesi (KOP) için 2019 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup yıl içinde revizyon yapılmamıştır. Toplam harcama ise 476.005,08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 95,20 olarak gerçekleşmiştir.

2019H03-3473 nolu Yayın Alımı Projesine (KOP) ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2019
Proje Tutarı TL	500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	500.000,00
Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	500.000,00
Harcama TL	476.005,08
Kalan Ödenek TL	23.994,92
Gerçekleşme Oranı %	95,20

Çizelge 30: 2019H03-3473 Nolu Yayın Alımı Projesi

2019H03-3473 nolu Yayın Alımı Projesi (KOP) kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Tümer ALTAŞ Veri Tabanı Alımı	10.000,00
İdeal Kültür Yayıncılık Reklam Ve Organizasyon Süreli Yayın Veri Tabanı	16.148,30
Ebsco Ebook Academic Collection Elektronik Veri Tabanı	90.906,95
Türkiye Atıf Dizini Veri Tabanı	12.050,16
SOBİAD Veri Tabanı	7.150,00
Ebook Central Academic Complete Elektronik Veri Tabanı	43.788,92

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Elektronik Veri Tabanı Alımı (ACS Web Editions Dergileri Ve ACS Dergi Arşivi)	57.823,53
Cambridge Elektronik Veri Tabanı	31.766,24
Lexpera Hukuk Veri Tabanı	2.360,00
Springer Nature Customer Service Center'dan E-Kitap Alımı (3.425 Adet)	144.234,59
Basılı Yayın Alımı (2.977 adet)	59.776,39
TOPLAM	476.005,08

Çizelge 31: 2019H03-3473 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **Tümer ALTAŞ Veritabanı**

Tümer Altaş veritabanında, e-YDS/YDS, PTE, IELTS ve TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla hızlı kelime öğrenme, gramer videoları, cümle çeviri videoları ve paragraf çeviri videoları gibi 10.000'e yakın indirilebilir içerik yer almaktadır.

- **İdeal Online Süreli Yayın Veritabanı**

İdeonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır. İdeal online içerisinde akademik dergiler, popüler dergiler, ideal tıp kitapları, konferans & armağanlar ve ideal ekitap olmak üzere 5 ayrı veri tabanı vardır.

İdeonline veri tabanlarının amacı; Türkçe bilgi kaynaklarını e-ortama taşımak, Türkçe bilgi kaynaklarına 7/24 erişim sağlamak, Türkçe içeriğe modern veri tabanı sistemi ve cihazlarla erişim sağlamak, Türkçe içeriği dünyanın kullanımına sunmak ve daha fazla Türkçe kaynak yayınlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır.

- **Ebsco eBook Academic Collection Veritabanı**

Kullanıcı sınırı bulundurmadan 169.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO eBookAcademicCollection hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanıdır. EBSCO eBookAcademicCollection’ın sunduğu kapsamlı içerik ve yüksek ilgililik sıralaması, araştırmacıların ihtiyaçlarına en uygun kaynaklara en hızlı şekilde erişmelerini sağlamaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kullanımı kolay yönetim araçları ile akademik kütüphaneler için vazgeçilmez bir kaynak olan koleksiyon, içerdiği tüm e-kitapları sınırsız kullanıcı erişimi ile sunmaktadır ve yeni kitaplar ek ücret ödenmeden koleksiyona düzenli olarak eklenmektedir.

İçeriğinde Satın alma değeri 26 milyon dolara yakın olan 169.000’den fazla disiplinler arası akademik e-kitap, Harvard University Press, Cambridge University Press, MIT Press, University of California Press gibi en önemli 157 üniversite yayınevi tarafından yayımlanan 64.000’den fazla e-kitap, Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wileygibi önde gelen yayıncılara ait binlerce e-kitap,

CHOICE Dergisi'nin Seçkin Akademik Başlıklar Listesi'nde yer alan 1.300'den fazla e-kitap yer almaktadır.

- **Türkiye Atıf Dizini Online Veritabanı**

Atıf Dizini, Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanında 2008'den günümüze yayımlanan 410 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlayan, aynı zamanda tüm bu makalelere tam metin erişilebilen tek ulusal atıf tarama dizinidir. Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı tüm dergilerin makaleleri, sağlık bilimleri alanında (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri branşları) yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir. Kayıtlı tüm dergiler, Türkiye'de en az iki sayı düzenli olarak yayımlanan hakemli (danışman değerlendirme sistemi olan) dergilerdir.

- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir.

Sobiad; hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır. Ayrıca üniversitelerin işbirliği içerisinde olduğu diğer üniversiteler, öğretim üyelerinin yayın yaptığı dergiler, birlikte yayın yaptığı akademisyenlerin bilgisi paylaşılmaktadır. Ayrıca kütüphane yetkilisi kullanım istatistiklerine istediği zaman ulaşabilmektedir.

Sobiad, Türkiye merkezli sosyal bilgiler dergilerini taramakla birlikte; birçok yabancı dergi SOBİAD'da taranmak için başvurusunu yapmış bulunmaktadır.

- **Ebook Central Academic Complete**

Ebook Central 206.000'nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir.

Basit ara yüzü sayesinde kullanıcıların kolaylıkla keşif yapmalarına imkan tanır.

Kitaplarınızı offline olarak da okumanıza imkan tanımak amacıyla kitapları laptop, desktop, mobil cihazlar (IOS, Android cep telefonları ve tabletler) üzerine indirmenize imkan tanır.

Sahip olacağınız kişisel kitaplık sayesinde istediğiniz kitapları üzerlerinde aldığınız notlar ve vurgulamalar ile birlikte klasörler içinde saklamanıza imkan tanır. Bu klasörleri arkadaşlarınıza email yoluyla iletmenizi mümkün kılar. Bir bakıma araştırmanızın arşivi görevini görür.

Araştırma yaparken bir çok farklı seçenekten yararlanmanıza imkan tanır.

Kitap üzerinden herhangi bir bölümü kopyalamak istediğinizde otomatik olarak atıf bilgisini de bölüm sonuna ekler. Böylece istediğiniz platforma kopyala/yapıştır seçeneği ile aktarmanıza imkan tanır.

Platformun ara yüzü Türkçe olarak kullanılmaya uygundur.

- **American Chemical Society (ACS) Veri Tabanı**

American Chemical Society; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi vb. konuları kapsayan 50'den fazla dergiye ilk sayılarından günümüze erişim vermektedir.

- **Cambridge Journals Online Veri Tabanı**

Üniversitemizce Cambridge Journals Online Veri Tabanına Abone Olunarak Erişime Açılmıştır. Sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri, eczacılık, din, müzik, dil, teknoloji, mühendislik ve mimarlık alanında tam metin erişimli makale sağlayan bir veri tabanıdır.

- **Lexpera Hukuk Veri Tabanı**

İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve multi-platform erişim imkânı ile LEXPERA uygulamacılara, akademisyenlere ve öğrencilere yenilikçi çözümler sunmaktadır. Güncel mevzuatı, içtihatı, tam metin hukuk kitaplarını, makaleleri, kanun yorumlarını, bibliyografik bilgileri, sözleşme örneklerini ve genel internet arama sonuçlarını kapsamaktadır.

3.4. 2009H03-1056 Kampüs Altyapısı Projesi (KOP)

Kampüs Altyapısı Projesi (KOP) için 2019 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.101.000,00 TL olup finansman fazlasından likit karşılığı 7.491.456,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 11.592.456,00 TL olup toplam harcama 11.271.932,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 97,24 olarak gerçekleşmiştir. 2009H03-1056 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	64.544.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	4.101.000,00
Eklenen TL ⁸	7.491.456,00
Toplam Ödenek TL	11.592.456,00
Harcama TL	11.271.932,79
Kalan Ödenek TL	320.523,21
Gerçekleşme Oranı (%)	97,24

Çizelge 32: 2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi (KOP)

2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
İkinci Etap Galeri Hattı	5.616.473,75
Engelsiz Üniversite	134.610,39
İkinci Etap Yol Yapım İş	5.520.848,65
TOPLAM	11.271.932,79

Çizelge 33: 2009H03-1056 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı

⁸ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

3.4.1. İKİNCİ ETAP GALERİ HATTI

Sözleşme bedeli 8.083.000,00 TL olan, 07/09/2018 tarihinde sözleşmesi yapılan iş için mevcut ısı merkezi kazan dairesi kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle kazan dairesinin genişletilmesi, 1. Etap ile 2. Etap kazanlarının arasında oluşacak yüksek basınç farkının ortaya çıkaracağı riskten dolayı hatların ayrıştırılması için toplam 560.011,48 TL iş artışına gidilmiş ve toplam sözleşme bedeli 8.643.011,48 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu işin 20/09/2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 1.505 m uzunluğunda ve 4.064 m² kapalı alana sahip olan galeri yerleşkemiz 2. Etap binalarımıza entegre edilmiştir. Binalarımızın ısınma ihtiyacı için merkezi ısı boruları, fiber alt yapısı, elektrik enerji kabloları ve peyzaj sulama boruları söz konusu galeri içerisinde dağıtımı yapılmaktadır.

İkinci Etap Galerî Hattı yapım işine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Emrah KONUKSEVEN (Konukseven Müh.)
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İkinci Etap Galerî Hattı Yapım İşî
Proje Numarası	2009H03-1056
İhale Tarihi	20.07.2018
Sözleşme Tarihi	07.09.2018
Sözleşme Bedeli TL	8.083.000,00
Yer Teslim Tarihi	11.09.2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	11.09.2018
İşin Bitim Tarihi	20.09.2019
Projeyle İlgili Revizyonlar	13.05.2019 tarih ve 13449 sayılı olur ile 478.591,48 TL İş Artışı ve 90 gün süre uzatımı 05.08.2019 tarih ve 21515 sayılı olur ile 81.420,00 TL İş Artışı ve 35 gün süre uzatımı
Revizyon Nedenleri	Mevcut ısı merkezi kazan dairesi kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle kazan dairesinin genişletilmesi, 1. Etap ile 2. Etap kazanlarının arasında oluşacak yüksek basınç farkının ortaya çıkaracağı riskten dolayı hatların ayrıştırılması için proje revizesi gerekmiştir.
2019 Yılı Harcama Tutarı	5.616.473,75
Toplam Harcama Tutarı	8.616.030,19
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 34: 500 Kw PV Güneş Enerji Santrali Trafosu ve İletim Hattı İkmal Yapım İşî



Resim 9: İkinci Etap Galeri Hattı Yapım İşi-I



Resim 10: İkinci Etap Galeri Hattı Yapım İşi-II

3.4.2. İKİNCİ ETAP YOL YAPIM İŞİ

Üniversitemizin 2. etap yerleşkesinde hizmete girmiş olan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi Binası ile Ahmet-Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yapımına başlanan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve ilerleyen zamanlarda yapılması düşünülen eğitim ve hizmet binalarına ulaşımın sağlanması amacıyla 2. Etap yol projesi çalışmaları 2018 yılında başlamış olup 24.06.2019 tarihinde ihaleye çıkılmış ve 15.08.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İkinci etap yol yapım işi tamamlandığında 1.120 m boyunda ve 31,7 m genişliğinde olacaktır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Sedat ULUTAŞ
Sözleşmenin Konusu	İkinci Etap Yol Yapım İşİ
Proje Numarası	2009H03-1056
İhale Tarihi	24.06.2019
Sözleşme Tarihi	15.08.2019
Sözleşme Bedeli TL	7.313.640,00
Projeyle İlgili Revizyonlar	-
Revizyon Nedenleri	-
Yer Teslim Tarihi	22.08.2019
Fiilen İşe Başlama Tarihi	22.08.2019
İşin Bitim Tarihi	26.06.2020
2019 Yılı Harcama Tutarı	5.520.848,65
Toplam Harcama Tutarı	5.520.848,65
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	80
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor.

Çizelge 35: İkinci Etap Yol Yapım işi



Resim 11: İkinci Etap Yol Yapım İşİ

3.5. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP)

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) için 2019 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 4.342.000,00 TL olup 15.890.743,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, toplam ödenek 20.232.743,00 TL olmuştur. Ermenek MYO Uygulama Oteli için izin çıkmamasından dolayı 5.000.000,00 TL ödenek tenkis edilmiştir. Projenin detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Eğitim (20.000 m ²), Uygulama Oteli (4.821 m ²)
Alt Projeler	Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kazım Karabekir MYO Çok Amaçlı Salon, Ermenek MYO Uygulama Oteli
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2021
Proje Tutarı TL	50.463.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	4.342.000,00
Eklenen TL ⁹	15.890.743,00
Toplam Ödenek TL	20.232.743,00
Harcama TL	9.752.263,48
Kalan Ödenek	5.480.479,52
Gerçekleşme Oranı (%)	48,20

Çizelge 36: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2009H03-1057 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Eğitim Fakültesi Binası Yapım İşİ	4.949.446,65
Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İşİ	1.653.056,36
Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.149.760,47
Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m ²)	0,00
TOPLAM	9.752.263,48

Çizelge 37: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin (KOP) Harcamalarının Detayı

⁹ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

3.5.1. EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ

Sözleşme bedeli 11.984.080,00 olan iş için yapı detaylarında ortaya çıkan teknik zorunluluk ve yönetsel tasarruf sağlayacak bazı değişiklikler ile Fakülte bünyesinde yeni açılan bölümlerin ihtiyaç duyduğu ve Fakülte Dekanlığı tarafından talep edilen bazı alanların (müzik odası, drama odası, özel laboratuvar vb.) oluşturulması için 365.375,03 TL iş artışına gidilmiş ve toplam sözleşme bedeli 12.349.455,03 TL'ye ulaşmıştır. 30/01/2018 tarihinde sözleşmesi yapılan söz konusu işin 16/08/2019 tarihinde geçici kabulü yapılmış ve hizmete açılmıştır. 8.000 m² alana sahip olan fakülte binası öğrenci ve öğretim üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır.

Eğitim Fakültesi Binası yapım işine ait detaylar aşağıdaki çizelgede almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Ayşe ALTUNÖZ-Emrah KONUKSEVEN İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	Eğitim Fakültesi Binası Yapım İş
Proje Numarası	2009H03-1057
İhale Tarihi	10.11.2017
Sözleşme Tarihi	30.01.2018
Sözleşme Bedeli TL	11.984.080,00
Yer Teslim Tarihi	08.02.2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	08.02.2018
İşin Bitim Tarihi	16.08.2019
Projeye İlgili Revizyonlar	18.02.2019 tarih ve 5108 sayılı olur ile 365.375,03 TL İş Artışı ve 35 gün süre uzatımı
Revizyon Nedenleri	Yapı detaylarında ortaya çıkan teknik zorunluluk ve yönetsel tasarruf sağlayacak bazı değişiklikler ile Fakülte bünyesinde yeni açılan bölümlerin ihtiyaç duyduğu ve Fakülte Dekanlığı tarafından talep edilen bazı alanların (müzik odası, drama odası, özel laboratuvar vb.) oluşturulması için proje revizesi yapılmıştır.
2019 Yılı Harcama Tutarı TL	4.949.446,65
Toplam Harcama Tutarı TL	12.312.352,33
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Geçici kabul yapıldı.

Çizelge 38: Eğitim Fakültesi Binası Yapım İş



Resim 12: Eğitim Fakültesi-I



Resim 13: Eğitim Fakültesi-II

3.5.2. KAZIM KARABEKİR MYO 500 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI SALON

Kazım Karabekir MYO öğrenci sayısının hızla artması ve okulun sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olan Kazım Karabekir Meslek Yüksekokuluna ilave 500 kişilik çok amaçlı salon yapılması ile öğrencilerin ve meslek yüksekokulunun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. Sözleşme bedeli 3.477.460,00 TL olan iş için belediye altyapısı ile proje kotunun çakışması, ihtiyaç oldukça kısa süreli kullanımı öngörülen salonun kazan dairesi ve katı yakıt kullanılacak ısıtma sisteminin yerine daha etkin ve tasarruf sağlayacak elektrikli ısıtma sistemi kullanılabilmesi için 307.177,69 TL iş artışına gidilmiş ve toplam sözleşme bedeli 3.784.637,69 TL olmuştur. 21/12/2017 tarihinde sözleşmesi yapılan söz konusu işin 19/03/2019 tarihinde geçici kabulü yapılmış ve hizmete açılmıştır. 1.500 m² alana ve 500 kişi seyirci kapasitesine sahip olan Çok Amaçlı Salon, Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde hem Kazım Karabekir Yerleşkesindeki öğrencilerimize hem de ilçe halkına hizmet verecektir.

Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon yapım işine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Koçoğlu Mek. Tes. İnş. Çevre Tekn. San. ve Tic. Ltd. Şti
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İş
Proje Numarası	2009H03-1057
İhale Tarihi	28.09.2017
Sözleşme Tarihi	21.12.2017
Sözleşme Bedeli TL	3.477.460,00
Yer Teslim Tarihi	25.12.2017
Fiilen İşe Başlama Tarihi	25.12.2017
İşin Bitim Tarihi	19.03.2019
Projeyle İlgili Revizyonlar	09.10.2018 tarih ve 10400 sayılı olur ile 60 günlük süre uzatımı, 02.02.2019 tarih ve 3478 sayılı olur ile 307.177,69 İş Artışı ve 40 Gün Süre Uzatımı
Revizyon Nedenleri	Belediye altyapısı ile proje kotunun çakışması, İhtiyaç oldukça kısa süreli kullanımı öngörülen salonun kazan dairesi ve katı yakıt kullanılacak ısıtma sisteminin yerine daha etkin ve tasarruf sağlayacak elektrikli ısıtma sistemi kullanılabilmesi için proje revizesi yapılmıştır.
2019 Yılı Harcama Tutarı TL	1.653.056,36
Toplam Harcama Tutarı TL	3.784.637,69
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatin Durumu	Geçici kabulü yapıldı.

Çizelge 39: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon Yapım İş



Resim 14: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon-I



Resim 15: Kazım Karabekir MYO 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon-II

3.5.3. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılan bina yetersiz geldiğinden öğrencilerimize daha iyi eğitim verebilmek için yeni hizmet binası yapımına başlanmıştır. Sözleşme bedeli 15.564.200,00 TL olan, 05/03/2018 tarihinde sözleşmesi yapılan söz konusu iş 25/08/2019 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır ve 10.500 m² alana sahiptir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi yapım işine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Hayma İnş Taah. Mad. Nak. Hyv. Pet. Ene. Yol Yapım San. Tic. Aş.-Özcan Çelik Adi Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası Yapım İş
Proje Numarası	2009H03-1057
İhale Tarihi	10.01.2018
Sözleşme Tarihi	05.03.2018
Sözleşme Bedeli TL	15.564.200,00
Yer Teslim Tarihi	14.03.2018
Fiilen İşe Başlama Tarihi	14.03.2018
İşin Bitim Tarihi	25.08.2019
Projeye İlgili Revizyonlar	26.07.2019 tarih ve 20660 sayılı olur ile 30 gün süre uzatımı
Revizyon Nedenleri	Konferans salonu oturma grubu imalat değişikliği için proje revize edilmiştir.
2019 Yılı Harcama Tutarı TL	3.149.760,47
Toplam Harcama Tutarı TL	15.549.170,14
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Geçici kabul yapıldı.

Çizelge 40: Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapım İş



Resim 16: Sağlık Bilimleri Fakültesi-I



Resim 17: Sağlık Bilimleri Fakültesi-II

3.5.4. ERMENEK MYO UYGULAMA OTELİ

Ermenek Barajının tamamlanması ile ilçenin turizmde cazibe merkezi olacağı düşünülmektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na bağlı Turizm Rehberliği Bölümü için yapılması düşünülen Ermenek MYO Uygulama Otelinin, bodrum+zemin+2 kat olmak üzere 8.000 m² alana sahip olması planlanmaktadır.

Söz konusu proje için 2019 yılında finansman fazlasından 5.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından proje askıya alındığından ve ödenek ekleme izni verilmediğinden 5.000.000,00 TL tenkis edilmiştir.



Resim 18: Ermenek MYO Uygulama Oteli Proje Fotoğrafları

3.6. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP)

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP) için 2019 yılı bütçemize ayrılan ödenek 50.000,00 TL olup yıl içerisinde 8.300.000,00 TL tutarında ödenek eklemesi yapılmıştır. Eklemeler sonucunda 2019 yılı toplam ödeneği 8.350.000,00 TL olmuştur. Stadyum ve Ermenek MYO kapalı spor salonu için izin çıkmadığı için 8.300.000,00 TL tenkis edilmiştir. Proje kapsamında 2019 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır. 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine (KOP) ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Makine-Tec̢hizat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), (Stadyum 5.000 seyirci kapasitesi)
Alt Projeler	Bakım Onarım, Makine-Tec̢hizat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi), (Stadyum 5.000 seyirci kapasitesi)
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	19.546.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	50.000,00
Eklenen TL ¹⁰	8.300.000,00
Toplam Ödenek TL	8.350.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek	8.350.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0

Çizelge 41: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (KOP)

¹⁰ Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

3.6.1. STADYUM (TRİBÜN)

Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine daha iyi eğitim vermek ve Üniversitemizin üniversiteler arası spor müsabakalarında daha aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla tam olimpik atletizm pisti 2016 Aralık ayı itibari ile tamamlanmıştır. 5.000 kişilik üstü kapalı seyirci tribünü yapılmasıyla stadyum ihtiyacı tamamlanacaktır.

Söz konusu proje için 2019 yılında finansman fazlasından 5.550.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından proje askıya alındığından ve ödenek ekleme izni verilmediğinden 5.550.000,00 TL tenkis edilmiştir.



Resim 19: 5.000 Kişilik Üstü Kapalı Seyirci Tribünü Proje Fotoğrafl

3.6.2. ERMENEK MYO KAPALI SPOR SALONU

Üniversitemizin Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sosyal tesis kazandırmak ve Taşeli Bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yapımı planlanan Ermenek MYO Kapalı Spor Salonu projelendirilmiştir.

Söz konusu proje için 2019 yılında finansman fazlasından 2.750.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından proje askıya alındığından ve ödenek ekleme izni verilmediğinden 2.750.000,00 TL tenkis edilmiştir.

4. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi programları arasında düzenleme yapılmalıdır.
3. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
4. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.
5. Proje ve ihale süreçlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.
6. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.

