



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

# 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMAN



**Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.**

*K. Atatürk*

---

---

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| İÇİNDEKİLER .....                                                                | i   |
| ÇİZELGELER .....                                                                 | iii |
| 1. YÖNETİCİ ÖZETİ .....                                                          | v   |
| 2. GENEL DEĞERLENDİRME .....                                                     | 7   |
| 2.1.    UZGÖRÜŞÜMÜZ .....                                                        | 7   |
| 2.2.    ÖZGÖREVİMİZ .....                                                        | 7   |
| 2.3.    TEMEL DEĞERLERİMİZ .....                                                 | 7   |
| 2.4.    TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER .....                                             | 8   |
| 2.5.    YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....                                  | 11  |
| 2.6.    MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ .....                                           | 12  |
| 2.7.    2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI ..... | 18  |
| 2.7.1.    Hedeflenen .....                                                       | 18  |
| 2.7.2.    Gerçekleşen .....                                                      | 18  |
| 2.7.3.    Devam Edenler .....                                                    | 19  |
| 2.8.    2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....                                     | 20  |
| 2.8.1.    Genel Yatırım Uygulama Durumu .....                                    | 20  |
| 2.8.2.    Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri .....                             | 31  |
| 2.8.3.    Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar .....              | 35  |
| 3. PROJE UYGULAMALARI .....                                                      | 36  |
| 3.1. 2023H03-212688 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ .....                        | 36  |
| 3.2. 2023H03-212694 MUHTELİF İŞLER PROJESİ .....                                 | 36  |
| 3.3. 2023I00-191384 SAĞLIK-MUHTELİF İŞLER PROJESİ .....                          | 48  |
| 3.4. 2023H03-212692 YAYIN ALIMI PROJESİ .....                                    | 52  |
| 3.5. 2023H03-212700 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ .....                               | 57  |
| 3.5.1.    AltYapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ .....                           | 58  |
| 3.5.2.    Engelsiz Üniversite .....                                              | 60  |
| 3.6. 2009H03-1057 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ .....                      | 60  |
| 3.6.1.    Tıp Fakültesi Morfoloji Binası .....                                   | 60  |
| 3.6.2.    Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli .....                        | 63  |
| 3.7. 2010H05-1269 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ .....                    | 64  |
| 3.7.1.    Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu .....                                  | 64  |
| 3.7.2.    Spor Tesislerinin Bakım Onarımı .....                                  | 65  |
| 3.8. 2023K12-214484 İHTİSASLAŞMA PROJESİ .....                                   | 66  |
| 4. STRATEJİK PLAN YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ .....                                | 68  |
| 5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR .....                                                | 71  |
| 6. ÖNERİLER .....                                                                | 73  |



## ÇİZELGELER

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar .....                                     | 8  |
| Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri .....                         | 8  |
| Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler .....     | 9  |
| Çizelge 4: Farklılaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler.....                      | 9  |
| Çizelge 5: Kurumsallaşma Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefler .....                   | 10 |
| Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları .....                         | 11 |
| Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m <sup>2</sup> ) .....                          | 12 |
| Çizelge 8: Taşınmazların Genel Dağılımı (m <sup>2</sup> ).....                     | 13 |
| Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı .....                                        | 14 |
| Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m <sup>2</sup> ) .....       | 17 |
| Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı .....             | 20 |
| Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey) ..... | 22 |
| Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) .....                    | 24 |
| Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) .....              | 25 |
| Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) .....  | 26 |
| Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey) .....               | 27 |
| Çizelge 17: Geyrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) .....    | 29 |
| Çizelge 18: Diğer Sermaye Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) .....               | 30 |
| Çizelge 19: Revizyon (2023H03-212688 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi).....    | 31 |
| Çizelge 20: Revizyon (2023H03-212694 Nolu Muhtelif İşler).....                     | 31 |
| Çizelge 21: Revizyon (2023H03-212692 Nolu Yayın Alımı).....                        | 32 |
| Çizelge 22: Revizyon (2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı) .....                  | 32 |
| Çizelge 23: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler).....               | 33 |
| Çizelge 24: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri) .....            | 33 |
| Çizelge 25: Revizyon (2023I00-191384 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler).....              | 34 |
| Çizelge 26: Revizyon (2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi) .....              | 34 |
| Çizelge 27: 2023H03-212688 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....               | 36 |
| Çizelge 28: 2023H03-212694 Nolu Muhtelif İşler Projesi .....                       | 37 |

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....      | 41 |
| Çizelge 30: Tüm Vücut Tahnitli 2 Adet Kadavra İhale Bilgileri.....                                                                | 42 |
| Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM) .....                                   | 42 |
| Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....    | 43 |
| Çizelge 33: Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşİ İhale Bilgileri.....                                                                    | 44 |
| Çizelge 34: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Diğer Birimler) .....                           | 43 |
| Çizelge 35: 2023I00-191384 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi.....                                                                | 48 |
| Çizelge 36: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler .....                                     | 49 |
| Çizelge 37: 2023H03-212692 Nolu Yayın Alımı Projesi.....                                                                          | 52 |
| Çizelge 38: 2023H03-212692 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı .....                                                   | 53 |
| Çizelge 39: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....                                                                     | 57 |
| Çizelge 40: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı .....                                           | 58 |
| Çizelge 41: Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ İhale Bilgileri.....                                                           | 58 |
| Çizelge 42: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Spor Tesislerinin Bakım Onarımı) Harcamalarının Detayı ..... | 65 |
| Çizelge 43: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi .....                                                                        | 70 |
| Çizelge 44: Proje Bazında Harcamalar .....                                                                                        | 72 |

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ



2023 yılı Yatırım Programı kapsamında, eğitim-öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikalar önceliklendirilmiştir. Buna yönelik olarak gerekli ödenekler Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları başta olmak üzere makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları ile öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha estetik ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

2023 yılı içerisinde altyapı ve çevre düzenlemesi işleri tamamlanmış, bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş, peyzaj ve çevre düzenleme işleri Üniversitemiz personeli tarafından yapılmıştır. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlanmıştır.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ilkesi ile 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Prof. Dr. Mehmet GAVGALI**  
**Rektör**



## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1. Uzgörüřümüz

Dinamik, yeteneğini keřfeden, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bireyler yetiřtiren; evrensel ölçütleri karřılamamanın yanı sıra güncel sıralama ölçütlerinde yer alan saygın üniversitelerden biri olmak.

### 2.2. Özgörevimiz

Üniversitemiz öğrenmeyi ve arařtırmayı bilen mesleki açıdan donanımlı ve nitelikli bireyler yetiřtirmeyi, evrensel bilgiler üreten bir kurum olmayı, ihtisaslařma alanlarında bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik çözümler üretmeyi görev edinmiřtir.

### 2.3. Temel Değerlerimiz

- ✓ Tarafsızlık ve güvenilirlik,
- ✓ Bilimsellik,
- ✓ Öğrenci merkezlilik,
- ✓ Yenilikçilik,
- ✓ Türk dilinin doğru kullanılması ve yaygınlařtırılmasına karřı duyarlılık,
- ✓ Evrensellik,
- ✓ İnsana ve doğaya saygılı olma,
- ✓ Şehir, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık,
- ✓ Şeffaflık,
- ✓ Etik değerlere baėlılık,
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik.

## 2.4. Temel Amaç ve Hedefler

| EKSENLER                                  | AMAÇLAR                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EĞİTİM EKSENİ</b>                      | Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.                                                                                                                                                       |
| <b>BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN EKSENİ</b> | Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak. |
| <b>FARKLILAŞMA EKSENİ</b>                 | Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.                                                                                                                             |
| <b>KURUMSALLAŞMA EKSENİ</b>               | Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.                                                                               |

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar

| AMAÇ 1                                                                                                              | HEDEFLER                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak. | Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliliğini artırmak.                                                                                           |
|                                                                                                                     | Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek. |
|                                                                                                                     | Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.                                                                    |
|                                                                                                                     | Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.                                                                                                                                |
|                                                                                                                     | Teoriye uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.                                                                                                                                    |

Çizelge 2: Eğitim Ekseni Stratejik Amaç ve Hedefleri

| AMAÇ 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | HEDEFLER                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.</p> | Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.                                          |

Çizelge 3: Bilimsel Araştırma ve Yayın Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

| AMAÇ 3                                                                                                                                            | HEDEFLER                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Türk dili, gıda, tarım ve temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.</p> | Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                   | Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.                         |
|                                                                                                                                                   | Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.                  |
|                                                                                                                                                   | Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.          |
|                                                                                                                                                   | TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak. |

Çizelge 4: Farklılaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

| AMAÇ 4                                                                                                                                                                                             | HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.</p> | <p>Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.</p>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                    | <p>Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.</p>                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    | <p>Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.</p>               |
|                                                                                                                                                                                                    | <p>Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.</p> |
|                                                                                                                                                                                                    | <p>Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.</p>                                                                            |

Çizelge 5: Kurumsallaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler

## 2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 70.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 105.500.000,00 TL olmuştur. Projelerin sektörlere göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Sektör                          | Proje Adı                       | Proje Tutarı          | Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama | 2023 Yılı Program Ödeneği | 2023 Yılı Revizeli Ödenek | 2023 Yılı Harcama    |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Eğitim-Yükseköğretim            | Derslik ve Merkezi Birimler     | 300.222.000,00        | 0,00                                | 30.000.000,00             | 30.000.000,00             | 0,00                 |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Kampüs Altyapısı                | 32.000.000,00         | 0,00                                | 5.502.000,00              | 7.000.000,00              | 6.079.115,92         |
| Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor    | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 10.002.000,00         | 0,00                                | 2.000.000,00              | 2.000.000,00              | 466.070,00           |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 400.000,00            | 0,00                                | 400.000,00                | 400.000,00                | 0,00                 |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Muhtelif İşler                  | 43.300.000,00         | 0,00                                | 13.098.000,00             | 43.300.000,00             | 35.185.028,23        |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Yayın Alımı                     | 1.300.000,00          | 0,00                                | 1.000.000,00              | 1.300.000,00              | 1.273.379,32         |
| Sağlık-Sağlık                   | Muhtelif İşler Projesi          | 11.500.000,00         | 0,00                                | 8.000.000,00              | 11.500.000,00             | 11.499.591,30        |
| DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma | İhtisaslaşma Projesi            | 30.000.000            | 0,00                                | 10.000.000,00             | 10.000.000,00             | 10.000.000,00        |
| <b>TOPLAM</b>                   |                                 | <b>428.724.000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>105.500.000,00</b>     | <b>64.503.184,77</b> |


Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

## 2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 95,54'ü Yunus Emre Yerleşkesi, % 3,04'ü Ermenek Yerleşkesi ve % 1,42'si da Kazım Karabekir Yerleşkesinde yer almaktadır.

| Yerleşke Adı               | Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı |                     |          | Toplam              |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
|                            | Üniversite                              | Maliye Hazine       | Diğer    |                     |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | -                                       | 1.607.650,89        | -        | 1.607.650,89        |
| Ermenek Yerleşkesi         | 51.581,75                               | -                   | -        | 51.581,75           |
| Kazım Karabekir Yerleşkesi | -                                       | 23.938,98           | -        | 23.938,98           |
| <b>Genel Toplam</b>        | <b>51.581,75</b>                        | <b>1.631.589,87</b> | <b>-</b> | <b>1.683.171,62</b> |

Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m<sup>2</sup>)

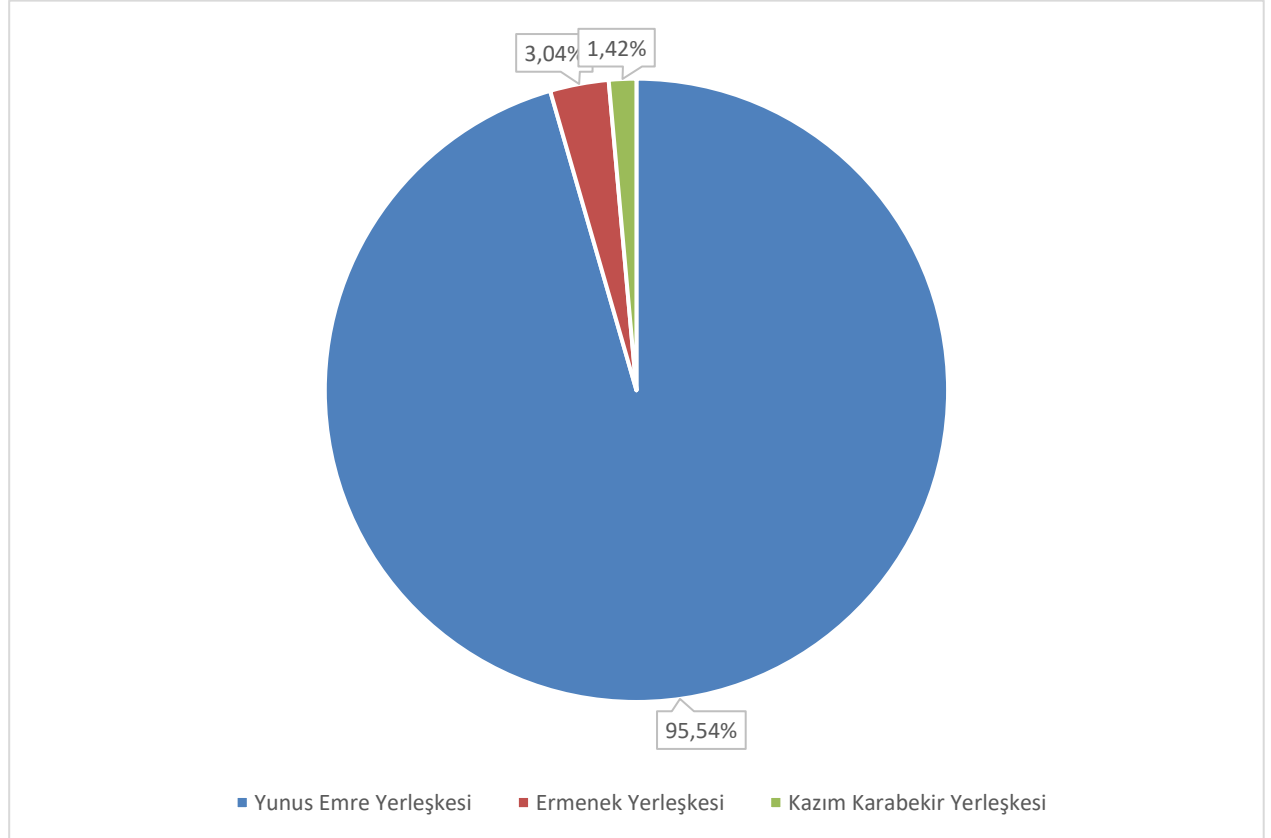

Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı


| İLÇESİ             | MAHALLE        | ADA  | PARSEL | YÜZÖLÇÜM<br>(m <sup>2</sup> ) | CİNSİ                                                                                                                                                                                                              | HİSSE   | MÜLKİYET                                                                 |
|--------------------|----------------|------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| MERKEZ             | HAMİDİYE       | 361  | 27     | 49.438,06                     | TARLA                                                                                                                                                                                                              | TAM     | MALİYE<br>HAZİNESİ                                                       |
| MERKEZ             | HAMİDİYE       | 361  | 28     | 29.204,52                     | TARLA                                                                                                                                                                                                              | TAM     | MALİYE<br>HAZİNESİ                                                       |
| MERKEZ             | HAMİDİYE       | 361  | 33     | 30.076,57                     | TARLA                                                                                                                                                                                                              | TAM     | MALİYE<br>HAZİNESİ                                                       |
| MERKEZ             | KIRBAĞI        | 3911 | 30     | 1.607.650,89                  | Beş Katlı Betonarme<br>Eğitim Fakültesi ve<br>Beş Katlı Betonarme<br>Sağlık Bilimleri<br>Fakültesi Ve Beş<br>Katlı Betonarme Dış<br>Hekimliği Fakültesi<br>Ve Meslek Yüksek<br>Okulu Ve Arsası                     | TAM     | MALİYE<br>HAZİNESİ                                                       |
| MERKEZ             | YENİŞEHİR      | 5168 | 2      | 1.375,18                      | ARSA                                                                                                                                                                                                               | TAM     | KMÜ                                                                      |
| MERKEZ             | YENİŞEHİR      | 5169 | 1      | 4.117,15                      | ARSA                                                                                                                                                                                                               | TAM     | KMÜ                                                                      |
| ERMENEK            | SEYRAN         | 112  | 33     | 51.581,75                     | Bir Adet 4, Bir Adet<br>5 Katlı Yüksek Okul<br>Binası, Bir Adet 5,<br>Bir Adet 6 Katlı<br>Öğrenci Yurdu<br>Binası, Bir Adet 4<br>Katlı İlköğretim<br>Okulu Binası, 4 Katlı<br>Betonarme Atölye<br>Binası ve Arsası | TAM     | KMÜ                                                                      |
| KAZIM<br>KARABEKİR | EMSAL<br>HAYAT | 970  | 4      | 23.938,98                     | Beş Katlı Betonarme<br>Okul, Üniversite<br>Araştırma Binası Ve<br>İki Katlı Karma Çok<br>Amaçlı Salon Ve<br>Arsası                                                                                                 | TAM     | MALİYE<br>HAZİNESİ                                                       |
| KAZIM<br>KARABEKİR | BOYACI         | 892  | 2      | 494,57                        | ARSA                                                                                                                                                                                                               | HİSSELİ | KMÜ<br>(31500/624018)<br>KAZIMKARABEKİR<br>BELEDİYESİ<br>(592518/624018) |
| KAZIM<br>KARABEKİR | SELÇUKLU       | 286  | 1      | 35.827,00                     | ARSA                                                                                                                                                                                                               | HİSSELİ | KMÜ (23826/35827)<br>Maliye Hazinesi<br>(12001/358)                      |
| ERMENEK            | SEYRAN         | 1059 | 1      | 6.754,29                      | ARSA                                                                                                                                                                                                               | TAM     | KMÜ                                                                      |

Çizelge 8: Taşınmazların Genel Dağılımı (m<sup>2</sup>)

Üniversitemizin kapalı mekânların hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

| Hizmet Alanı        | Yunus Emre Yerleşkesi | Kazım Karabekir Yerleşkesi | Ermenek Yerleşkesi | Toplam         |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Yönetim             | 19.152                | 0                          | 0                  | 19.152         |
| Eğitim              | 129.245               | 7.000                      | 11.845             | 148.090        |
| Sosyal              | 16.736                | 1.158                      | 0                  | 17.894         |
| Spor                | 12.582                | 0                          | 150                | 12.732         |
| Barınma             | 473                   | 0                          | 0                  | 473            |
| Diğer               | 2.055                 | 0                          | 0                  | 2.055          |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>180.243</b>        | <b>8.158</b>               | <b>11.995</b>      | <b>200.396</b> |

Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı

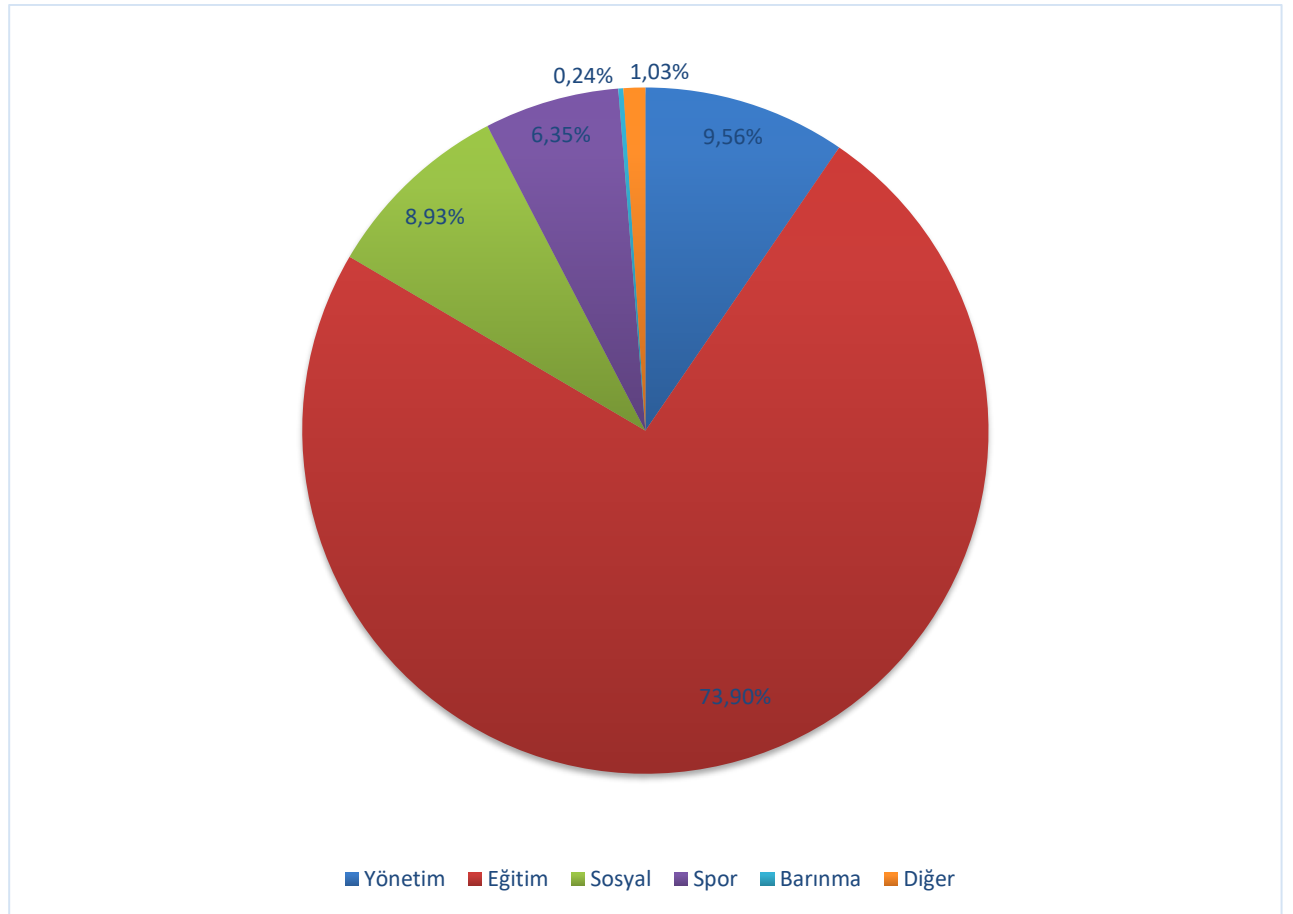

Grafik 2: Kapalı Alanların Hizmet Alanları İtibarıyla Dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı ve kapalı mekanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Yerleşke              | Bina Adı                                      | Birim                                   | Brüt Alan | Fonksiyon        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|
| Yunus Emre Yerleşkesi | Kamil Özdağ Fen Fakültesi                     | Kamil Özdağ Fen Fakültesi               | 4.635     | Eğitim Alanları  |
| Ermenek Yerleşkesi    | Ermenek Meslek Yüksekokulu                    | Ermenek Meslek Yüksekokulu              | 4.325     | Eğitim Alanları  |
| Ermenek Yerleşkesi    | Ermenek Meslek Yüksekokulu Atölye             | Ermenek Meslek Yüksekokulu              | 1.638     | Eğitim Alanları  |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Bilgi İşlem / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı         | 3.652     | Yönetim Alanları |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Rektörlük Binası                              | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  | 5.000     | Yönetim Alanları |
| Yunus Emre Yerleşkesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    | 13.700    | Eğitim Alanları  |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu            | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu      | 6.640     | Eğitim Alanları  |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Isı Merkezi                                   | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  | 2.055     | Diğer Alanlar    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu B Blok     | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu      | 3.367     | Eğitim Alanları  |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A Blok     | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu      | 3.798     | Eğitim Alanları  |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Mühendislik Fakültesi                         | Mühendislik Fakültesi                   | 20.435    | Eğitim Alanları  |
| Yunus Emre Yerleşkesi | KMÜ Çarşı                                     | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 13.000    | Sosyal Alanlar   |

| Yerleşke                   | Bina Adı                             | Birim                                                             | Brüt Alan | Fonksiyon          |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Spor Salonu                          | Spor Bilimleri Fakültesi                                          | 7.500     | Spor Alanları      |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Merkezi Laboratuvar                  | Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi | 3.170     | Araştırma Alanları |
| Kazım Karabekir Yerleşkesi | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu   | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu                                | 7.000     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Rektörlük Konutu                     | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                            | 473       | Barınma Alanları   |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Edebiyat Fakültesi                   | Edebiyat Fakültesi                                                | 17.420    | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Amfi Tiyatro                         | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                           | 533       | Sosyal Alanlar     |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Amfi Tiyatro Depolar                 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                           | 2.073     | Sosyal Alanlar     |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                              | 3.615     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu            | Spor Bilimleri Fakültesi                                          | 5.082     | Spor Alanları      |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Spor Bilimleri Fakültesi             | Spor Bilimleri Fakültesi                                          | 9.270     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Uygulama Otel                        | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu                                | 1.130     | Sosyal Alanlar     |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Kütüphane                            | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı                       | 10.500    | Yönetim Alanları   |

| Yerleşke                   | Bina Adı                                                          | Birim                                   | Brüt Alan      | Fonksiyon                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Yunus Emre Yerleşkesi      | İslami İlimler Fakültesi                                          | İslami İlimler Fakültesi                | 8.350          | Eğitim Alanları                |
| Kazım Karabekir Yerleşkesi | Konferans Salonu                                                  | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu      | 1.158          | Toplantı ve Konferans Alanları |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Eğitim Fakültesi                                                  | Eğitim Fakültesi                        | 8.480          | Eğitim Alanları                |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Sağlık Bilimleri Fakültesi                                        | Sağlık Bilimleri Fakültesi              | 3.600          | Eğitim Alanları                |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Tıp Fakültesi                                                     | Tıp Fakültesi                           | 10.765         | Eğitim Alanları                |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi                           | Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi | 12.000         | Eğitim Alanları                |
| Ermenek Yerleşkesi         | Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ermenek Uysal ve Hasan Kalan SHMYO      | 5.882          | Eğitim Alanları                |
| Ermenek Yerleşkesi         | Ermenek Meslek Yüksekokulu                                        | Ermenek Meslek Yüksekokulu              | 150            | Spor Alanları                  |
| <b>TOPLAM</b>              |                                                                   |                                         | <b>200.396</b> |                                |

Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

## 2.7. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

### 2.7.1. Hedeflenen

✓ Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programı'nda eğitim sektöründe altı, sağlık sektöründe bir ve DKH-Sosyal sektöründe bir adet proje yer almaktadır. Öncelikle 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda Tıp Fakültesi, Ahmet KELEŞOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi ile Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan makine teçhizatın alınması ile çevre düzenlemesi hedeflenmiştir. Ayrıca Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması da hedeflenmiştir.

✓ 2023 yılında yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

### 2.7.2. Gerçekleşen

2023 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

1. Sağlık alanındaki birimler başta olmak üzere Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları. (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar)
2. Bilgi işlem altyapısının güçlendirilebilmesi amacıyla anahtarlama cihazı (switch), yedekleme ünitesi vb. alımlar,
3. Altyapı ve çevre düzenlemesi işleri ile çevre duvarı, güvenlik kulübesi ve bina içi güvenlik bölmeleri yapım işleri,
4. Peyzaj ve çevre düzenleme revizyonu (Yıl içerisinde yapılan ihaleler sonucu alınan malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından.)
5. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlanarak mevzuata uygun olarak uygulanması işi,
6. Araç takip sistemi yazılımı güncellenmiş, Logsign lisansı, güvenlik programları, IP abone lisansı, e-reçete yazılımı, sistem yazılımı (Vmware vSphere 8 Essentials Plus Kit), Öğrenci online intibak başvuru modülü, planlama modülü alımları,

7. 2023 yılı içerisinde elektronik veri tabanı ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar,
8. Spor salonu bakım onarımları.

---

#### **8.1.1. Devam Edenler**

Üniversitemizde 2023 yılı itibarıyla devam eden projeler kapsamında 2010H05-1269 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi içinde yer alan Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu yapım işi, 2009H03-1057 numaralı Derslikler ve Merkezi Birimler projesi içinde yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli yapım işi olmak üzere toplam üç adet proje mevcuttur. Bu projelerden Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu ile Uygulama Oteli için 2023 yılı için herhangi bir ödenek tahsis edilmemiş olup bu projeler iz ödenek bedeli ile takip edilmektedir. Bu projelere ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

✓ Tıp Fakültesi morfoloji binası yapım işi için 05.12.2022, 06.04.2023 ve 20.12.2023 tarihlerinde ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 2024 yılı içerisinde tekrar ihaleye çıkılacaktır

✓ 2018 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak son dört yıldır yatırım için izin verilmeyen Ermenek 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu işinin izin verilmesi ve gerekli kaynak tahsisinin sağlanması halinde 2024 yılında yapılması öngörülmektedir.

✓ 2018 yılı yatırım programına alınan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. İlgili projeye yatırım izni verilmemekle birlikte Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.


## 8.2. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 8.2.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 70.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 105.500.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 64.503.184,77 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 61,10'dur. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir

| Bütçe Tertibi | KBÖ                  | Eklenen              | Düşülen              | Toplam Ödenek         | Harcama              |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 06.01         | 16.348.000,00        | 32.624.000,00        | 300.000,00           | 48.672.000,00         | 41.650.970,47        |
| 06.03         | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00          | 1.641.198,87         |
| 06.05         | 35.904.000,00        | 1.498.000,00         | 0,00                 | 37.402.000,00         | 6.079.115,92         |
| 06.06         | 1.750.000,00         | 1.329.858,00         | 630.858,00           | 2.449.000,00          | 1.750.933,31         |
| 06.07         | 3.998.000,00         | 6.452.200,00         | 5.473.200,00         | 4.977.000,00          | 3.380.966,20         |
| 06.09         | 10.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 10.000.000,00         | 10.000.000,00        |
| <b>Toplam</b> | <b>70.000.000,00</b> | <b>51.904.058,00</b> | <b>16.404.058,00</b> | <b>105.500.000,00</b> | <b>64.503.184,77</b> |

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı

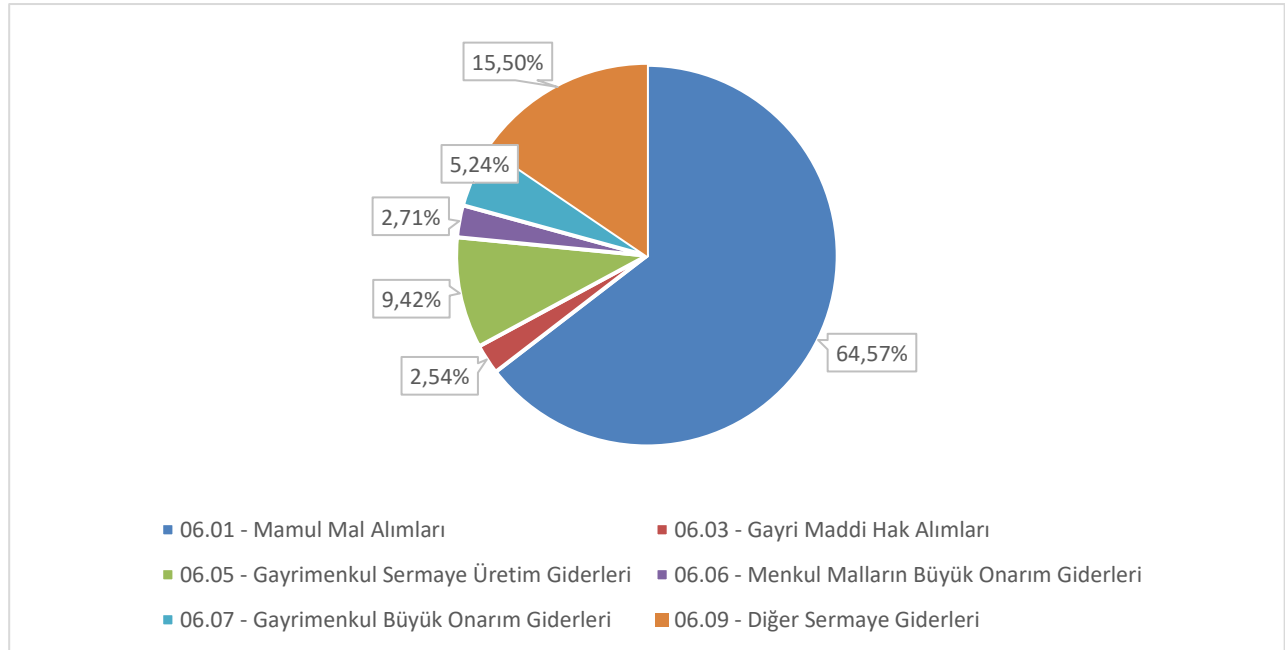

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Sermaye giderlerine ilişkin 2023 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Ekonomik Kod |    |     |    | Açıklama                                             | Tutar                |
|--------------|----|-----|----|------------------------------------------------------|----------------------|
| I            | II | III | IV |                                                      |                      |
| 06           | 01 | 10  | 01 | Büro Mefruşatı Alımları                              | 4.158.538,20         |
| 06           | 01 | 10  | 03 | Okul Mefruşatı Alımları                              | 96.036,00            |
| 06           | 01 | 10  | 04 | Hastane Mefruşatı Alımları                           | 30.090,00            |
| 06           | 01 | 10  | 90 | Diğer Mefruşat Alımları                              | 83.194,80            |
| 06           | 01 | 10  |    | Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları                    | 4.367.859,00         |
| 06           | 01 | 20  | 01 | Büro Makinaları Alımları                             | 1.068.007,04         |
| 06           | 01 | 20  | 02 | Bilgisayar Alımları                                  | 1.234.193,28         |
| 06           | 01 | 20  | 03 | Tıbbi Cihaz Alımları                                 | 571.541,00           |
| 06           | 01 | 20  | 04 | Laboratuvar Cihazı Alımları                          | 18.096.574,16        |
| 06           | 01 | 20  | 05 | İşyeri Makine Teçhizat Alımları                      | 12.360,48            |
| 06           | 01 | 20  | 90 | Diğer Makine Teçhizat Alımları                       | 8.844.097,01         |
| 06           | 01 | 20  |    | Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları              | 29.826.772,97        |
| 06           | 01 | 30  | 04 | Laboratuvar Gereçleri Alımları                       | 2.216.961,50         |
| 06           | 01 | 30  | 05 | Zirai Gereç Alımları                                 | 140.000,00           |
| 06           | 01 | 30  |    | Avadanlık Alımları                                   | 2.356.961,50         |
| 06           | 01 | 60  | 01 | Basılı Yayın Alımları ve Yapımları                   | 140.260,15           |
| 06           | 01 | 60  | 03 | Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları       | 1.133.119,17         |
| 06           | 01 | 60  |    | Yayın Alımları ve Yapımları                          | 1.273.379,32         |
| 06           | 01 | 80  | 03 | Bilgisayar Alımları                                  | 145.567,41           |
| 06           | 01 | 80  | 04 | Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları                  | 3.680.430,27         |
| 06           | 01 | 80  |    | Bilişim Donanım Alımları                             | 3.825.997,68         |
| 06           | 01 |     |    | <b>Mamul Mal Alımları</b>                            | <b>41.650.970,47</b> |
| 06           | 03 | 10  | 01 | Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları                   | 731.004,55           |
| 06           | 03 | 10  |    | Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri | 731.004,55           |
| 06           | 03 | 30  | 03 | Güvenlik Lisans Alımları                             | 816.218,62           |

| Ekonomik Kod |           |    |    | Açıklama                                      | Tutar                |
|--------------|-----------|----|----|-----------------------------------------------|----------------------|
| 06           | 03        | 30 |    | Lisans Alımları                               | 816.218,62           |
| 06           | 03        | 90 | 01 | Diğer Fikri Hak Alımları                      | 93.975,70            |
| 06           | 03        | 90 |    | Diğer Fikri Hak Alımları                      | 93.975,70            |
| <b>06</b>    | <b>03</b> |    |    | <b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>               | <b>1.641.198,87</b>  |
| 06           | 05        | 70 | 01 | Hizmet Binası Yapım Giderleri                 | 165.200,00           |
| 06           | 05        | 70 |    | Müteahhitlik Giderleri                        | 165.200,00           |
| 06           | 05        | 90 | 01 | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri    | 5.913.915,92         |
| 06           | 05        | 90 |    | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri    | 5.913.915,92         |
| <b>06</b>    | <b>05</b> |    |    | <b>Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri</b>   | <b>6.079.115,92</b>  |
| 06           | 06        | 20 | 01 | Malzeme Giderleri                             | 309.689,36           |
| 06           | 06        | 20 |    | Malzeme Giderleri                             | 309.689,36           |
| 06           | 06        | 90 | 01 | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri  | 1.441.243,95         |
| 06           | 06        | 90 |    | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri  | 1.441.243,95         |
| <b>06</b>    | <b>06</b> |    |    | <b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b> | <b>1.750.933,31</b>  |
| 06           | 07        | 20 | 01 | İnşaat Malzemesi Giderleri                    | 90.811,20            |
| 06           | 07        | 20 |    | Malzeme Giderleri                             | 90.811,20            |
| 06           | 07        | 70 | 90 | Diğer Müteahhitlik Giderleri                  | 890.185,00           |
| 06           | 07        | 70 |    | Müteahhitlik Giderleri                        | 890.185,00           |
| 06           | 07        | 90 | 01 | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      | 2.399.970,00         |
| 06           | 07        | 90 |    | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      | 2.399.970,00         |
| <b>06</b>    | <b>07</b> |    |    | <b>Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</b>     | <b>3.380.966,20</b>  |
| 06           | 09        | 90 | 01 | Diğer Sermaye Giderleri                       | 10.000.000,00        |
| 06           | 09        | 90 |    | Diğer Sermaye Giderleri                       | 10.000.000,00        |
| <b>06</b>    | <b>09</b> |    |    | <b>Diğer Sermaye Giderleri</b>                | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>06</b>    |           |    |    | <b>Sermaye Giderleri</b>                      | <b>64.503.184,77</b> |

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

## 06.01 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 16.348.000,00 TL olan 06.01 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 32.624.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 300.000,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 48.672.000,00 TL olmuştur. 2023H03-212694 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 28.877.999,85 TL, 2023I00-191384 nolu Muhtelif İşler-Sağlık Projesi kapsamında 11.499.591,30 TL ve 2023H03-212692 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında 1.273.379,32 TL harcama yapılmıştır. Bu üç projenin toplam harcaması 41.650.970,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 85,57'dir. 06.01 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim               | Açıklama                   | Proje No       | Projenin Adı          | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 06.01.10.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Büro Mefruşatı Alımı       | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 1.905.635,99        |
| 06.01.10.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Büro Mefruşatı Alımı       | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 2.252.902,21        |
| 06.01.10.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Okul Mefruşatı Alımları    | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 96.036,00           |
| 06.01.10.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Hastane Mefruşatı Alımları | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 30.090,00           |
| 06.01.10.90 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Diğer Mefruşat Alımı       | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 82.330,80           |
| 06.01.10.90 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Diğer Mefruşat Alımı       | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 864,00              |
| 06.01.10    | <b>Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları</b> |                            |                |                       | <b>4.367.859,00</b> |
| 06.01.20.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Büro Makinaları Alımları   | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 633.928,68          |
| 06.01.20.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Büro Makinaları Alımları   | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 434.078,36          |
| 06.01.20.02 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Bilgisayar Alımı           | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 641.814,96          |
| 06.01.20.02 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Bilgisayar Alımı           | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 592.378,32          |
| 06.01.20.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Tıbbi Cihaz Alımı          | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 295.000,00          |
| 06.01.20.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     | Tıbbi Cihaz Alımı          | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 276.541,00          |

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                     | Açıklama                                       | Proje No       | Projenin Adı          | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 06.01.20.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Cihazı Alımı                       | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 6.329.410,02        |
| 06.01.20.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Cihazı Alımı                       | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 11.767.164,14       |
| 06.01.20.05 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | İşyeri Makine Teçhizat Alımları                | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 12.360,48           |
| 06.01.20.90 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Diğer Makine ve Teçhizat Alımı                 | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 690.119,33          |
| 06.01.20.90 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                   | Diğer Makine ve Teçhizat Alımı                 | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 8.153.977,68        |
| 06.01.20    | <b>Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları</b> |                                                |                | <b>29.826.772,97</b>  |                     |
| 06.01.30.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Gereçleri Alımları                 | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 341.401,50          |
| 06.01.30.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Gereçleri Alımları                 | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 1.875.560,00        |
| 06.01.30.05 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Zirai Gereç Alımları                           | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 140.000,00          |
| 06.01.30    | <b>Avadanlık Alımları</b>                      |                                                |                | <b>2.356.961,50</b>   |                     |
| 06.01.60.01 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı    | Basılı Yayın Alımları ve Yapımları             | 2023H03-212692 | Yayın Alımı           | 140.260,15          |
| 06.01.60.03 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı    | Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | 2023H03-212692 | Yayın Alımı           | 1.133.119,17        |
| 06.01.60    | <b>Yayın Alımları ve Yapımları</b>             |                                                |                | <b>1.273.379,32</b>   |                     |
| 06.01.80.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Bilgisayar Alımları                            | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 145.567,41          |
| 06.01.80.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları            | 2023I00-191384 | Muhtelif İşler Sağlık | 57.026,39           |
| 06.01.80.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları            | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler        | 3.623.403,88        |
| 06.01.80    | <b>Bilişim Donanım Alımları</b>                |                                                |                | <b>3.825.997,68</b>   |                     |
| 06.01       | <b>Mamul Mal Alımları</b>                      |                                                |                | <b>41.650.970,47</b>  |                     |

Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

### 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olan 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde ödenek eklenmemiştir. 2023H03-212694 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.641.198,87 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 82,06'dır. 06.03 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                           | Açıklama                           | Proje No       | Projenin Adı   | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 06.03.10.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                 | Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 731.004,55          |
| 06.03.10    | Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri |                                    |                |                | 731.004,55          |
| 06.03.30.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                 | Güvenlik Lisans Alımları           | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 816.218,62          |
| 06.03.30    | Lisans Alımları                                      |                                    |                |                | 816.218,62          |
| 06.03.90.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                 | Diğer Fikri Hak Alımları           | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 93.975,70           |
| 06.03.90    | Diğer Fikri Hak Alımları                             |                                    |                |                | 93.975,70           |
| 06.03       | Gayri Maddi Hak Alımları                             |                                    |                |                | 1.641.198,87        |

Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 35.904.000,00 TL olan 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 1.498.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 37.402.000,00 TL olmuştur. 2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 6.079.115,92 TL harcama yapılmış olup yıl sonu ödeneğine göre oranı % 16,25'dir. 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                 | Açıklama                                   | Proje No       | Projenin Adı     | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 06.05.70.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı     | Hizmet Binası Yapım Giderleri              | 2023H03-212700 | Kampüs Altyapısı | 165.200,00          |
| 06.05.70    | Müteahhitlik Giderleri                     |                                            |                |                  | 165.200,00          |
| 06.05.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı     | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 2023H03-212700 | Kampüs Altyapısı | 5.913.915,92        |
| 06.05.90    | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |                                            |                |                  | 5.913.915,92        |
| 06.05       | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri       |                                            |                |                  | 6.079.115,92        |

Çizelge 15: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.750.000,00 TL olan 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 1.329.858,00 TL ödenek eklenmiş ve 630.858,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 2.449.000,00 TL olmuştur. 2023H03-212694 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.750.933,31 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 71,50'dir. 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                                        | Açıklama                                     | Proje No       | Projenin Adı   | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 06.06.20.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                              | Malzeme Giderleri                            | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 275.359,76          |
| 06.06.20.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                            | Malzeme Giderleri                            | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 34.329,60           |
| 06.06.20    | <b>Malzeme Giderleri</b>                                          |                                              |                |                | <b>309.689,36</b>   |
| 06.06.90.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                              | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 424.208,95          |
| 06.06.90.01 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı                       | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 18.000,00           |
| 06.06.90.01 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                           | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 85.680,00           |
| 06.06.90.01 | Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 447.754,60          |
| 06.06.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                            | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 465.600,40          |
| 06.06.90    | <b>Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri</b>               |                                              |                |                | <b>1.441.243,95</b> |
| 06.06       | <b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>                     |                                              |                |                | <b>1.750.933,31</b> |

Çizelge 16: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)

## 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 3.998.000,00 TL olan 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 6.452.200,00 TL ödenek eklenmiş ve 5.473.200,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 4.977.000,00 TL olmuştur. 2023H03-212694 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2.914.896,20 TL, 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 466.070,00 TL olmak üzere toplamda 3.380.966,20 TL harcama yapılmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 67,93'dür. 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                                        | Açıklama                                 | Proje No       | Projenin Adı   | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 06.07.20.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                            | İnşaat Malzemesi Giderleri               | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 90.811,20           |
| 06.07.20    | <b>Malzeme Giderleri</b>                                          |                                          |                |                | <b>90.811,20</b>    |
| 06.07.70.90 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu                                | Diğer Müteahhitlik Giderleri             | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 890.185,00          |
| 06.07.70    | <b>Müteahhitlik Giderleri</b>                                     |                                          |                |                | <b>890.185,00</b>   |
| 06.07.90.01 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                           | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 172.200,00          |
| 06.07.90.01 | Kamil Özdağ Fen Fakültesi                                         | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 45.600,00           |
| 06.07.90.01 | Mühendislik Fakültesi                                             | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 60.000,00           |
| 06.07.90.01 | Teknik Bilimler MYO                                               | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 58.800,00           |
| 06.07.90.01 | Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler | 36.000,00           |

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim               | Açıklama                                 | Proje No       | Projenin Adı                  | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 06.07.90.01 | Eğitim Fakültesi                         | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler                | 72.000,00           |
| 06.07.90.01 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler                | 48.000,00           |
| 06.07.90.01 | Edebiyat Fakültesi                       | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler                | 156.000,00          |
| 06.07.90.01 | Spor Bilimleri Fakültesi                 | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler                | 60.000,00           |
| 06.07.90.01 | Sosyal Bilimler MYO                      | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2023H03-212694 | Muhtelif İşler                | 34.800,00           |
| 06.07.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı   | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2010H05-1269   | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 466.070,00          |
| 06.07.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı   | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2010H05-1269   | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 1.950.500,00        |
| 06.07.90    | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |                                          |                |                               | 2.399.970,00        |
| 06.07       | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri       |                                          |                |                               | 3.380.966,20        |

Çizelge 17: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.09 Diğer Sermaye Giderleri

Başlangıç ödeneği 10.000.000,00 TL olan 06.09 Diğer Sermaye Giderleri için yıl içinde ödenek eklenmemiştir. 2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesi kapsamında 10.000.000,00 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı % 100,00'dür. 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim             | Açıklama                | Proje No       | Projenin Adı         | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 06.09.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Sermaye Giderleri | 2023K12-214484 | İhtisaslaşma Projesi | 10.000.000,00       |
| 06.09.90    | Diğer Sermaye Giderleri                |                         |                |                      | 10.000.000,00       |
| 06.09       | Diğer Sermaye Giderleri                |                         |                |                      | 10.000.000,00       |

Çizelge 18: Diğer Sermaye Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

### 8.2.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-19* ile 26'da yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4*'de gösterilmiştir.

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023H03-212688                     |
| Proje Adı                       | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi    |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2023                          |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 400.000,00                         |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Proje Tutarı TL                 | 400.000,00                         |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 400.000,00                         |

Çizelge 19: Revizyon (2023H03-212688 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023H03-212694                     |
| Proje Adı                       | Muhtelif İşler                     |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2023                          |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 11.600.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 31.700.000,00                      |
| Proje Tutarı TL                 | 43.300.000,00                      |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 43.300.000,00                      |

Çizelge 20: Revizyon (2023H03-212694 Nolu Muhtelif İşler)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023H03-212692                     |
| Proje Adı                       | Yayın Alımı                        |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2023                          |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 1.000.000,00                       |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 300.000,00                         |
| Proje Tutarı TL                 | 1.300.000,00                       |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 1.300.000,00                       |

Çizelge 21: Revizyon (2023H03-212692 Nolu Yayın Alımı)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023H03-212700                     |
| Proje Adı                       | Kampüs Altyapısı                   |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2025                          |
| 2022 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 0,00                               |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 7.000.000,00                       |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Proje Tutarı TL                 | 32.000.000,00                      |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 7.000.000,00                       |

Çizelge 22: Revizyon (2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2009H03-1057                       |
| Proje Adı                       | Derslik ve Merkezi Birimler        |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2009-2025                          |
| 2022 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 0,00                               |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 30.000.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Proje Tutarı TL                 | 22.002.000,00                      |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 300.222.000,00                     |

Çizelge 23: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor       |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2010H05-1269                       |
| Proje Adı                       | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri      |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2010-2025                          |
| 2022 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 0,00                               |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 2.000.000,00                       |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Proje Tutarı TL                 | 10.002.000,00                      |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 2.000.000,00                       |


Çizelge 24: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Sağlık                             |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023I00-191384                     |
| Proje Adı                       | Muhtelif İşler Projesi             |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2023                          |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 8.000.000,00                       |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 3.500.000,00                       |
| Proje Tutarı TL                 | 11.500.000,00                      |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 11.500.000,00                      |

Çizelge 25: Revizyon (2023I00-191384 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma   |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023K12-214484                     |
| Proje Adı                       | İhtisaslaşma Projesi               |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2026                          |
| 2022 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 0,00                               |
| 2023 Yılı Yatırımı TL           | 10.000.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Proje Tutarı TL                 | 30.000.000,00                      |
| 2023 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 10.000.000,00                      |

Çizelge 26: Revizyon (2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi)

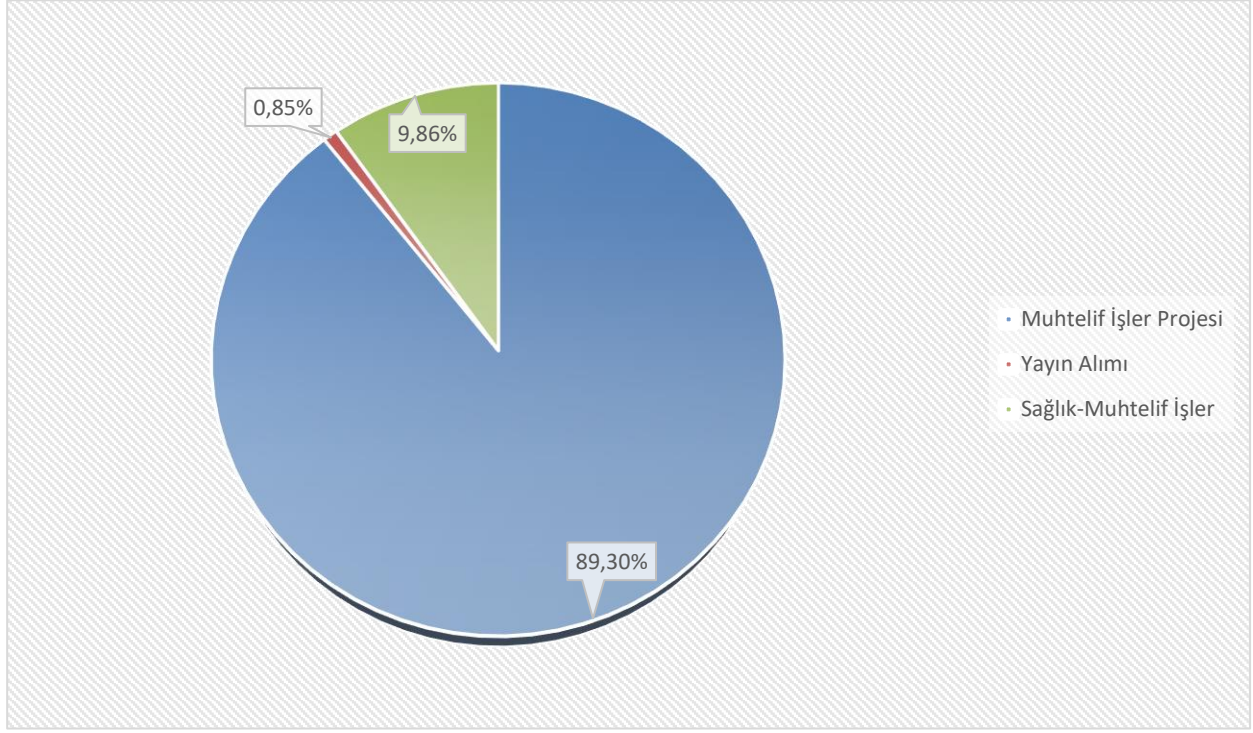

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı (Ödenek Eklemesi Yapılanlar)

### 8.2.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması, ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca projenin uygulanması aşamasında sürekli artan fiyatlar nedeniyle yükleniciler zor durumda kalmaktadır.
- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının da etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.
- Kesin teminatın iadesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ihale mevzuatı gereğince geçici kabul yapıldıktan sonra kesin teminatın yarısının iade edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun'a göre kesin teminatın yarısının iadesinde ilişiksiz belgesi aranmamakta, Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı Kanun'a göre ilişiksiz belgesi düzenlenmeden kesin teminatın yarısının iadesinin yapılamayacağı belirtilmekte olup SGK tarafından ilişiksiz belgesi düzenlenebilmesi için işe ait kesin hakediş tutarı istenilmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kesin hakediş tutarı, kesin kabul aşamasında kesin hakediş raporu ile tespit edilmektedir. Geçici kabul işleminden sonra işin kesin hakediş tutarı belli olmadığı için kesin teminatın yarısının iadesi mümkün olmamaktadır.

### 3. Proje Uygulamaları

#### 3.1. 2023H03-212688 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2023 yılı bütçemize 400.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. 2023 yılı için teklif edilen diğer projelere ödenek verilmediğinden harcama gerçekleşmemiştir. 2023H03-212688 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yükleyen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Karakteristik                  | Etüt-Proje                         |
| Proje Başlama Yılı             | 2023                               |
| Proje Bitiş Yılı               | 2023                               |
| Proje Tutarı TL                | 400.000,00                         |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 400.000,00                         |
| Düşülen TL                     | 0,00                               |
| Toplam Ödenek TL               | 400.000,00                         |
| Harcama TL                     | 0,00                               |
| Kalan Ödenek TL                | 400.000,00                         |
| Gerçekleşme Oranı %            | 0,00                               |

Çizelge 27: 2023H03-212688 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

#### 3.2. 2023H03-212694 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi için 2023 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 13.098.000,00 TL'dir. 2023 Yılı Yatırım Programı ödeneklerimiz ile bütçe ödeneklerimizin uyumlu hale getirilebilmesi için Kampüs Altyapısına 1.498.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Yıl içerisinde finansman fazlasından 22.000.000,00 TL ödenek eklenmiş, yıl sonunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 10.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Ayrıca ilgili projeden 2023H03-212692 nolu Yayın Alımları projesine 300.000,00 TL aktarılmış olup toplam ödenek 43.300.000,00 TL, toplam harcama ise 35.185.028,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023H03-212694 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                            |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi              |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi              |
| Karakteristik                  | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat |
| Proje Başlama Yılı             | 2023                                            |
| Proje Bitiş Yılı               | 2023                                            |
| Proje Tutarı TL                | 43.300.000,00                                   |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 13.098.000,00                                   |
| Eklenen - Aktarılan TL         | 32.000.000,00                                   |
| Düşülen TL                     | 1.798.000,00                                    |
| Toplam Ödenek TL               | 43.300.000,00                                   |
| Harcama TL                     | 35.185.028,23                                   |
| Kalan Ödenek TL                | 8.114.971,77                                    |
| Gerçekleşme Oranı %            | 81,26                                           |

Çizelge 28: 2023H03-212694 Nolu Muhtelif İşler Projesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                            | Tutar (TL)   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Mikrotom Cihazı                                               | 5.016.000,00 |
| Erişim Noktası                                                | 2.471.219,20 |
| Egzersiz Test Sistemi Performans Ölçüm ve Analiz Cihazı       | 2.365.660,00 |
| Laboratuvar Cihaz ve Aletleri                                 | 1.651.800,00 |
| Yedekleme Ünitesi                                             | 1.551.237,22 |
| Anahtarlama Cihazı (Switch)                                   | 1.441.032,57 |
| Kadavra                                                       | 1.392.000,00 |
| HDD                                                           | 1.284.488,94 |
| Mobilya Alımı                                                 | 938.831,41   |
| Yedekleme Cihazları                                           | 867.143,57   |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Cihazı                         | 649.000,00   |
| Bilgisayar ve Ekipmanları                                     | 639.699,72   |
| Yol Süpürme Makinesi                                          | 618.810,00   |
| Bilgisayar Kasası                                             | 543.919,92   |
| Lazer Yazıcı                                                  | 538.781,59   |
| Projeksiyon Cihazı                                            | 510.885,71   |
| Spektrofotometre ve PH Ölçme Cihazı                           | 448.800,00   |
| Güvenlik Duvarı Lisans Alımı                                  | 410.100,16   |
| Palo Alto Networks Donanım ve Yazılım Dahil Güvenlik Programı | 406.118,46   |
| Tıbbi Eğitim Mankeni                                          | 397.056,00   |
| Kafatası Modeli                                               | 353.760,00   |
| Hayvan Davranışları Takip Analiz ve Ölçüm Cihazı              | 313.500,00   |
| Ses Ekipmanı                                                  | 309.636,60   |
| Telefon                                                       | 299.154,12   |
| SSD                                                           | 293.407,00   |
| Mikroskop                                                     | 285.120,00   |
| Güvenlik Duvarı Güncelleme Yazılımı                           | 239.372,27   |
| Mikroskop ve Ekipmanları                                      | 196.680,00   |
| Temizlik Makinesi Yedek Parça Alımı                           | 172.080,00   |
| Windows 11 Pro Upgrade Akademik                               | 169.041,60   |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                   | Tutar (TL) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Ram                                                                  | 167.689,80 |
| Logsign Lisans Bedeli (19.04.2023-19.04.2026)                        | 166.970,00 |
| Laboratuvar Ekipmanı Alımları                                        | 165.000,00 |
| Sistem Yazılımı (Vmware vSphere 8 Essentials Plus Kit)               | 162.000,00 |
| Ağ Kontrol Cihazı ve Erişim Noktası                                  | 154.819,14 |
| Monitör                                                              | 150.298,68 |
| Fotokopi Makinesi                                                    | 141.888,00 |
| Çim Traktörü                                                         | 140.000,00 |
| Konferans Sandalyesi                                                 | 139.913,39 |
| Öğrenci Online İntibak Başvuru Modülü                                | 135.000,00 |
| Genel Amaçlı Tıbbi Cihaz ve Aletler                                  | 129.800,00 |
| Gaz Dolum Cihazı                                                     | 122.400,00 |
| İstif Rafı Kaynaklı                                                  | 119.280,00 |
| Rektörlük Özel Kalem Koridoru Giriş Fuaye Kapısı Mal ve Hizmet Alımı | 118.800,00 |
| IP Kamera                                                            | 117.000,00 |
| Yük Rafı                                                             | 112.230,60 |
| Güç Elektroniği Eğitim Seti (Ermenek MYO)                            | 103.840,00 |
| Araç Yedek Parça Değişimi ve İşçilik                                 | 103.669,27 |
| Chiller Soğutma Grubu Bakım Onarımı                                  | 100.300,00 |
| Taşınabilir EMG Cihazı                                               | 100.045,00 |
| Isı Paylaştırma Sistemi                                              | 95.161,32  |
| Planlama Modülü                                                      | 93.975,70  |
| Klima Bakımı                                                         | 85.680,00  |
| Küvet Kapama Sacı                                                    | 84.780,00  |
| Cerrahi Alet Seti                                                    | 84.000,00  |
| Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı                                           | 74.279,86  |
| Otomatik Yangın Söndürme Sistemi                                     | 61.800,00  |
| Klima Gazı ve Oksijen Kaynak Takımı Alımı                            | 61.122,00  |
| Otomatik Yangın Söndürme Sistemi                                     | 60.960,00  |
| Klima                                                                | 59.347,20  |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler   | Tutar (TL) |
|--------------------------------------|------------|
| Gözlü Dolap                          | 55.399,98  |
| Kamera ve Ekipmanı                   | 52.956,00  |
| Polikarbon Küvet                     | 51.300,00  |
| Platform                             | 48.600,00  |
| Lavabolu Raflı Tezgah                | 45.900,00  |
| Bilgisayar                           | 45.689,94  |
| Lavabosuz Raflı Tezgah               | 45.360,00  |
| Yemek Masası                         | 40.831,34  |
| Dosya Dolabı                         | 37.578,95  |
| Trafik Bariyer ve Otopark Sistemleri | 37.200,00  |
| Misafir Koltuğu                      | 36.753,70  |
| Dolap                                | 36.732,30  |
| Tezgahlı Mutfak Dolabı               | 36.180,00  |
| Mikroskop                            | 34.506,74  |
| Lastik                               | 33.094,85  |
| Araç Yedek Parça                     | 32.320,02  |
| Buzdolabı                            | 31.020,00  |
| Yazı Tahtası                         | 29.592,00  |
| Araç Ön Isıtma Sistemi               | 29.500,00  |
| Led Televizyon                       | 28.319,28  |
| Teksir ve Çoğaltma Makineleri        | 27.600,00  |
| Tezgah Altı Malzeme Dolabı           | 25.920,00  |
| Plastik Palet                        | 25.500,00  |
| Kitaplık                             | 24.358,32  |
| Sandalye                             | 21.894,28  |
| Isıtıcı                              | 19.860,00  |
| Kapı Operatörü                       | 18.600,00  |
| IP Abone Lisansı Alımı               | 18.000,00  |
| Yaprak Üfleme Makinesi               | 16.680,00  |
| Panel Çit                            | 16.354,80  |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler | Tutar (TL)           |
|------------------------------------|----------------------|
| Yazıcı                             | 15.779,46            |
| Mutfak Alt Tezgahı                 | 15.368,40            |
| Çalışma Masası                     | 14.300,00            |
| Çamaşır Makinası                   | 13.490,40            |
| Malzeme Dolabı                     | 13.251,60            |
| Ameliyathane Dolabı                | 13.090,44            |
| Su Tankı                           | 12.300,00            |
| Satranç Masası                     | 12.096,00            |
| Kulak İzi Alma Kiti                | 11.496,00            |
| Çamaşır Kurutma Makinası           | 10.617,64            |
| Yatak                              | 10.500,00            |
| Robot Süpürge                      | 9.440,00             |
| Öğretmen Masası                    | 7.344,00             |
| Sehpa                              | 7.163,10             |
| Araç Takip Sistemi Yazılımı        | 6.662,28             |
| Merdiven                           | 6.600,00             |
| Araç Bakım ve Onarım               | 6.240,00             |
| Perde                              | 6.196,62             |
| Termosifon                         | 5.400,00             |
| Araç Yedek Parça (Gaz Kelebeği)    | 4.200,00             |
| Lastik Tamiri ve Değişimi          | 3.511,68             |
| Araç İçin Klima Gazı Alımı         | 3.168,00             |
| E-Reçete Yazılımı                  | 3.000,00             |
| Hortum                             | 1.383,29             |
| Duvar Rafı                         | 1.296,00             |
| Engelli Rampası                    | 864,00               |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>31.404.747,43</b> |

Çizelge 29: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire             | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı          |
| Sözleşme Tarafları       | Novus Sağlık Ürünleri Ar-Ge Danışmanlık<br>İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| Sözleşmenin Konusu       | Tüm Vücut Tahnitli 2 Adet Kadavra                                                   |
| Proje Numarası           | 2023H03-212694                                                                      |
| İhale Tarihi             | 25.07.2023                                                                          |
| Sözleşme Tarihi          | 18.09.2023                                                                          |
| Sözleşme Bedeli TL       | 1.160.000,00 TL (KDV Hariç)                                                         |
| 2023 Yılı Harcama Tutarı | 1.392.000,00                                                                        |

Çizelge 30: Tüm Vücut Tahnitli 2 Adet Kadavra İhale Bilgileri

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                   | Tutarı (TL)       |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Spektrafometre Cihazının Bakım ve Onarımı            | 117.000,00        |
| Cihaz Bakım Onarım İş                                | 112.044,00        |
| Sıvı Azot Sistemi Bakım ve Onarım                    | 90.000,00         |
| XRD Sistemine Ait Chiller Cihazının Bakım ve Onarımı | 81.600,00         |
| Temizlik Makinesi Bakım Onarım                       | 36.252,00         |
| Asansör Mavi Etiketlendirilmesi Yapım İş             | 36.000,00         |
| Klima Bakım Onarımı                                  | 9.898,60          |
| Buzdolabı Bakım ve Onarım                            | 960,00            |
| <b>TOPLAM</b>                                        | <b>483.754,60</b> |

Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                | Tutarı (TL)         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Peyzaj ve Çevre Düzenleme Revizyonu                               | 819.925,00          |
| Asansör Mavi Etiketlendirilmesi Yapım İş                          | 231.000,00          |
| Çatı ve Oluk Bakım Onarım Yapım İş                                | 166.800,00          |
| Çatı Onarım ve Tadilat İşleri                                     | 161.040,00          |
| Çatı Yağmur Oluklarının Isıtmalı Sisteme Dönüştürülmesi           | 160.200,00          |
| Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları                         | 149.450,40          |
| Ana Giriş Kapısı Tadilatı                                         | 135.000,00          |
| Trafik Güvenliği ve Dumansız Hava Sahası İmalatları Bakım Onarım  | 124.800,00          |
| Peyzaj Makinaları Bakım ve Onarım                                 | 108.000,00          |
| Amfi Tiyatro ve Su Yalıtım Yapım İş                               | 93.360,00           |
| İnşaat Malzemeleri                                                | 90.811,20           |
| Asansör Parçaları Mal Alımı                                       | 70.260,00           |
| Asansör Bakım Onarım                                              | 130.900,00          |
| Jeneratör Bakım Onarım Malzemeleri                                | 52.650,00           |
| Eski Su Kuyusu ve Çevre Sulama Hidrofor Sistemi Tadilatı Yapım İş | 46.200,00           |
| Peyzaj Makinaları Bakım Onarımı için Malzeme Alımı                | 34.329,60           |
| Jeneratör Bakım Onarım                                            | 30.000,00           |
| UPS Bakımları                                                     | 25.200,00           |
| <b>TOPLAM</b>                                                     | <b>2.629.926,20</b> |

Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Diğer harcama birimleri tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler       | Tutarı (TL)       |
|------------------------------------------|-------------------|
| Asansör Mavi Etiketlendirilmesi Yapım İş | 648.600,00        |
| Kapı Geçiş Sistemi                       | 18.000,00         |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>666.600,00</b> |

Çizelge 33: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Diğer Birimler)

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire             | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Sözleşme Tarafları       | Semih TAŞ                                                                    |
| Sözleşmenin Konusu       | KMÜ Peyzaj ve Çevre Düzenleme Revizyonu<br>Mal Alımı                         |
| Proje Numarası           | 2023H03-212700                                                               |
| İhale Tarihi             | 16.11.2023                                                                   |
| Sözleşme Tarihi          | 04.12.2023                                                                   |
| Sözleşme Bedeli TL       | 707.300,00 TL (KDV Hariç)                                                    |
| 2023 Yılı Harcama Tutarı | 819.925,00 TL                                                                |

Çizelge 34: Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşİ İhale Bilgileri



Resim 1: Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi



Resim 2: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 3: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 4: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler

### 3.3. 2023I00-191384 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi için 2023 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 8.000.000,00 TL olup yıl içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.500.000,00 TL aktarılmıştır. Harcama 11.499.591,30 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023I00-191384 nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                        | Sağlık                             |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Karakteristik                  | Makine Teçhizat                    |
| Proje Başlama Yılı             | 2023                               |
| Proje Bitiş Yılı               | 2023                               |
| Proje Tutarı TL                | 11.500.000,00                      |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 8.000.000,00                       |
| Eklenen - Aktarılan TL         | 3.500.000,00                       |
| Toplam Ödenek TL               | 11.500.000,00                      |
| Harcama TL                     | 11.499.591,30                      |
| Kalan Ödenek TL                | 408,70                             |
| Gerçekleşme Oranı %            | 99,99                              |

Çizelge 35: 2023I00-191384 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler | Tutarı (TL)  |
|------------------------------------|--------------|
| Diş Üniti                          | 5.103.818,36 |
| Klima                              | 673.289,48   |
| Panel Bölücü                       | 607.723,37   |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                  | Tutarı (TL)          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Ofis Malzemeleri                                    | 547.162,00           |
| Buhar Sterilizatörü                                 | 542.226,41           |
| Panel Sistemleri                                    | 473.880,00           |
| Malzeme Dolabı - Etajer                             | 429.818,40           |
| Masaüstü Bilgisayar                                 | 377.511,97           |
| Pens                                                | 341.401,50           |
| Röntgen Cihazı                                      | 330.849,09           |
| Bilgisayar Alımı                                    | 298.726,09           |
| Sefalometri Ataçmanı                                | 295.000,00           |
| Dental Mikroskop                                    | 242.184,49           |
| Fotoğraflama ve Gözlem Cihaz Ekipmanları            | 170.995,72           |
| Kesme Kapama Makinesi                               | 170.400,00           |
| Acil Müdahale Tedavi Arabası ve Ameliyathane Dolabı | 155.183,74           |
| Çalışma Tezgahı                                     | 111.510,00           |
| İş İstasyonu                                        | 111.144,31           |
| Çalışma Koltuğu                                     | 82.808,44            |
| Sineklik                                            | 82.330,80            |
| Ağız İçi Fosfor Plak Tarayıcı                       | 74.811,66            |
| Lazer Yazıcı                                        | 57.026,39            |
| Projeksiyon Cihazı                                  | 48.335,33            |
| Musluk                                              | 38.939,94            |
| Diş Röntgen Cihazı                                  | 35.520,01            |
| Servis Arabası                                      | 30.090,00            |
| Televizyon                                          | 22.793,00            |
| Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları                | 16.632,00            |
| Led Televizyon                                      | 15.958,80            |
| Tarayıcı                                            | 11.520,00            |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>11.499.591,30</b> |

Çizelge 36: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler



Resim 5: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 6: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler

### 3.4. 2023H03-212692 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2023 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 2023H03-212694 nolu Muhtelif İşler Projesinden 300.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 1.300.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama ise 1.273.379,32 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 97,95 olarak gerçekleşmiştir.

2023H03-212692 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                       |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi         |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi         |
| Karakteristik                  | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı |
| Proje Başlama Yılı             | 2023                                       |
| Proje Bitiş Yılı               | 2023                                       |
| Proje Tutarı TL                | 1.300.000,00                               |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 1.000.000,00                               |
| Eklenen - Aktarılan TL         | 300.000,00                                 |
| Toplam Ödenek TL               | 1.300.000,00                               |
| Harcama TL                     | 1.273.379,32                               |
| Kalan Ödenek TL                | 26.620,68                                  |
| Gerçekleşme Oranı %            | 97,95                                      |

Çizelge 37: 2023H03-212692 Nolu Yayın Alımı Projesi

2023H03-212692 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Alımı Yapılan Basılı ve Elektronik Yayınlar                              | Tutarı (TL)         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Elektronik Kitap Alımı – 91 Adet                                         | 242.257,42          |
| Basılı Yayın Alımı – 1443 Adet                                           | 140.260,15          |
| Acland's Anatomy Veri Tabanı                                             | 169.484,83          |
| Hiperkitap Veritabanı                                                    | 161.708,92          |
| VETİS-Veritabanlarına Kampüs Dışı Erişim ve İstatistik Veri Tabanı Alımı | 156.000,00          |
| Turcademy eKitap Veri Tabanı Alımı                                       | 120.000,00          |
| İdeal Online Veri Tabanı Ödemesi                                         | 82.800,00           |
| AYEUM Veri Tabanı Ödemesi                                                | 50.000,00           |
| Piri Keşif Veri Tabanı Ödemesi                                           | 33.000,00           |
| Vidobu Veri Tabanı Aboneliği                                             | 30.000,00           |
| eOsmanlıca Veri Tabanı Alımı                                             | 28.000,00           |
| Bookcites Veri Tabanı Ödemesi                                            | 23.000,00           |
| SOBİAD Veri Tabanı Ödemesi                                               | 17.500,00           |
| LEXPERA PROPLUS Online Yayın Veri Tabanı Alımı                           | 10.368,00           |
| Lehçediz Online Veri Tabanı Alımı                                        | 9.000,00            |
| <b>Genel Toplam</b>                                                      | <b>1.273.379,32</b> |

Çizelge 38: 2023H03-212692 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **Acland's Anatomy Veri Tabanı**

Tıp, hemşirelik, doktor asistanı, fizik / mesleki terapi, konuşma / dil ve dişçilik programları dahilindeki herhangi bir kurumun çalışanları, fakülte ve öğrencileri için önemli bir kaynaktır. Acland's'ın İnsan Anatomisi Video Atlası, sınıfta ve pratikte aldıkları eğitim ve öğretimi desteklemek için temel bilgiler sağlar.

- **Hiperkitap Veri Tabanı**

Hukuk'tan Sağlık Bilimlerine, Ekonomiden Dil ve Edebiyata, Mimarlıktan Mühendislik, Bilgisayar, Tasarım, Teknik Bilimlere 28 temel konu başlığında 20.000'den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlayan Türkçe içerikli bir elektronik kitap veri tabanıdır.

- **VETİS Veri Tabanı (Kampüs Dışı Erişim Sistemi)**

Ulusal veya uluslararası elektronik veri tabanlarına, kampüs dışından, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayan bir araçtır.

- **TURCADEMY Elektronik Veri Tabanı**

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademik ve idari personel ile öğrencilerimize kolay bir şekilde ulaştıran yerli bir e-kitap platformudur.

- **İdeal Online Süreli Yayın ve Tıp Kitapları Veri tabanı**

İdeal online, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve her zaman erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktadır. İdeal online içerisinde akademik dergiler, popüler dergiler, ideal tıp kitapları, konferans & armağanlar ve ideal e-kitap olmak üzere 5 ayrı veri tabanı vardır.

İdeal online veri tabanlarının amacı; Türkçe bilgi kaynaklarını e-ortama taşımak, Türkçe bilgi kaynaklarına 7/24 erişim sağlamak, Türkçe içeriğe modern veri tabanı sistemi ve cihazlarla erişim sağlamak, Türkçe içeriği dünyanın kullanımına sunmak ve daha fazla Türkçe kaynak yayımlanmasına ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır.

- **AYEUM Veri Tabanı**

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) , sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

- **Piri Keşif Aracı Veri Tabanı**

Arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır. Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için araştırılan konu hakkında birçok veri tabanını tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. Yapay zekâ destekli modern arama algoritmaları ile ilgili içerikleri bulmayı amaçlar.

- **Video Eğitim Platformu (VİDOBU) Veri Tabanı**

Kişisel gelişim, mesleki gelişim, bilişim teknolojileri ve hobi eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri Türkçe içerikler ile sağlayan çevrimiçi video eğitim platformudur.

12.000'den fazla eğitim videosuna sahip olan platform, Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine yönelik akademik destek sağlaması hedeflenmektedir.

- **E-Osmanlıca Online Eğitim Veri Tabanı**

E-Osmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "doğru/yanlış, eşleştirme, şıklı ve gördüğünü yaz vb." tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. E-Osmanlıca dersleri öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak, onları sınıftaki eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlamaktadır.

- **BookCites Atıf Dizini**

Akademik kitaplar, akademik dünyada bilginin aktarılması için yapılan yayınların çok önemli bir türünü oluşturur. Çok büyük emek ve uğraşı sonucunda hazırlanan akademik kitaplarda bölüm sonlarında veya kitap sonunda kaynakçalar da yer alır. Atıf bulmak akademisyenin kendi yayınlarından yararlanan eserleri bulması anlamına gelir. Binlerce eserin taranması ve atıflar arasından araştırmacının kendi yayını bulması çok zor bir iştir.

BookCites aynı zamanda akademik bir veri tabanıdır. Kullanıcı tek arama panelinden binlerce kitap ve kitap bölümü içerisinden arama yapabilir. BookCites ile araştırmacılar açık erişimli kitapların tam metinlerine de kolaylıkla ulaşabilirler.

- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayımlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veri tabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, her ay düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayımlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir.

- **LEXPERA Veri Tabanı**

İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve multi-platform erişim imkânı ile LEXPERA akademik ve idari

personel ile öğrencilerimize yenilikçi çözümler sunmaktadır. Güncel mevzuatı, içtihadı, tam metin hukuk kitaplarını, makaleleri, kanun yorumlarını, bibliyografik bilgileri, sözleşme örneklerini ve genel internet arama sonuçlarını kapsamaktadır.

- **Lehçediz Elektronik Veri Tabanı**

Lehçediz Çalışması, Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri; Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir kelimesi ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa çevirmeden saniyeler içinde araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Sadece internet erişimi olan bir cihaz ile bilimsel bir kitap veya makale için binlerce veri elde edilebilmektedir. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal ve tek kaynaktır. Lehçediz çalışması araştırmacılar için önemli bir durak olmuştur. Çalışma üzerinden ülkemizin birçok üniversitesinde yüksek lisans, doktora tezi yapılmış; bildiriler sunulmuş, makaleler hazırlanmıştır.

### 3.5. 2023H03-212700 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2023 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.002.000,00 TL'dir. 2023 Yılı Yatırım Programı ödeneklerimiz ile bütçe ödeneklerimizin uyumlu hale getirilebilmesi için yıl içerisinde 1.498.000,00 TL ödenek eklenmemiş olmuş toplam harcama 6.079.115,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı harcamalarının toplam ödenğe göre gerçekleşme oranı %86,84'dür. 2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                                                                                                              |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                                                |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                                                |
| Karakteristik                  | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı, Engelsiz Üniversite |
| Proje Başlama Yılı             | 2023                                                                                                                              |
| Proje Bitiş Yılı               | 2025                                                                                                                              |
| Proje Tutarı TL                | 32.000.000,00                                                                                                                     |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 5.502.000,00                                                                                                                      |
| Eklenen TL                     | 1.498.000,00                                                                                                                      |
| Toplam Ödenek TL               | 7.000.000,00                                                                                                                      |
| Harcama TL                     | 6.079.115,92                                                                                                                      |
| Kalan Ödenek TL                | 920.884,08                                                                                                                        |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 86,84                                                                                                                             |

Çizelge 39: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Yapılan İşler                                     | Tutarı (TL)  |
|---------------------------------------------------|--------------|
| KMÜ Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş (2023/439719) | 5.408.763,92 |
| Engelsiz Üniversite İmalatı                       | 167.712,00   |

| Yapılan İşler                             | Tutarı (TL)         |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Güvenlik Kulübesi Yapım İşİ               | 165.200,00          |
| KMÜ Bina İçi Güvenlik Bölmeleri Yapım İşİ | 126.000,00          |
| Engelli Platformu Yapım İşİ               | 109.200,00          |
| Çevre Duvarı Koruma Teli                  | 102.240,00          |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>6.079.115,92</b> |


Çizelge 40: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

### 3.5.1. Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ

Üniversitemiz altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 4.444.000,00 (KDV hariç) TL bedel ile ihalesi yapılmış ve 2023 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire                      | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Sözleşme Tarafları                | Kentöz Hafriyat Nakliyat Makina Taahhüt Sanayi<br>ve Ticaret Limited Şirketi |
| Sözleşmenin Konusu                | KMÜ Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ                                   |
| Proje Numarası                    | 2023H03-212700                                                               |
| İhale Tarihi                      | 04.05.2023                                                                   |
| Sözleşme Tarihi                   | 13.06.2023                                                                   |
| Sözleşme Bedeli TL                | 4.444.000,00 TL (KDV Hariç)                                                  |
| Projeyle İlgili Revizyonlar       | 63.303,27 (KDV Hariç)                                                        |
| Revizyon Nedenleri                | Çevre duvarı imalatlarında tespit sonrası yıkılan<br>yerlerin tadilatı için. |
| Yer Teslim Tarihi                 | 14.06.2023                                                                   |
| Fiilen İşe Başlama Tarihi         | 30.09.2022                                                                   |
| Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi | 11.10.2023                                                                   |
| 2023 Yılı Harcama Tutarı          | 5.408.763,92 TL                                                              |
| Toplam Harcama Tutarı             | 5.408.763,92 TL                                                              |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)      | 100                                                                          |
| İnşaatın Durumu                   | Geçici kabulü yapıldı.                                                       |

Çizelge 41: Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ İhale Bilgileri

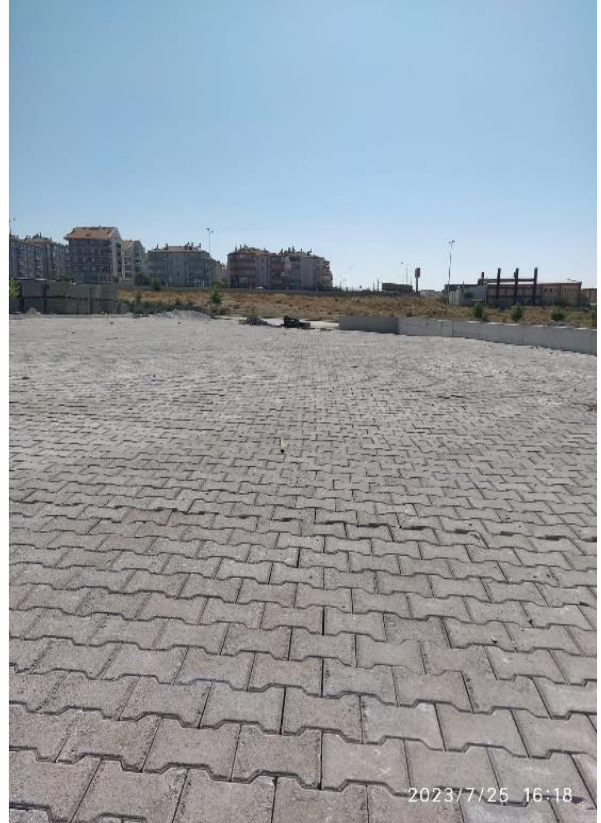

Resim 7: Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

### 3.5.2. Engelsiz Üniversite

Üniversitemiz bütün yerleşke alanlarında engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlamakta ve mevzuata uygun olarak uygulamaktadır. 2023 yılı ödeneği 500.000,00 TL olup 276.912,00 TL harcama yapılmıştır.

### 3.6. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2023 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 30.000.000,00 TL olup yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                                                                                           |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                             |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                             |
| Karakteristik                  | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m <sup>2</sup> ),<br>Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> ) |
| Alt Projeler                   | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m <sup>2</sup> ),<br>Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> ) |
| Proje Başlama Yılı             | 2009                                                                                                           |
| Proje Bitiş Yılı               | 2025                                                                                                           |
| Proje Tutarı TL                | 300.222.000                                                                                                    |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 30.000.000,00                                                                                                  |
| Eklenen TL                     | 0,00                                                                                                           |
| Toplam Ödenek TL               | 30.000.000,00                                                                                                  |
| Harcama TL                     | 0,00                                                                                                           |
| Kalan Ödenek                   | 30.000.000,00                                                                                                  |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 0,00                                                                                                           |

Çizelge 41: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

#### 3.6.1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Üniversitemiz Tıp Fakültesinin kurulması 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14/06/2018 tarih ve 30451 sayılı Resmî Gazetede yayımlanması ile kararlaştırılmıştır. 07/08/2018 tarihinde Kurucu Dekan ataması yapılarak, kuruluş süreci başlamıştır. 2019-2020 eğitim öğretim

yılında Konya Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde 31 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlayan Fakültemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Ortak Kullanım Protokolü ile Karaman Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesine dönüştürülerek afiliasyon sağlanmıştır.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Tıp fakültesi öğrencileri eğitimlerine Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi (3911 Ada 30 Parsel) içerisine Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğu cephesinde kalan alan üzerine Morfoloji Binası yapılması için çalışmalara başlanmıştır.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Teknik personelimiz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hastane ile morfoloji binasının birbiri ile entegre olacak şekilde en uygun bağlantı noktasının hastanenin doğu cephesinden sağlanabileceği tespit edilmiştir.

Söz konusu morfoloji binası içerisinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeterli bulunmayan ve hasta tanılarında önemli rol oynayan laboratuvarlar kurulması planlanmaktadır. Bu sebeple hasta için yapılacak tetkiklerin birçoğu morfoloji binası içerisinde tasarlanacak laboratuvarlarda gerçekleştirileceğinden hastane ile morfoloji binasının bütünleşik tasarlanması planlanmıştır.

Morfoloji binamızın mimari projesi öğretim üyeleri ve teknik personelimiz tarafından titizlikle hazırlanmış olup hem öğrenci hem öğretim üyeleri hem de Karaman halkının istifade edebileceği şekilde planlanmıştır.

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 05.12.2022 ve 06.04.2023 tarihlerinde ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir. Bu sebeple Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işinin proje maliyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 289.222.000 TL olarak revize edilmiş olup buna bağlı olarak Derslik ve Merkezi Birimler Projesi de 300.222.000 TL olarak revize edilmiştir. 20.12.2023 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmış olup yine teklif verilmemiştir.



Resim 8: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Vaziyet Planı



Resim 9: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası-1



Resim 10: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası-2

### 3.6.2. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli

2018 Yılı Yatırım Programı'na alınan ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren rekreasyon bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik, rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. Yatırım programında olmasına karşın Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilmiş olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir.



Resim 11: Ermenek Belediye Başkanlığı Tarafından Üniversiteye Uygulama Oteli İçin Tahsis Edilen Alan

### 3.7. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi


Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2023 yılı bütçemize ayrılan ödenek 2.000.000,00 TL olup yıl içerisinde herhangi bir ödenek revizyonu yapılmamıştır. Yıl içerisinde 466.070,00 TL harcama gerçekleştirilmiş olup 2023 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 23,30'dur. 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                         |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi           |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi           |
| Karakteristik                  | Spor Salonu, Spor Tesislerinin Bakım Onarımı |
| Alt Projeler                   | Spor Salonu, Spor Tesislerinin Bakım Onarımı |
| Proje Başlama Yılı             | 2010                                         |
| Proje Bitiş Yılı               | 2025                                         |
| Proje Tutarı TL                | 10.002.000,00                                |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 2.000.000,00                                 |
| Eklenen TL                     | 0,00                                         |
| Toplam Ödenek TL               | 2.000.000,00                                 |
| Harcama TL                     | 466.070,00                                   |
| Kalan Ödenek                   | 1.533.930,00                                 |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 23,30                                        |

Çizelge 42: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

#### 3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu

2016 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak yatırım izni verilmeyen projemiz ihaleye çıkma aşamasındadır. İzin ile birlikte projemiz ihale edilecektir. Projemiz 500 kişilik seyirci oturma kapasitesine sahiptir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Rekreasyon Bölümü öğrencileri başta olmak üzere Ermenek Yerleşkesindeki bütün öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.

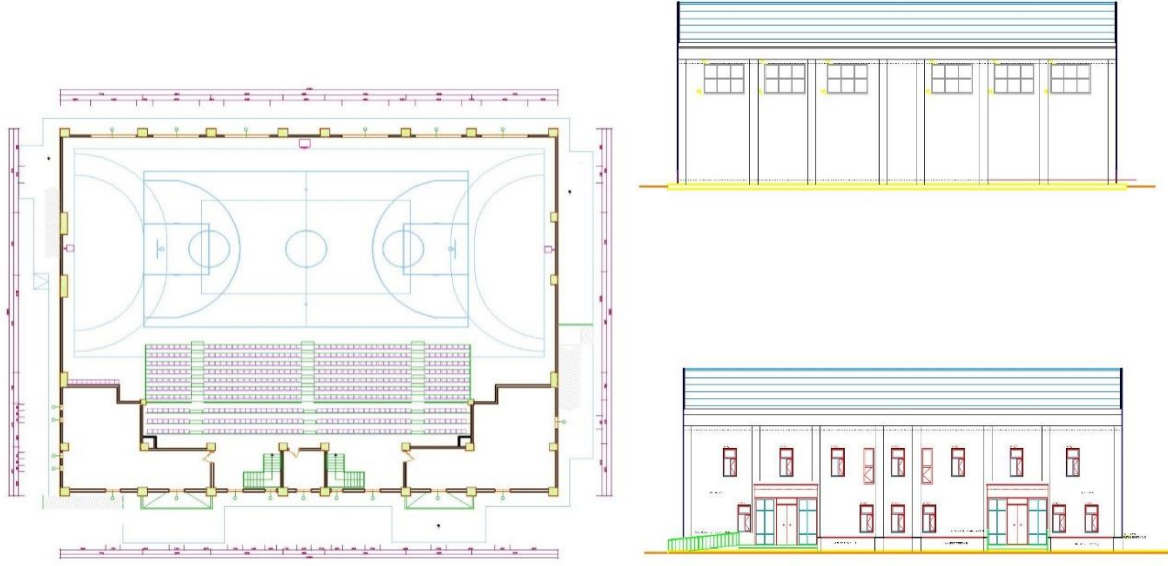

Resim 12: Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu Mimari Görselleri

### 3.7.2. Spor Tesislerinin Bakım Onarımı

Spor Tesislerinin bakım onarımı için 05.05.2023 tarihinde ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir.

2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde yer alan Spor Tesislerinin Bakım Onarımı alt projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Yapılan İşler                                                            | Tutarı (TL)       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Duvar Güvenlik Minderi Yapım İşİ                                         | 159.000,00        |
| Squash ve Tırmanma Duvarı Bakım Onarımı                                  | 148.800,00        |
| Evaporatif Soğutucuları Bakım Onarımı                                    | 138.000,00        |
| Kapalı Spor Salonu Kazan Dairesi Su Basınçlandırma Sistemi Bakım Onarımı | 16.520,00         |
| Spor Salonu Tamiri Yapım İşİ                                             | 3.750,00          |
| <b>TOPLAM</b>                                                            | <b>466.070,00</b> |

Çizelge 42: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Spor Tesislerinin Bakım Onarımı) Harcamalarının Detayı

### 3.8. 2023K12-214484 İhtisaslaşma Projesi

İhtisaslaşma Projesi için 2023 yılı bütçemize ayrılan ödenek 10.000.000,00 TL olup herhangi bir ödenek revizyonu yapılmamıştır. Yıl içerisinde Hassas Tarım Uygulamaları Projesi özel hesabına 5.000.000,00 TL ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri Projesi Özel Hesabına 5.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 10.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sektörü                        | DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma                           |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                        |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                        |
| Karakteristik                  | Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları |
| Alt Projeler                   | Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları |
| Proje Başlama Yılı             | 2023                                                      |
| Proje Bitiş Yılı               | 2026                                                      |
| Proje Tutarı TL                | 10.000.000,00                                             |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 10.000.000,00                                             |
| Eklenen TL                     | 0,00                                                      |
| Toplam Ödenek TL               | 10.000.000,00                                             |
| Harcama TL                     | 10.000.000,00                                             |
| Kalan Ödenek                   | 0,00                                                      |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 100,00                                                    |

Çizelge 42: 2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi

Yükseköğretim Kurulu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Üniversitemiz "Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri" (HASTUYİT) alanında ihtisas üniversitesi olarak onaylanmıştır.

İhtisaslaşma programı kapsamındaki iki alt projeden biri olan yenilikçi işleme teknolojilerinin kullanımı ancak kaliteli ve yeterli tarımsal hammaddenin temini ile mümkün olacaktır. Bu da hassas tarım uygulamaları sayesinde elde edilebilmektedir. Tarımsal üretimde temel amaç, optimum masrafla daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmektir. Ancak yetiştiricilikte yapılan hatalar üretiminin ekonomik olmaktan çıkmasına ve bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

Özellikle aşırı kimyasal kullanımı ile arazilerin verimliliği ve sürdürülebilir üretim potansiyeli azalmaktadır.

Hassas tarım teknolojileri, tarımda bilgi ve teknolojiyi birlikte kullanan tarımsal işletmeciliği değiştirebilecek yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Hassas tarım teknolojileri, uydu teknolojisi, elektronik ölçüm ve kontrol sistemleri ve bilgisayar yazılımları gibi yüksek teknolojileri kullanarak çok küçük alanlarda tarımsal girdi uygulama miktarını değiştirerek, kârlılık ve tarımsal etkinliğin artırılması ve daha da önemlisi çevreyi korumayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz hassas tarım uygulamaları konusunda tematik üniversite olarak YÖK tarafından atandıktan sonra hızlı bir şekilde bu konuda alt yapısını oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla bölgenin kalkınması için ihtiyaç duyulan konularda hem uygulamalı eğitimlerin verilmesi hem de uygulamalı AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi için “Tarımsal Eğitim ve Araştırma Tesisi Kurulumu (1. Aşama)” alt yapı projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynaklarının daha etkin kullanılması, tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha kaliteli bir üretim için bölge üreticisine hizmet sunacak “Tarımsal Analiz Laboratuvarı” ile üreticilerin rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Tarımsal Analiz Laboratuvarı kurulumu 2. Aşamada gerçekleştirilecektir.

İhtisaslaşma programı kapsamında Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri alanında “Duyusal Analiz ve Tüketici Tercihleri Belirleme Ünitesi Kurulumu” başlıklı alt yapı proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenmesine karar verilen “Tarımsal Eğitim ve Araştırma Tesisi Kurulumu (1. Aşama)” ve “Duyusal Analiz ve Tüketici Tercihleri Belirleme Ünitesi Kurulumu” isimli alt yapı projelerinde satın alma süreçleri devam etmektedir.

#### 4. Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı 12 Kasım 2018 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Stratejik Planımızda dört amaç ve bu amaçlarla ilişkili 18 hedef belirlenmiştir. Üniversitemiz, ortak akılla hazırlanan Stratejik Planımız ile farklılaşma alanları olarak belirlenen Türk dili, gıda-tarım ve temiz enerji alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik belirlenen hedeflerinin yanı sıra, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması, kurumsallaşma ve kalitenin artırılması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile bilgiye erişim imkânları ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik belirlenen amaç ve hedeflerini de gerçekleştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz stratejik planı ile yatırım programı ilişkisi kurularak aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

| Stratejik Amaçlar |                                                                                                                     | Hedef                                                            | Sektör                       | Proje Adı                     | Proje Numarası | Karakteristiği                             | Harcama Tutarı | Yapılan İşler                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-1               | Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak. | Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek. | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2010H05-1269   | Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi),      | 0,00           | Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir                                                                                     |
|                   |                                                                                                                     |                                                                  | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2010H05-1269   | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat              | 466.070,00     | Spor tesislerinin bakım onarımı yapılmıştır.                                                                                     |
|                   |                                                                                                                     |                                                                  | Eğitim-Yükseköğretim         | Derslik ve Merkezi Birimler   | 2009H03-1057   | Uygulama Oteli (4.821 m²)                  | 0,00           | Proje hazırlık çalışmaları devam ediyor.                                                                                         |
|                   |                                                                                                                     |                                                                  | Eğitim-Yükseköğretim         | Derslik ve Merkezi Birimler   | 2009H03-1057   | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m²) | 0,00           | 05.12.2022, 06.04.2023 20.12.2023 tarihlerinde ihaleye çıkmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir.                 |
|                   |                                                                                                                     |                                                                  | Sağlık                       | Muhtelif İşler                | 2022I00-178965 | Makine-Teçhizat                            | 11.499.591,30  | Diş ünitleri, laboratuvar cihazları, ağız ve diş eğitim malzemeleri ile çeşitli sağlık ekipmanlarının alımı gerçekleştirilmiştir |

| Stratejik Amaçlar |                                                                                                                               | Hedef                                                                   | Sektör               | Proje Adı                       | Proje Numarası | Karakteristiği                                                                                               | Harcama Tutarı | Yapılan İşler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                               |                                                                         | Eğitim-Yükseköğretim | Kampüs Altyapısı                | 2020H03-151368 | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 6.079.115,92   | Üniversitemiz çevre düzenleme işleri ve altyapı çalışmaları yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                               |                                                                         |                      | Muhtelif İşler                  | 2022H03-187475 | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat                                                              | 35.185.028,23  | Büro ve okul mefruşatı, kadavra, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. Peyzaj ve çevre düzenlemesi işi için malzeme alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı ile asansörlerin mavi etiketlendirme işleri yapılmıştır. |
|                   |                                                                                                                               |                                                                         | Eğitim-Yükseköğretim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 2022H03-187479 | Etüt-Proje                                                                                                   | 0,00           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A-2               | Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabilirdiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat | Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak. | Eğitim-Yükseköğretim | Yayın Alımı                     | 2022H03-187477 | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı                                                                   | 1.273.379,32   | Abone veri tabanları, e-kitaplar ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Stratejik Amaçlar |                                                                                                                                               | Hedef                                                                                                                                                               | Sektör                            | Proje Adı            | Proje Numarası | Karakteristiği                                            | Harcama Tutarı | Yapılan İşler                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                   | boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.   |                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                |                                                           |                |                                          |
| A-3               | Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek. | Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek. | DKH-Sosyal – Teknolojik Araştırma | İhtisaslaşma Projesi | 2023K12-214484 | Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları | 10.000.000,00  | Proje özel hesabına ödenek aktarılmıştır |

Çizelge 43: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

## 5. Proje Bazında Harcamalar

| Proje No                          | Proje Adı                       | Karakteristiği                                                                                               | Başlama Bitiş Yılı | Proje Tutarı          | 2022 Kümülatif Harcama | Program Ödenegi      | Revize Ödenek         | Harcama              |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.</b> |                                 |                                                                                                              |                    | <b>428.724.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>70.000.000,00</b> | <b>105.500.000,00</b> | <b>64.503.184,77</b> |
| <b>EĞİTİM</b>                     |                                 |                                                                                                              |                    | <b>387.224.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>52.000.000,00</b> | <b>84.000.000,00</b>  | <b>43.003.593,47</b> |
| <b>Yükseköğretim</b>              |                                 |                                                                                                              |                    | <b>377.222.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>50.000.000,00</b> | <b>82.000.000,00</b>  | <b>42.537.523,47</b> |
| 2009H03-1057                      | Derslik ve Merkezi Birimler     | Eğitim (12.000 m²), Uygulama Otel (4.821 m²)                                                                 | 2009-2025          | 300.222.000,00        | 0,00                   | 30.000.000,00        | 30.000.000,00         | 0,00                 |
| 2009H03-1057-187482               | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası  | Eğitim (12.000 m²)                                                                                           | 2022-2025          | 289.222.000,00        | 0,00                   | 29.999.000,00        | 29.999.000,00         | 0,00                 |
| 2009H03-1057-68203                | Ermenek MYO Uygulama Otel       | Uygulama Otel (4.821 m²)                                                                                     | 2018-2024          | 11.000.000,00         | 0,00                   | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                 |
| 2023H03-212688                    | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje                                                                                                   | 2023-2023          | 400.000,00            | 0,00                   | 400.000,00           | 400.000,00            | 0,00                 |
| 2023H03-212688-212689             | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje                                                                                                   | 2023-2023          | 400.000,00            | 0,00                   | 400.000,00           | 400.000,00            | 0,00                 |
| 2023H03-212692                    | Yayın Alımı                     | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı                                                                   | 2023-2023          | 1.300.000,00          | 0,00                   | 1.000.000,00         | 1.300.000,00          | 1.273.379,32         |
| 2023H03-212692-212693             | Yayın Alımı                     | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı                                                                   | 2023-2023          | 1.300.000,00          | 0,00                   | 1.000.000,00         | 1.300.000,00          | 1.273.379,32         |
| 2023H03-212694                    | Muhtelif İşler                  | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat                                                              | 2023-2023          | 43.300.000,00         | 0,00                   | 11.600.000,00        | 43.300.000,00         | 35.185.028,23        |
| 2023H03-212694-212695             | Muhtelif İşler                  | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat                                                              | 2023-2023          | 43.300.000,00         | 0,00                   | 11.600.000,00        | 43.300.000,00         | 35.185.028,23        |
| 2023H03-212700                    | Kampüs Altyapısı                | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2023-2025          | 32.000.000,00         | 0,00                   | 7.000.000,00         | 7.000.000,00          | 6.079.115,92         |
| 2023H03-212700-212701             | Kampüs Altyapısı                | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2023-2025          | 32.000.000,00         | 0,00                   | 7.000.000,00         | 7.000.000,00          | 6.079.115,92         |
| <b>Beden Eğitimi Ve Spor</b>      |                                 |                                                                                                              |                    | <b>10.002.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>466.070,00</b>    |
| 2010H05-1269                      | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)                                          | 2010-2025          | 10.002.000,00         | 0,00                   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00          | 466.070,00           |

| Proje No                    | Proje Adı                       | Karakteristiği                                                               | Başlama<br>Bitiş Yılı | Proje Tutarı          | 2022<br>Kümülatif<br>Harcama | Program<br>Ödeneği   | Revize Ödenek         | Harcama              |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2010H05-1269-15497          | Spor Salonu                     | Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)                                         | 2016-2023             | 2.000,00              | 0,00                         | 2.000,00             | 2.000,00              | 0,00                 |
| 2010H05-1269-212942         | Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat                                                | 2023-2025             | 10.000.000,00         | 0,00                         | 1.998.000,00         | 1.998.000,00          | 466.070,00           |
| <b>SAĞLIK</b>               |                                 |                                                                              |                       | <b>11.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>11.500.000,00</b>  | <b>11.499.591,30</b> |
| <b>Sağlık</b>               |                                 |                                                                              |                       | <b>11.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>11.500.000,00</b>  | <b>11.499.591,30</b> |
| 2023I00-191384              | Muhtelif İşler                  | Makine-Teçhizat                                                              | 2023-2023             | 11.500.000,00         | 0,00                         | 8.000.000,00         | 11.500.000,00         | 11.499.591,30        |
| 2023I00-191384-191385       | Makine Teçhizat                 | Makine-Teçhizat                                                              | 2023-2023             | 11.500.000,00         | 0,00                         | 8.000.000,00         | 11.500.000,00         | 11.499.591,30        |
| <b>DKH-SOSYAL</b>           |                                 |                                                                              |                       | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b> |
| <b>Teknolojik Araştırma</b> |                                 |                                                                              |                       | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b> |
| 2023K12-214484              | İhtisaslaşma Projesi            | Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın | 2023-2026             | 30.000.000,00         | 0,00                         | 10.000.000,00        | 10.000.000,00         | 10.000.000,00        |
| 2023K12-214484-216864       | Hassas Tarım Uygulamaları       | Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın | 2023-2026             | 15.000.000,00         | 0,00                         | -                    | 5.000.000,00          | 5.000.000,00         |
| 2023K12-214484-216865       | Yenilikçi İşleme Teknolojileri  | Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın | 2023-2026             | 15.000.000,00         | 0,00                         | -                    | 5.000.000,00          | 5.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b>         |                                 |                                                                              |                       | <b>428.724.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>70.000.000,00</b> | <b>105.500.000,00</b> | <b>64.503.184,77</b> |

Çizelge 44: Proje Bazında Harcamalar

## 6. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
3. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
4. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.
5. Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı finansman programı ile dağıtımı yapılırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca zamanında tahakkuka bağlanması kurumlara kolaylık sağlayacaktır.
